



Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 (ročná)

k 31.12.2020

OBSAH

Obsah	2
1. Zhrnutie	3
2. Stav auditov pripravenosti a proces dezinácie.....	6
3. Stav posudzovania výziev/vyzvaní v kompetencii MIRRI SR.....	6
4. Stav vyhlasovania výziev/vyzvaní	8
5. Stav schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)	9
6. Stav kontrahovania finančných prostriedkov EŠIF	10
7. Stav čerpania finančných prostriedkov EŠIF	11
8. Stav ukončovania projektov EŠIF	14
9. Implementácia EŠIF podľa krajov	16
10. Implementácia EŠIF podľa typov projektov.....	17
11. Opatrenia na boj s pandémiou COVID-19 a zmiernenie jej dôsledkov	19
Realokácie finančných prostriedkov EŠIF.....	19
REACT – EU	22
12. Zjednodušovanie procesov implementácie	22
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF	22
Systém riadenia EŠIF	24
Zjednodušovanie vybraných procesov IROP	25
13. Ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013	27
14. Zoznam skratiek	28
15. Zoznam príloh.....	30

1. ZHRNUTIE

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 – 2020 obsahuje popis aktuálneho stavu implementácie EŠIF a tiež vývoja implementácie EŠIF počas uplynulého roka.

Rok 2020 priniesol nasledovný pokrok v implementácii EŠIF.

K 31.12.2020 bolo CKO predložených **na posúdenie 629 výziev/vyzvaní**, z čoho bolo **posúdených 624 výziev/vyzvaní** a **vyhlásených 601 výziev/vyzvaní**. Celkom za rok 2020 bolo zo 104 predložených výziev/vyzvaní posúdených 99 a vyhlásených **93 výziev/vyzvaní**.

K 31.12.2020 je v **700 výzvach/vyzvaniach** alokovaných **124,62 %** finančných prostriedkov na programové obdobie 2014 – 2020 za EÚ zdroj **v sume 19,07 mld. EUR**. Za uplynulý rok stúpol počet vyhlásených výziev/vyzvaní o 89 v sume viac ako **2,13 mld. EUR** (EÚ zdroj). Počet predložených ŽoNFP stúpol o 3 467 a počet schválených ŽoNFP o 2 344.

V **kontrahovaní** je stav ku koncu roka 2020 na úrovni **12,39 mld. EUR** za EÚ zdroj, čo predstavuje **80,74 %** alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 a počas roka 2020 sme dosiahli **nárast o 12,28 p. b. v sume 1,88 mld. EUR** (EÚ zdroj).

K 31.12.2020 je stav **čerpania** na úrovni **6,43 mld. EUR** za EÚ zdroj, čo predstavuje **41,94 %** alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 a počas roka 2020 sme zaznamenalo **nárast o 11,23 p. b. v sume 1,72 mld. EUR** (EÚ zdroj).

Z celkového počtu **13 788 zazmluvnených projektov EŠIF** bolo k **31.12.2020 ukončených celkom 4 644 projektov** v rámci 9 OP, čo predstavuje **33,68 %**.

Čo sa týka **implementácie EŠIF podľa jednotlivých krajov**, k 31.12.2020 evidujeme **najvyšší objem zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji**.


Z pohľadu **implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov**, najvyšší objem zazmluvnených finančných prostriedkov predstavujú **dopytovo-orientované projekty (42,51 %)**, ďalej **národné projekty (31,23 %)**, **veľké projekty (13,72 %)**, zvyšok tvoria projekty návratnej pomoci tzv. **finančné nástroje (7,64 %)** a projekty **technickej pomoci (4,90%)**.

V nadväznosti na krízu v dôsledku pandémie COVID-19 na Slovensku vláda SR uznesením č.257/2020 zo dňa 28.04.2020 schválila realokáciu nezazmluvnených finančných prostriedkov EŠIF na **opatrenia v boji proti pandémie COVID-19** a na zmierňovanie jej následkov **v celkovej výške 1,105 mld. EUR**. K 31.12.2020 bolo na Covid opatrenia vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených **1,116 mld. EUR (100,99 %)**, zazmluvnených **968,28 mil. EUR (87,62 %)** a vyčerpaných **342,86 mil. EUR (31,03 %)**.

V súvislosti s minulým **programovým obdobím 2007 – 2013** celková úroveň čerpania dosiahla **11,24 mld. EUR**, čo predstavuje **96,72 %**. Pokračuje proces uzatvárania a finančného vysporiadania. Zatiaľ boli v spolupráci s EK uzatvorené dva programy – OP INTERACT II (14.12.2017) a OP Rybné hospodárstvo (11.07.2019).


V nasledujúcich grafoch je vyjadrený vývoj implementácie EŠIF spoločne za všetky programy, ročné porovnanie implementácie EŠIF a mesačný vývoj čerpania v roku 2020. Úroveň kontrahovania a čerpania podľa jednotlivých fondov dokumentuje graf č. 4.

Graf č. 1: Vývoj implementácie EŠIF do 31.12.2020

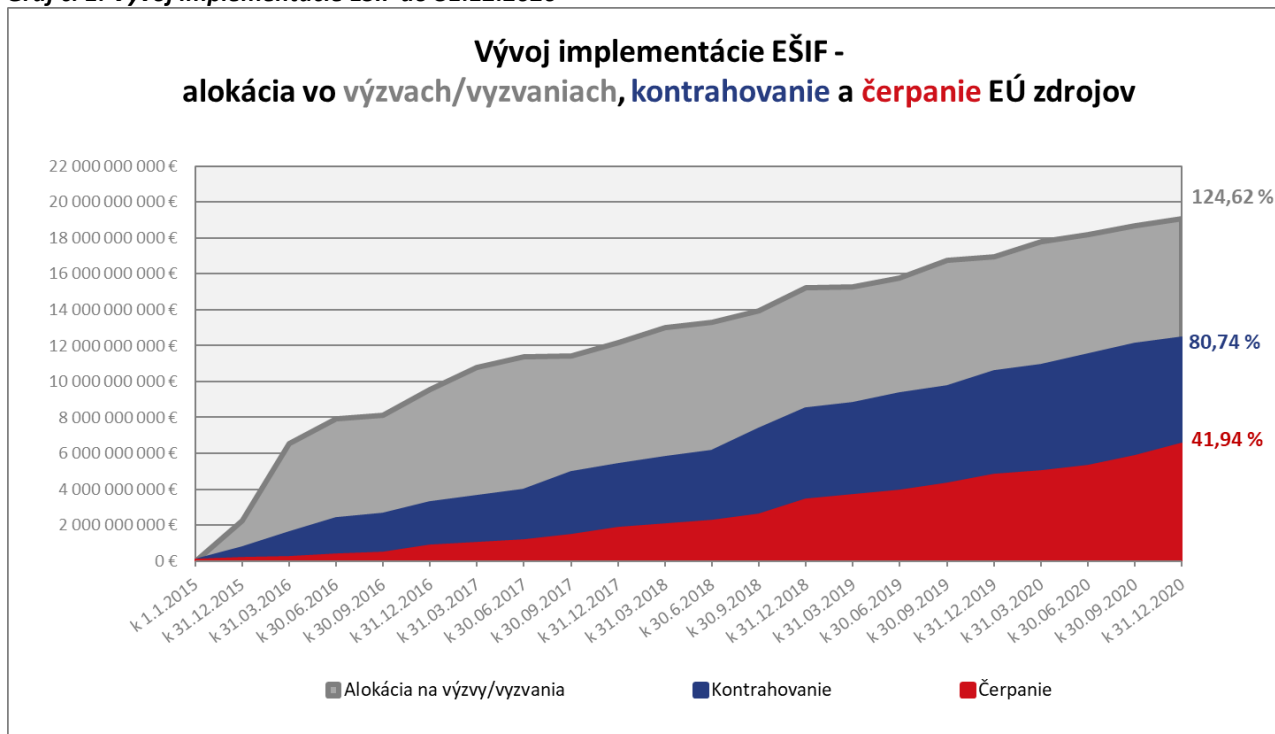

Zdroj údajov: ITMS2014+, MF SR, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT, fin. údaje v EUR

Graf č. 2: Rast podielu kontrahovania a čerpania na alokácii EŠIF

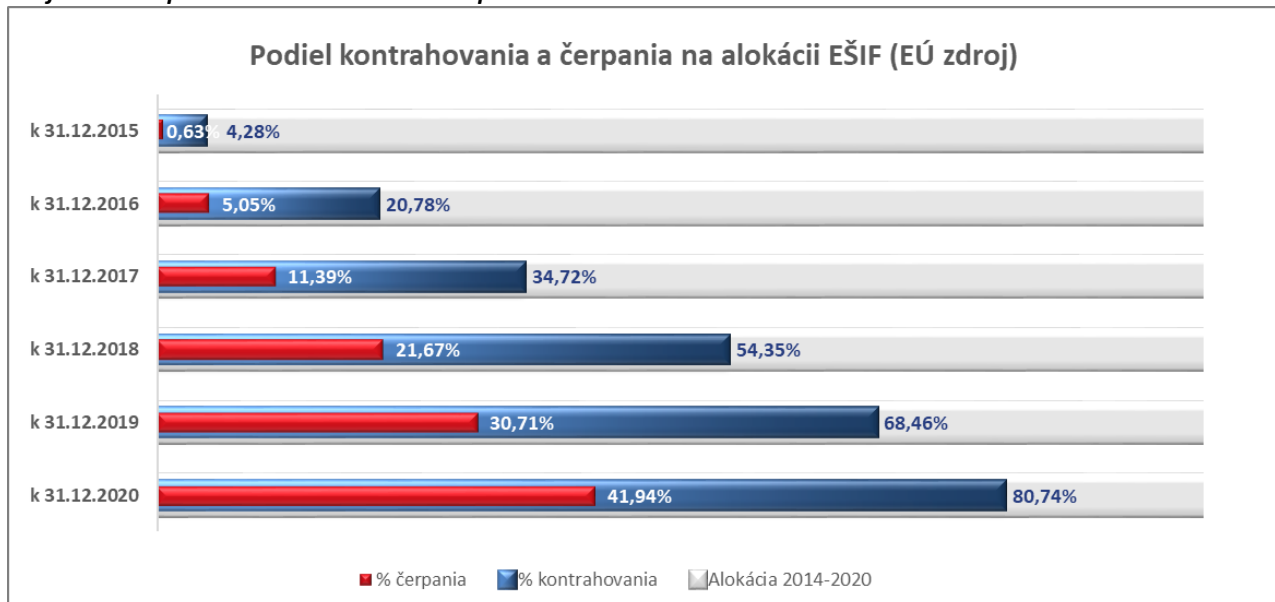


Zdroj údajov: ITMS2014+, MF SR, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT

Tabuľka č. 1: Ročný nárast v implementácii EŠIF (od 01.01.2020 do 31.12.2020)

Celkom EŠIF (zdroje EÚ)	k 31.12.2019		k 31.12.2020		Ročný nárast od 01.01.2020 do 31.12.2020	
	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	v EUR	v p.b.
Výzvy/vyzvania	16 938 785 994	110,68%	19 071 851 735	124,62%	2 133 065 741	13,95%
Kontrahovanie	10 504 784 260	68,46%	12 387 903 342	80,74%	1 883 119 082	12,28%
Čerpanie	4 711 454 632	30,71%	6 434 445 265	41,94%	1 722 990 633	11,23%


Zdroj údajov: ITMS2014+, MF SR, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT

Graf č. 3: Vývoj mesačného čerpania EŠIF v roku 2020

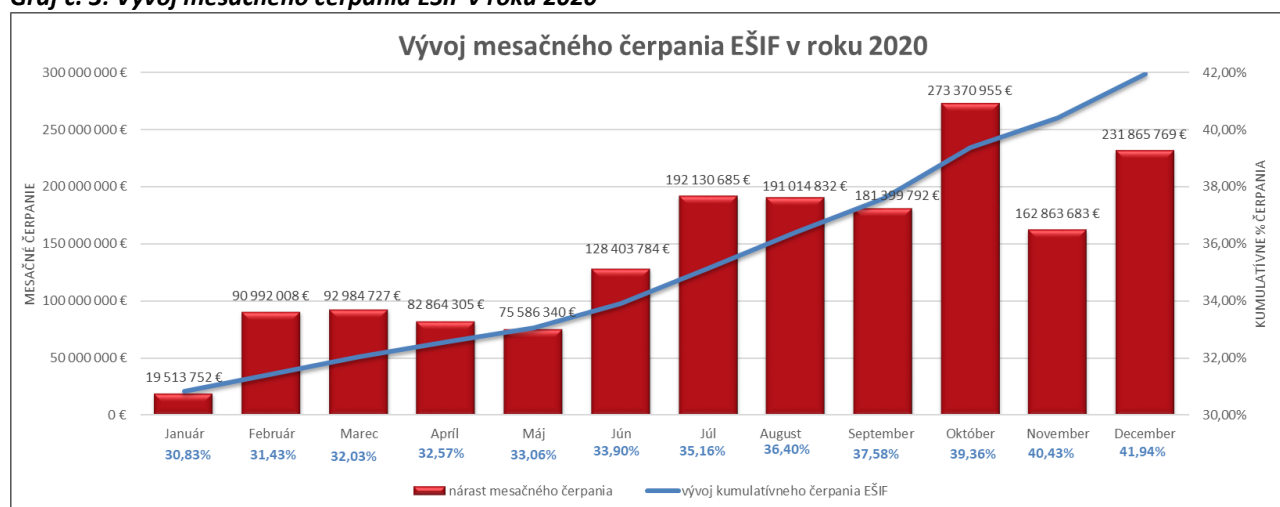

Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV

Graf č. 4 Kontrahovanie a čerpanie podľa jednotlivých fondov EÚ k 31.12.2020

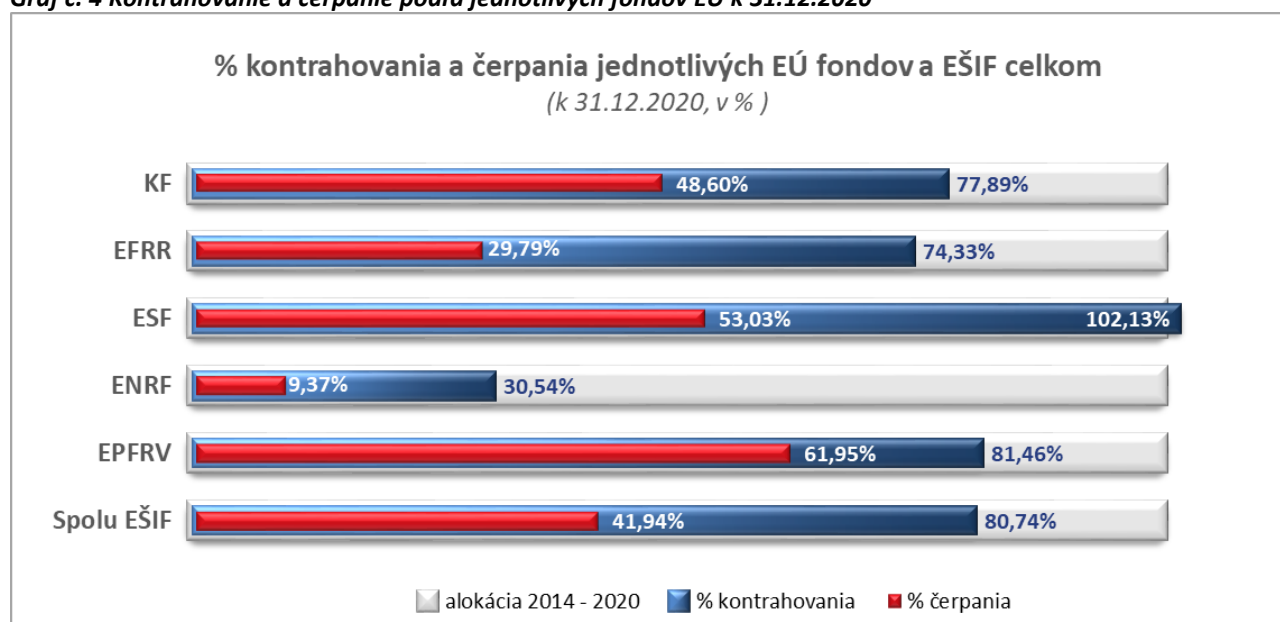

2. STAV AUDITOV PRIPRAVENOSTI A PROCES DEZIGNÁCIE

CKO ako orgán zodpovedný za oznámenie určenia RO EK odoslal cez systém SFC2014 notifikáciu o RO 11 programov. Odoslanie notifikácie znamená začiatok možnosti preplácania ŽoP zo strany Európskej komisie.

- ✓ OP EVS – dezinovovaný 02.03.2016;
- ✓ OP TP – dezinovovaný 02.03.2016;
- ✓ OP KŽP – dezinovovaný 07.03.2016;
- ✓ OP II – dezinovovaný 08.03.2016;
- ✓ OP ĽZ – dezinovovaný 14.06.2016;
- ✓ OP Val – dezinovovaný 04.10.2016;
- ✓ OP RH – dezinovovaný 01.03.2017;
- ✓ IROP – dezinovovaný 05.05.2017;
- ✓ INTERACT III 2014 – 2020 – dezinovovaný 31.05.2017;
- ✓ INTERREG SK-CZ – dezinovovaný 29.01.2018;
- ✓ INTERREG SK-AT – dezinovovaný 05.09.2018;

3. STAV POSUDZOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ V KOMPETENCIAI MIRRI SR

K 31.12.2020 bolo na MIRRI SR doručených **629 výziev/vyzvaní** v celkovej indikatívnej alokáci **10,67 mld. EUR**, pričom z toho bolo:

- **277** dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. **6,44 mld. EUR**;
- **17** výziev na predkladanie projektových zámerov;
- **53** vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške **247 mil. EUR**;
- **282** vyzvaní na národné projekty v celkovej výške **3,98 mld. EUR**.

Z celkového čísla 629 výziev/vyzvaní **bolo za rok 2020 doručených 104 výziev/vyzvaní** v celkovej indikatívnej alokáci **1,54 mld. EUR**, pričom z toho bolo:

- **31** dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. **443 mil. EUR**;
- **2** výziev na predkladanie projektových zámerov;
- **8** vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške **36 mil. EUR**;
- **63** vyzvaní na národné projekty v celkovej výške **1,06 mld. EUR**.

Na boj s **pandémiou COVID–19** a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov bolo v roku 2020 predložených **14 výziev/vyzvaní** v celkovej alokáci **718 mil.**

Tieto výzvy/vyzvania boli z operačných programov OP ĽZ, IROP, OP II a PRV. V rámci OP ĽZ bolo posúdených 8 výziev/vyzvaní v celkovej alokáci 554 mil. EUR a zameriavali sa najmä na podporu inkluzívneho vzdelávania v materských školách a základných a stredných školách, rovnako aj na podporu činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v MRK spojených s poradenstvom a prevenciou. V rámci IROP boli posúdené 3 výzvy/vyzvania v celkovej alokáci 68,5 mil. EUR, ktoré sa

zameriavali na zníženie dopadov pandémie COVID-19, posilnenie kapacít zdravotníckeho systému a ochranu verejného zdravia. V rámci OP II bolo alokovaných 80 mil. EUR na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií na boj s pandémiou. V rámci PRV bola pomoc vo výške 14,7 mil. EUR zameraná na pomoc pre poľnohospodárov a MSP, ktorí boli najviac zasiahnutí krízou spôsobenou COVID-19.

Tabuľka č. 2: Celkový stav posudzovania výziev/vyzvaní

Program	Predložené výzvy		Posúdené výzvy		Vyhlásené výzvy	
	Počet	alokácia (EÚ zdroj)	Počet	alokácia (EÚ zdroj)	Počet	alokácia (EÚ zdroj)
OP IZ	137	2 538 903 981,39	136	2 521 403 981,39	134	2 468 980 041,95
OP II	213	3 635 882 419,28	209	3 635 882 415,28	200	3 572 693 277,10
OP KŽP	60	1 693 248 406,60	60	1 693 248 406,60	59	1 691 248 406,60
IROP	68	1 635 589 441,11	68	1 635 589 441,11	62	1 767 687 946,26
OP EVS	57	250 838 134,64	57	250 838 134,64	56	250 838 134,64
OP TP	8	30 253 790,00	8	30 253 790,00	8	30 253 790,00
OP RH	30	13 335 278,69	30	13 335 278,69	30	13 335 278,69
Interreg V-A SK-CZ	11	62 392 508,00	11	62 392 508,00	11	62 392 508,00
Interreg V-A SK-AT	5	75 892 678,00	5	75 892 678,00	5	75 892 678,00
PRV	40	742 254 068,05	40	742 254 068,05	36	671 229 321,05
SPOLU EŠIF	629	10 678 590 705,76	624	10 661 090 701,76	601	10 604 551 382,29

Zdroj údajov: CKO/ORP – posudzovanie výziev od 01.07.2016 v rámci rozšírených kompetencií MIRRI SR (predtým ÚPVII)

Pozn.: EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. Vzhľadom na to, pod údajmi OP II sú údaje vykazované sumarizačne vrátane OP VaI.

Tabuľka č. 3: Stav posúdených výziev/vyzvaní za rok 2020

Program	Predložené výzvy		Posúdené výzvy		Vyhlásené výzvy	
	Počet	alokácia (EÚ zdroj)	Počet	alokácia (EÚ zdroj)	Počet	alokácia (EÚ zdroj)
OP IZ	26	716 696 869,61	25	699 196 869,61	25	689 622 930,17
OP II	49	564 440 609,75	45	564 440 605,75	41	554 335 442,25
OP KŽP	4	22 600 000,00	4	22 600 000,00	4	22 600 000,00
IROP	10	159 796 244,32	10	159 796 244,32	9	159 796 244,32
OP EVS	4	10 950 000,00	4	10 950 000,00	4	10 950 000,00
OP TP	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OP RH	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Interreg V-A SK-CZ	2	3 563 994,00	2	3 563 994,00	2	3 563 994,00
Interreg V-A SK-AT	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRV	9	69 332 476,50	9	69 332 476,50	8	66 646 476,50
SPOLU EŠIF	104	1 547 380 194,18	99	1 529 880 190,18	93	1 507 515 087,24

Zdroj údajov: CKO/ORP – posudzovanie výziev za rok 2020 v rámci rozšírených kompetencií MIRRI SR (predtým ÚPVII)


4. STAV VYHLASOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ

V rámci EŠIF bolo k 31.12.2020 vyhlásených **700 výziev/vyzvaní** na predkladanie žiadostí o NFP vo výške **19,07 mld. EUR** (EÚ zdroje). Predstavuje to **124,62 %** z celkovej alokácie finančných prostriedkov EŠIF (zdroj EÚ).

Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 31.12.2020 dosahuje OP II, IROP a OP ĽZ.

V rámci programu INTERACT III sa výzvy/vyzvania nevyhlasujú, v rámci PRV sa za alokované zdroje vo výzvach/vyzvaniach uvádza alokácia na zverejnené výzvy na projektové opatrenia a alokácia na neprojektové opatrenia.

Graf č. 5: Podiel alokácie vo vyhlásených platných výzvach/vyzvaniach z celkovej alokácie jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroj) k 31.12.2020 s označením ročnej zmeny

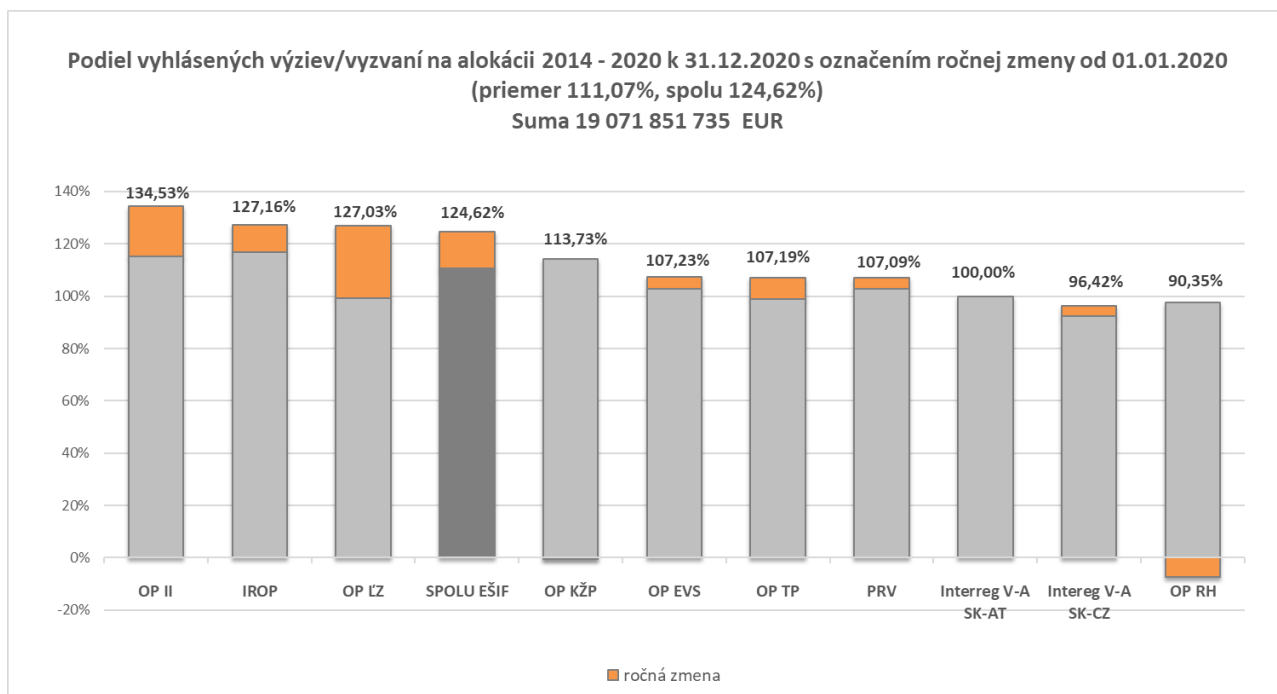

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV

Tabuľka č. 4: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní k 31.12.2020

Program	Alokácia 2014 – 2020		Vyhlásené platné výzvy/vyzvania	
	EÚ zdroj	počet	Alokácia na výzvu/vyzvanie EÚ zdroj	%
	A	B	C	D=C/A
OP ĽZ	2 613 166 516	154	3 319 434 293	127,03%
OP II	6 009 937 611	233	8 085 353 767	134,53%
OP KŽP	2 832 531 290	82	3 221 511 160	113,73%
IROP	1 699 941 778	62	2 161 642 385	127,16%
OP EVS	251 476 497	57	269 647 986	107,23%
OP TP	159 071 912	18	170 502 990	107,19%
OP RH	11 812 818	22	10 673 244	90,35%

INTERREG V-A SK-CZ	90 139 463	15	83 345 456	92,46%
INTERREG V-A SK-AT	75 892 681	5	75 892 678	100,00%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	13 743 970 566	648	17 401 567 953	126,61%
PRV	1 559 691 844	52	1 670 283 782	107,09%
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 303 662 410	700	19 071 851 735	124,62%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, fin. údaje v EUR

Pozn.: Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (623 262 755 EUR), Údaj za výzvy OP Val je zahrnutý v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II. Za OP II sa nevykazujú údaje za výzvy OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC), ktorá je vylúčená z financovania EŠIF.

5. STAV SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (ŽoNFP)

K 31.12.2020 bolo prijatých spolu **30 506** ŽoNFP, z toho **15 345** ŽoNFP bolo aj schválených, čo predstavuje **50,30 %** z celkového počtu prijatých ŽoNFP. Z požadovanej výšky NFP 24,12 mld. EUR bolo schválených 16,50 mld. EUR, čo predstavuje **68,44 %** z požadovanej sumy NFP.

V období od 01.01.2020 do 31.12.2020 bolo schválených 2 344 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške **2,71 mld. EUR**. Najvyšší pokrok v počte schválených ŽoNFP evidujeme pri PRV, OP IŽ a OP II.

Tabuľka č. 5: Prehľad prijatých a schválených ŽoNFP k 31.12.2020

Program	Alokácia 2014 – 2020		Prijaté ŽoNFP	Požadovaná výška NFP	Schválené ŽoNFP	Schválená výška NFP
	EÚ zdroj	ŠR zdroj	počet	suma NFP	počet	suma NFP
	A	B	C	D	E	F
OP IŽ	2 613 166 516	492 163 705	5 179	4 109 284 427	3414	3 570 798 361
OP II	6 009 937 611	1 023 408 243	4 113	8 188 987 392	2374	5 922 985 042
OP KŽP	2 832 531 290	329 249 335	4 618	5 028 476 078	2180	2 742 974 674
IROP	1 699 941 778	310 981 158	3 503	2 678 498 379	2339	1 827 186 756
OP EVS	251 476 497	47 955 668	302	362 176 705	156	316 297 964
OP TP	159 071 912	28 034 015	231	225 463 477	193	202 764 127
OP RH	11 812 818	3 788 423	78	11 925 001	38	5 612 799
INTERREG V-A SK-CZ	90 139 463	6 228 064	468	232 936 243	135	85 799 005
INTERREG V-A SK-AT	75 892 681	3 651 172	84	130 388 397	37	65 194 534
SPOLU EŠIF (bez PRV)	13 743 970 566	2 245 459 783	18 576	20 968 136 101	10 866	14 739 613 262
PRV	1 559 691 844	539 507 853	11 930	3 146 872 637	4479	1 765 246 373
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 303 662 410	2 784 967 636	30 506	24 115 008 737	15 345	16 504 859 635

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT, fin. údaje v EUR

Pozn.: V rámci PRV je počet prijatých a schválených ŽoNFP údaj len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy žiadosti o podporu neprojektových opatrení. K 31.12.2020 bolo v rámci neprojektových opatrení predložených 53 667 žiadostí a schválených 48 677 žiadostí. Prehľad neobsahuje údaje o ŽoNFP zo stiahnutých výziev, ktoré sa ďalej nevyhodnocujú.

Údaje o ŽoNFP za OP Val sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II.

6. STAV KONTRAHOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF


K 31.12.2020 bolo kontrahovanie¹ finančných prostriedkov EŠIF vo výške **12,39 mld. EUR**, čo predstavuje **80,74 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ).

Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje OP ĽZ, PS INTERACT III a OP TP.

V období od 01.01.2020 do 31.12.2020 predstavuje nárast kontrahovania o **1 907 projektov vo výške 1,88 mld. EUR (zdroj EÚ)**, čo je voči stavu ku koncu roku 2019 nárast o **12,28 p. b.**

Najvyšší ročný nárast v kontrahovaní (vyjadrený v percentuálnych bodoch) dosiahli OP TP, OP II a OP ĽZ.

Graf č. 6: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF 2014 – 2020 (EÚ zdroje) k 31.12.2020 s označením ročnej zmeny

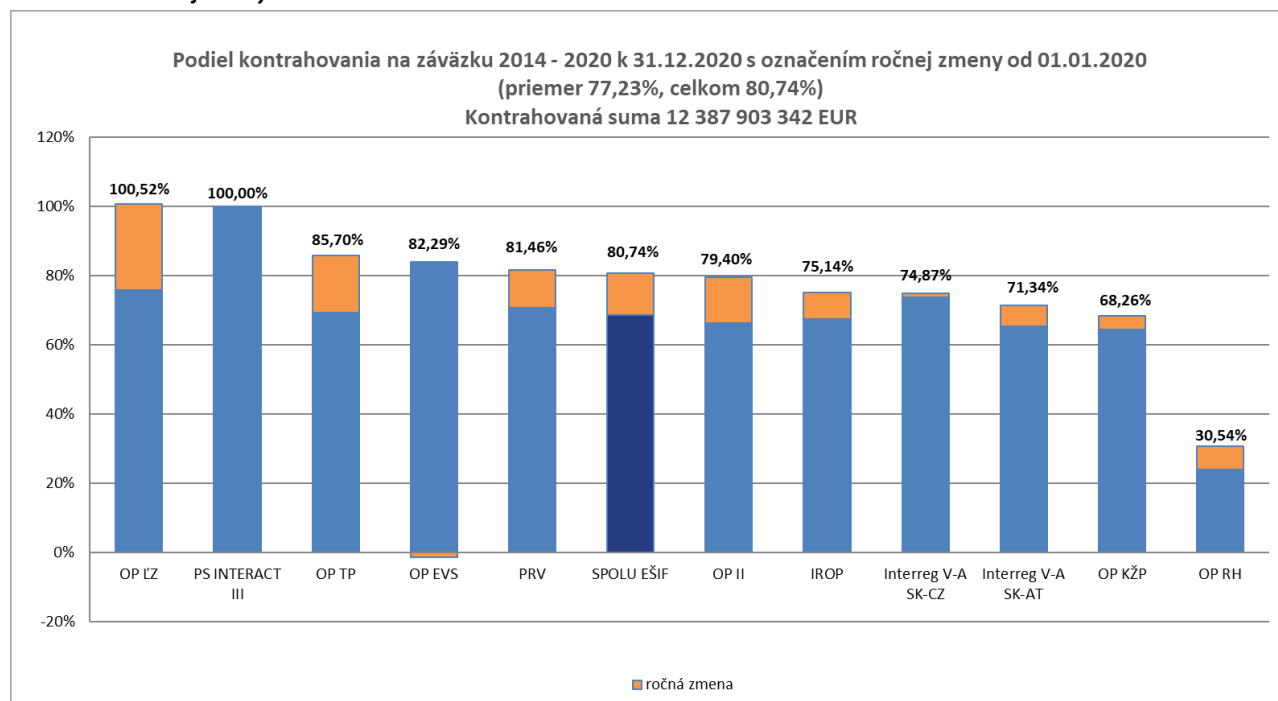

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT

¹ Kontrahovanie = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020.

Tabuľka č. 6: Kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF k 31.12.2020

Program	Alokácia 2014 – 2020	Kontrahovanie EŠIF		
	EÚ zdroj	Počet zazmluvnených projektov	EÚ zdroj	%
	A	B	C	D=C/A
OP ĽZ	2 613 166 516	2951	2 626 813 375	100,52%
OP II	6 009 937 611	2026	4 771 899 304	79,40%
OP KŽP	2 832 531 290	1885	1 933 375 471	68,26%
IROP	1 699 941 778	2178	1 277 371 856	75,14%
OP EVS	251 476 497	143	206 942 784	82,29%
OP TP	159 071 912	186	136 323 968	85,70%
OP RH	11 812 818	33	3 607 141	30,54%
INTERREG V-A SK-CZ	90 139 463	121	67 490 556	74,87%
INTERREG V-A SK-AT	75 892 681	34	54 140 174	71,34%
PS INTERACT III	39 392 594	-	39 392 594	100,00%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	13 783 363 160	9 557	11 117 357 223	80,66%
PRV	1 559 691 844	4231	1 270 546 118	81,46%
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 343 055 004	13 788	12 387 903 342	80,74%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre Interreg V-A SK-AT, fin. údaje v EUR

Pozn.: V rámci PRV je údaj o počte nakontrahovaných zmlúv len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy schválených neprojektových opatrení. K 31.12.2020 bolo v rámci neprojektových opatrení schválených 48 677 žiadostí. Za OP II sa nevykazuje kontrahovanie za výzvu OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC).

Údaje o kontrahovaní za OP Val sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II.

7. STAV ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF

Čerpanie² finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 31.12.2020 vo výške **6,43 mld. EUR, čo predstavuje 41,94 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ).


Najvyššiu mieru čerpania vykazuje OP TP, PRV a PS INTERACT III.

V období od 01.01.2020 do 31.12.2020 bolo vyčerpaných 1,72 mld. EUR (zdroj EÚ), čo predstavuje nárast o 11,23 p. b. oproti stavu ku koncu roku 2019.

Najvyšší ročný nárast v čerpaní (vyjadrený v percentuálnych bodoch) dosiahol Interreg V-A SK-CZ, OP EVS a OP ĽZ.

² Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o sumu vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).

Graf č. 7: Podiel čerpania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroje) k 31.12.2020 s označením ročnej zmeny

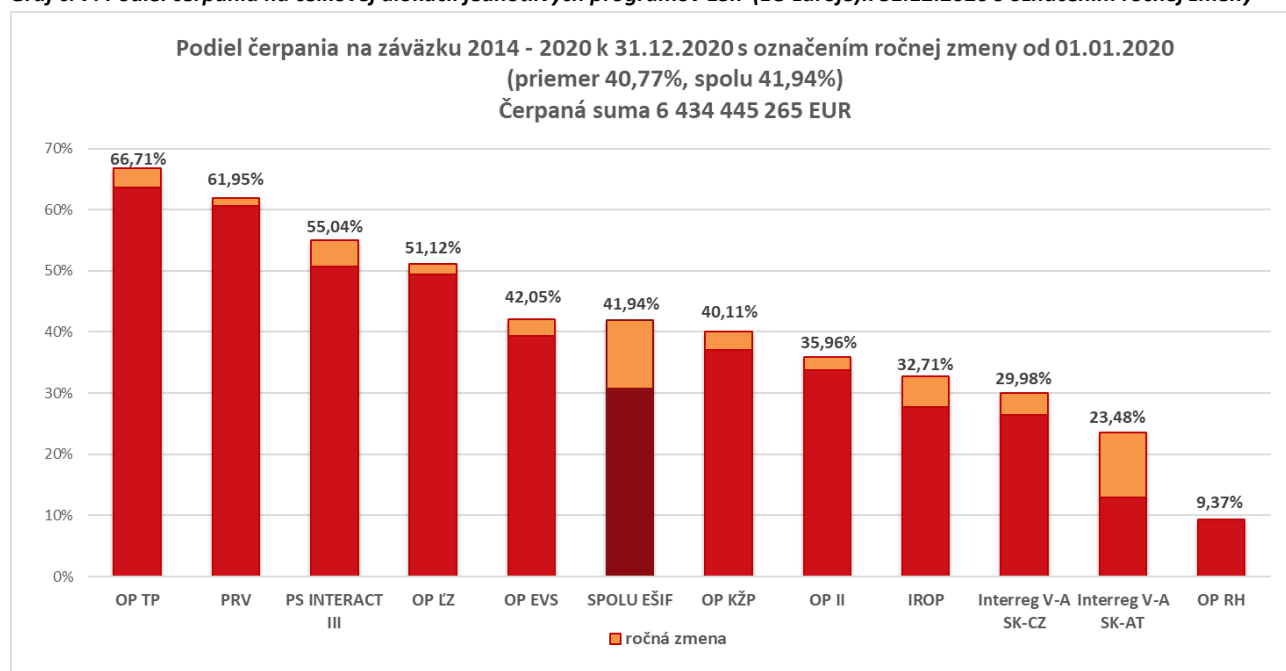

Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV

Tabuľka č. 7: Čerpanie finančných prostriedkov EŠIF k 31.12.2020

Program	Alokácia 2014 – 2020	Čerpanie EŠIF	
	EÚ zdroj	EÚ zdroj	%
	A	B	C=B/A
OP LZ	2 613 166 516	1 335 787 804	51,12%
OP II	6 009 937 611	2 160 907 842	35,96%
OP KŽP	2 832 531 290	1 135 995 748	40,11%
IROP	1 699 941 778	555 997 210	32,71%
OP EVS	251 476 497	105 758 107	42,05%
OP TP	159 071 912	106 109 802	66,71%
OP RH	11 812 818	1 107 219	9,37%
INTERREG V-A SK-CZ	90 139 463	27 026 981	29,98%
INTERREG V-A SK-AT	75 892 681	17 816 414	23,48%
PS INTERACT III	39 392 594	21 680 711	55,04%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	13 783 363 160	5 468 187 838	39,67%
PRV	1 559 691 844	966 257 427	61,95%
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 343 055 004	6 434 445 265	41,94%

Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV, fin. údaje v EUR

Pozn.: Údaje o čerpaní za OP Val sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II.

Na základe čl. 25a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 558/2020 (zo dňa 23. 4. 2020), ktorým sa upravili nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility **pri využívaní EŠIF v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19, je v 7. účtovnom roku**

umožnené preplatenie výdavkov deklarovaných Európskej komisii vo výške 100 % z EÚ zdroja. Po prepočte v zmysle vyššie uvedeného **dosiahla SR k 31.12.2020** za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie **6,86 mld. EUR**, čo predstavuje **44,71 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Tabuľka č. 8: Čerpanie finančných prostriedkov EŠIF v zmysle flexibility v 7. účtovnom roku k 31.12.2020

Program	Alokácia 2014 – 2020	Čerpanie EŠIF v zmysle novej legislatívy	
	EÚ zdroj	EÚ zdroj	%
	A	B	C=B/A
OP ĽZ	2 613 166 516	1 513 258 127	57,91%
OP II	6 009 937 611	2 302 335 173	38,31%
OP KŽP	2 832 531 290	1 159 823 167	40,95%
IROP	1 699 941 778	634 176 636	37,31%
OP EVS	251 476 497	107 861 316	42,89%
OP TP	159 071 912	106 754 022	67,11%
OP RH	11 812 818	642 026	5,43%
INTERREG V-A SK-CZ	90 139 463	26 199 080	29,07%
INTERREG V-A SK-AT	75 892 681	20 303 165	26,75%
PS INTERACT III	39 392 594	21 680 711	55,04%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	13 783 363 160	5 893 033 425	42,75%
PRV	1 559 691 844	966 257 427	61,95%
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 343 055 004	6 859 290 851	44,71%


Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV, fin. údaje v EUR

Pozn.: Údaje o čerpaní za OP Val sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II.

8. STAV UKONČOVANIA PROJEKTOV EŠIF


Z celkového počtu **13 788** zazmluvnených projektov EŠIF bolo k **31.12.2020** riadne ukončených a mimoriadne ukončených projektov, ktoré prispeli k cieľom OP, celkom **4 644** projektov v rámci 9 OP, čo predstavuje **33,68 %**. Najvyšší počet ukončených projektov vykazuje PRV, OP ĽZ, IROP a OP II.

Graf č. 8: Počet zazmluvnených projektov OP k 31.12.2020

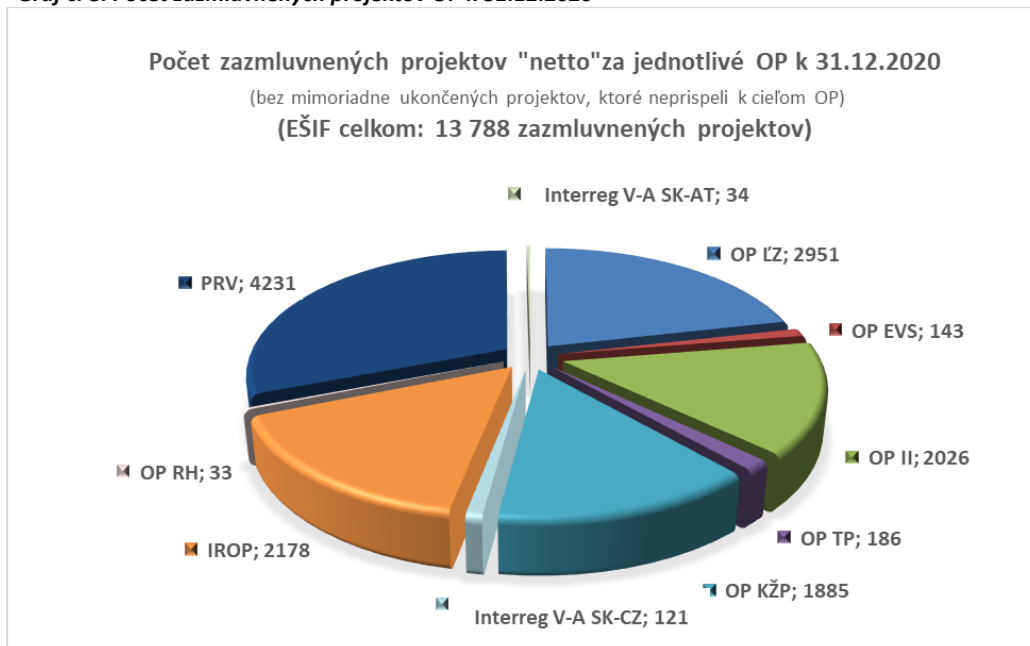


Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT

Graf č. 9: Počet ukončených projektov OP k 31.12.2020

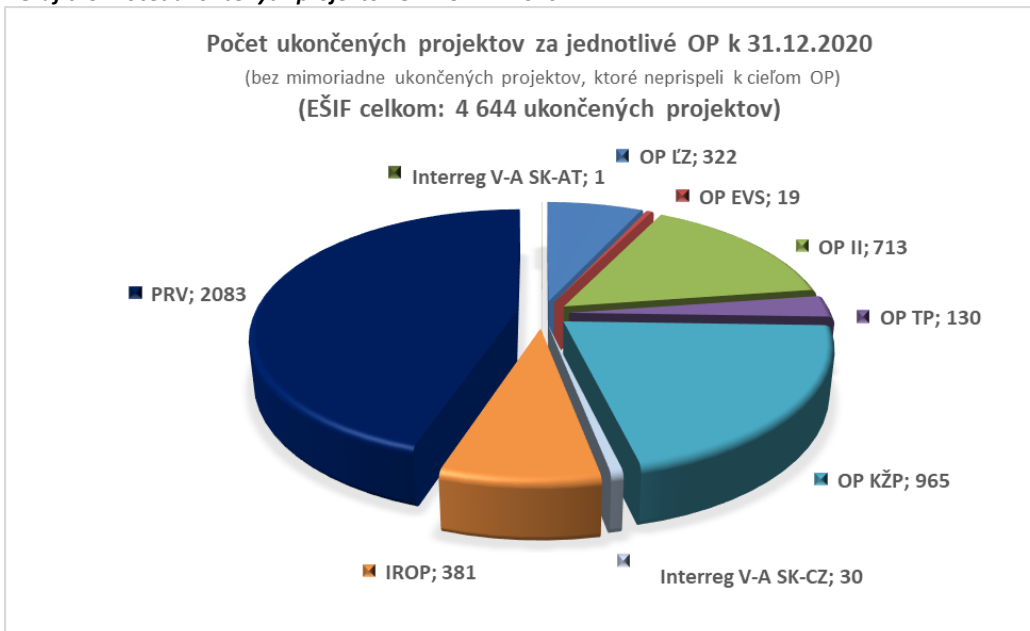

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT

Graf č. 10: Podiel ukončených projektov na kontrahovaní netto za jednotlivé OP k 31.12.2020

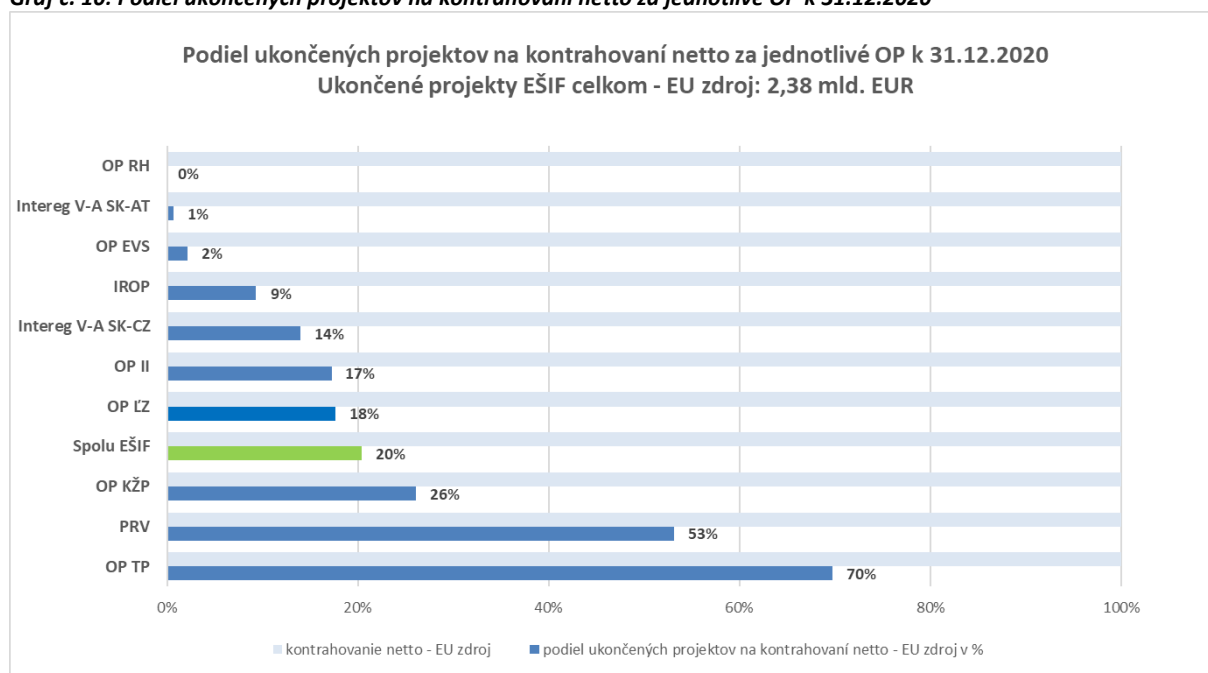

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT

K 31.12.2020 predstavuje **podiel čerpanej sumy za ukončené projekty EŠIF na celkovom kontrahovaní 20,37 %**, z celkovej alokácie EŠIF tento podiel predstavuje **15,53 %**. Percentuálne najvyšší objem čerpanej sumy za ukončené projekty zo zazmluvneného objemu predstavujú ukončené projekty OP TP a PRV.

9. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA KRAJOV

Čo sa týka implementácie EŠIF podľa jednotlivých krajov, k 31.12.2020 evidujeme najvyšší objem zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.


Tabuľka č. 9: Implementácia EŠIF podľa jednotlivých krajov k 31.12.2020

Samosprávny kraj	Kontrahovanie ³ (Celkové oprávnené výdavky)	Čerpanie ⁴ (Celkové oprávnené výdavky)
Žilinský	2 294 018 467,48	1 290 192 374,89
Prešovský	1 828 942 113,40	650 270 707,21
Košický	1 533 692 382,27	753 887 198,98
Trenčiansky	1 483 938 709,16	627 414 465,02
Banskobystrický	1 430 386 795,77	528 912 022,70
Nitriansky	1 194 636 745,08	447 098 445,12
Trnavský	944 215 550,46	300 055 282,27
Bratislavský	705 982 054,07	200 440 368,14

Zdroj: ITMS2014+ export dát 04.01.2021, fin. údaje v EUR

Pozn.: celkové oprávnené výdavky = EÚ zdroj + ŠR zdroj + vlastné zdroje prijímateľa

Graf č. 11 Implementácia EŠIF podľa krajov – celkové oprávnené výdavky

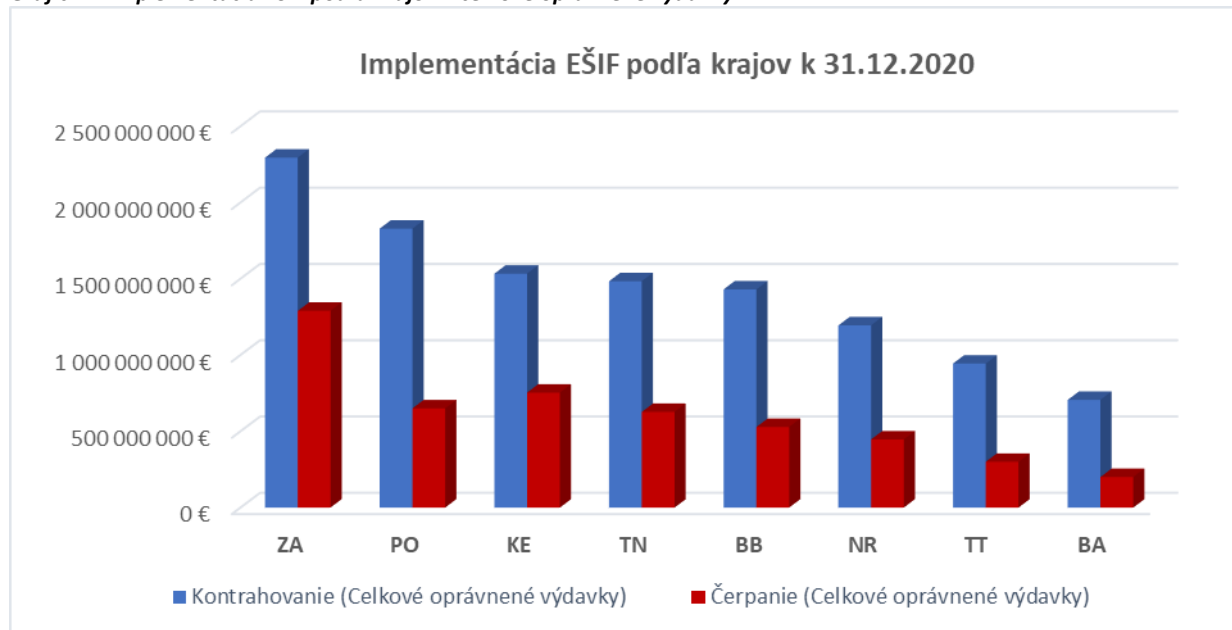

Zdroj ITMS 2014+; export dát 04.01.2021, fin. údaje v EUR

³ Kontrahovanie COV – ide o zazmluvnenú sumu celkových oprávnených výdavkov všetkých projektov, okrem projektov, ktoré boli mimoriadne ukončené a neprispeli k cieľom OP, projektov PRV, ktoré nie sú zaregistrované v IMTS 2014+, projektov TP, OP TP a FN.


⁴ Čerpanie COV – ide o oprávnenú sumu celkových oprávnených výdavkov na úrovni schválených Súhrnných ŽoP týchto projektov. V prípade, že sa projekt realizuje vo viacerých krajoch, do prehľadov vstupujú sumy za takýto projekt len vtedy, ak RO rozdelil jeho zazmluvnenú sumu podľa miesta realizácie v ITMS2014+, v časti rozdelenie podľa jednotlivých kategórií intervencie.

10. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA TYPOV PROJEKTOV

Z pohľadu implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem zazmluvnených finančných prostriedkov predstavujú **dopytovo-orientované projekty** (42,51 %), ktoré majú najvyššie zastúpenie v rámci PRV, v programoch cezhraničnej spolupráce, OP KŽP a IROP. **Národné projekty** majú 31,23 %-ný podiel na celkovom kontrahovaní EŠIF a prevládajú v rámci OP ĽZ a OP EVS, značne sú zastúpené aj v OP II, v malej miere sa implementujú v OP RH a KŽP. **Veľké projekty** tvoria 13,72 % kontrahovania a implementujú sa v rámci OP II, v menšej miere aj v rámci OP KŽP. **Finančné nástroje** tvoria 7,64 % z celkovej nakontrahovanej sumy, implementujú sa prostredníctvom IROP, OP II, OP KŽP a OP ĽZ.

Čo sa týka čerpania podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem čerpaných finančných prostriedkov k 31.12.2020 evidujeme za dopytovo-orientované projekty (40,93 %), ďalej za národné projekty (28,54 %), veľké projekty (17,55 %), finančné nástroje (6,75 %) a projekty technickej pomoci (6,23 %).


Graf č. 12 Implementácia EŠIF – kontrahovanie brutto⁵ podľa typov projektov k 31.12.2020

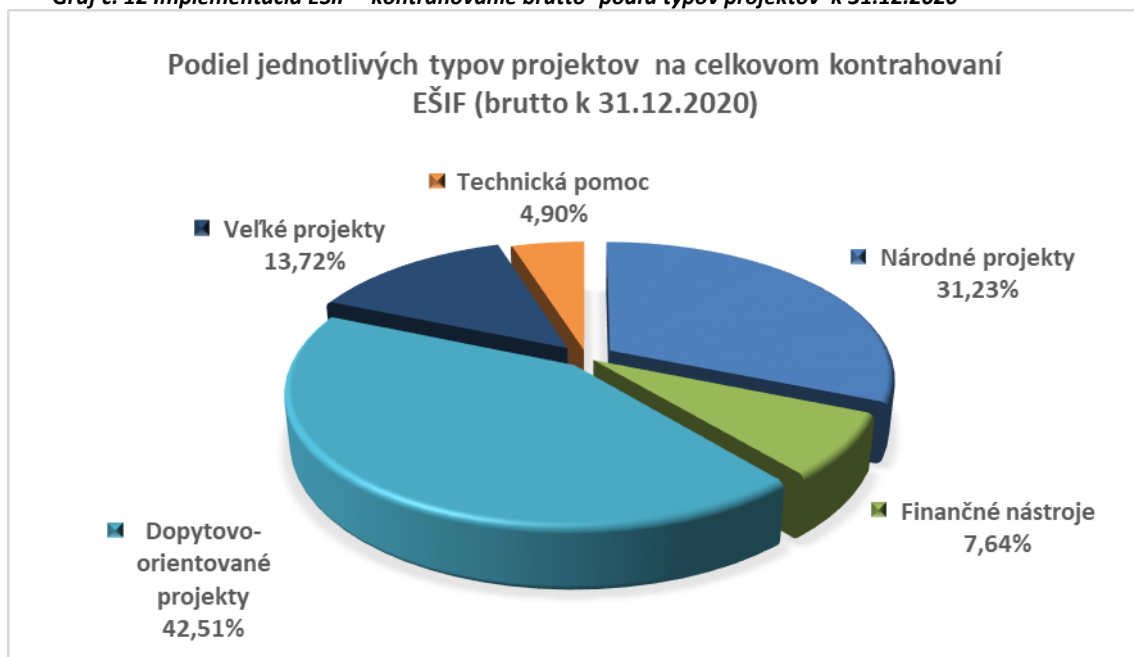

Zdroj: ITMS 2014+; export dát 11.01.2021 a RO PRV

⁵ kontrahovanie brutto – suma príspevku zo zdrojov Európskej únie, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020.

Graf č. 13 Implementácia EŠIF – schválené SŽoP podľa typov projektov

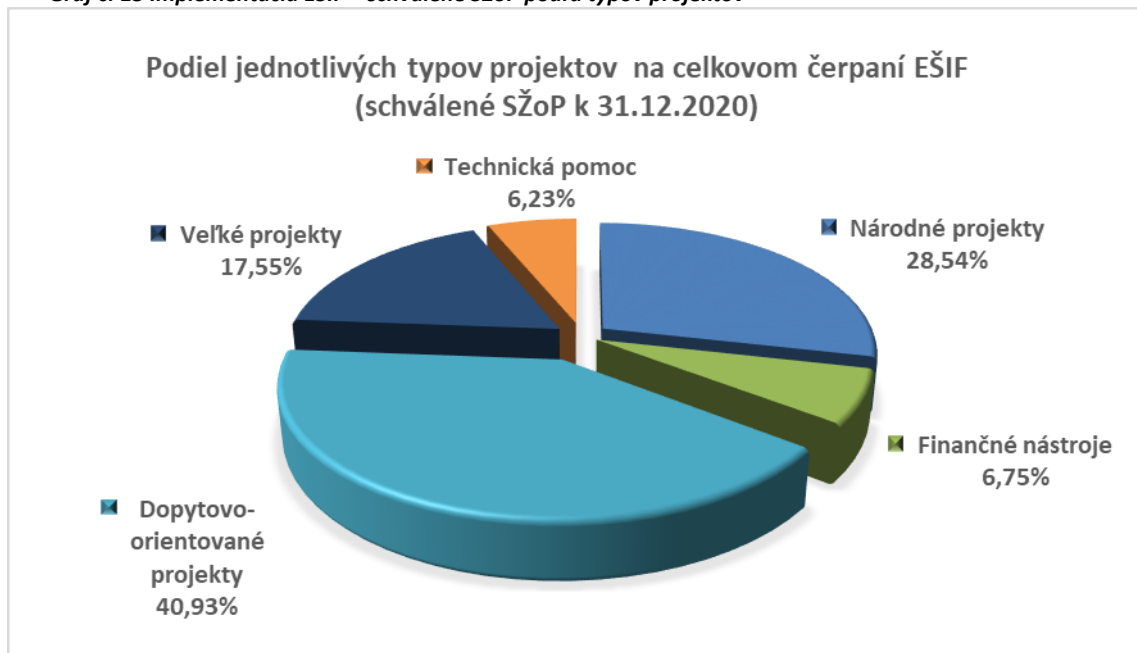

Zdroj: ITMS 2014+; export dát 01.01.2021 a RO PRV

11. OPATRENIA NA BOJ S PANDÉMIOU COVID-19 A ZMIERNENIE JEJ DÔSLEDKOV

REALOKÁCIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF

MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID-19 vypracovalo **Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou koronavírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov**, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020. Na opatrenia, ktoré majú vo významnej miere prispieť k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a opätovne ju naštartovať, bolo alokovaných **1,105 mld. EUR** z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF.

COVID opatrenia sú zamerané na:

- podporu udržania zamestnanosti: **410,26 mil. EUR (OP ĽZ)**
- podporu zdravotníckeho systému: **204,30 mil. EUR (IROP, OP II)**
- podporu pre mikro, malé a stredné podniky: **330,20 mil. EUR (OP II)**
- podporu zložiek integrovaného záchranného systému: **51,00 mil. EUR (OP KŽP)**
- iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: **109,30 mil. EUR (OP ĽZ)**

K 31.12.2020 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,116 mld. EUR (100,99 %), zazmluvnených 968,28 mil. EUR (87,62 %) a vyčerpaných 342,86 mil. EUR (31,03 %).

1. Podpora udržania zamestnanosti tzv. Kurzarbeit

➤ Implementované v rámci **PO 3 OP Ľudské zdroje**

- Schválená realokácia vo výške **410,26 mil. EUR**
- **2 národné projekty s alokáciou 460,26 mil. EUR:**
 1. NP „Prvá pomoc“ (alokácia 390,26 mil. EUR) - vyzvanie vyhlásené 21.07.2020, ŽoNFP predložená 22.07.2020, **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 11.08.2020**, čerpanie predstavuje **251,93 mil. EUR (EU zdroj)**.
 2. NP „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ (alokácia 70 mil. EUR) - vyzvanie vyhlásené 16.07.2020, ŽoNFP predložená 21.07.2020, **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 14.08.2020**.

2. Podpora zdravotníckeho systému

➤ Implementované v rámci **PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra** (dlhodobý strategický výskum)

- Schválená podpora vo výške **7 mil. EUR**
- **1 už vyhlásená výzva** (OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08) zameraná na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie - alokácia na výzvu navýšená o 6,94 mil. EUR, **1 zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 07.11.2020** vo výške **6,11 mil. EUR** za EU zdroj

➤ Implementované v rámci **PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra** (výskumné inštitúcie)

- Schválená podpora vo výške **80 mil. EUR**
- **2 dopytovo orientované výzvy:**

1. Výzva na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (alokácia 60 mil. EUR) – **vyhlásená 05.08.2020, doručených 46 ŽoNFP v celkovej sume 142,80 mil. EUR (EÚ+ŠR).**
2. Výzva na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia 20 mil. EUR) – **vyhlásená 05.08.2020, doručených 11 ŽoNFP v celkovej sume 18,82 mil. EUR (EÚ+ŠR).**

➤ **Implementované v rámci PO 2 Integrovaný regionálny OP**

- Schválená realokácia vo výške **117,30 mil. EUR**
- **4 dopytovo orientované výzvy a 2 vyzvania na NP:**

1. Výzva - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie - **nemocnice** (alokácia 48 mil. EUR) – **vyhlásená 27.08.2020, doručených 50 ŽoNFP v sume 63,27 mil. EUR (EÚ+ŠR)**
2. Výzva určená pre subjekty mimo trvalej hospodárskej mobilizácie (**menšie nemocnice**) (indikatívna alokácia 3 mil. EUR) – **v príprave (plánované vyhlásenie po revízii IROP)**
3. Výzva na podporu prevencie a diagnostiky ochorenia Covid 19 pre oprávneného žiadateľa **VÚC - ambulancie** (indikatívna alokácia 25 mil. EUR) – **v príprave**
4. Výzva na podporu prevencie COVID-19 pre oprávneného žiadateľa Hlavné mesto SR **Bratislava a krajské mestá** Košice, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica a Prešov (indikatívna alokácia 8 mil. EUR) – **vyhlásená 10.12.2020.**
5. NP „Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandemiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19“- I“ pre prijímateľa MZ SR - refundácia pľúcnych ventilátorov a úhrada výdavkov ÚVZ SR (alokácia 12,59 mil. EUR EU zdroj) – **vyzvanie vyhlásené 26.10.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 27.11.2020 vo výške 8,77 mil. EUR za EU zdroj, z tejto sumy bolo už vyčerpaných 8,14 mil. EUR.**
6. NP prijímateľa MZ SR so zameraním na **IT systém a sanitky** (čerpanie plánované až v roku 2021) – **v príprave (plánované vyhlásenie na prelome rokov 2020/2021)**

3. Podpora MSP - „SIH antikورونا záruky“

➤ **Implementované v rámci PO 11 a 12 OP Integrovaná infraštruktúra**

- Schválená realokácia vo výške **330,20 mil. EUR**
- **4 už zazmluvnené projekty na finančné nástroje** – alokácia projektov navýšená o **359,88 mil. EUR** (celková suma je vyššia, ako bola stanovená v zmysle uznesenia), **z toho čerpanie zatiaľ vo výške 25 % navýšenej alokácie v sume 82,59 mil. EUR**

4. Podpora zložiek integrovaného záchranného systému

➤ **Implementované v rámci PO 3 OP Kvalita životného prostredia**

- Schválená podpora vo výške **51 mil. EUR** (využitie zostatku vo výzve v sume 13 mil. EUR a navýšenie alokácie na výzvu o 38 mil. EUR)

- **1 už vyhlásená výzva** (OPKŽP-PO3-SC313-2017-31) zameraná na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni - **v rámci výzvy bolo na opatrenia COVID predložených 12 ŽoNFP v celkovej výške 73,62 mil. EUR (EÚ+ŠR)**, účinnosť nadobudli 3 zmluvy o poskytnutí NFP, čo predstavuje **kontrahovanie** vo výške **44,74 mil. EUR za EU zdroj**, z tejto sumy sa už **vyčerpalo 89 615,34 EUR**.

5. Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19

➤ Implementované v rámci **PO 1 OP Ľudské zdroje**

- Schválená podpora vo výške **73,30 mil. EUR**
- **3 vyzvania na NP:**
 1. NP stabilizácie a zabezpečenia kontinuity pedagogických zborov v rámci PO1 (indikatívna alokácia 6 mil. EUR) – **v príprave**
 2. NP - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (alokácia 63,31 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, **ŽoNFP predložená 10.08.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 28.10.2020 vo výške 63,31 mil. EUR za EU zdroj.**
 3. NP - Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie – Usmerňovať pre prax (alokácia 4,36 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, **ŽoNFP predložená 29.06.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 24.09.2020 vo výške 4,31 mil. EUR za EU zdroj.** Z tejto sumy sa už **vyčerpalo 106 799 EUR**.

➤ Implementované v rámci **PO 5 OP Ľudské zdroje**

- Schválená podpora vo výške **28 mil. EUR**
- **3 vyzvania na NP:**
 1. NP „Korona te merel“ - posilnenie činnosti zdravotných asistentov v teréne vrátane zabezpečenia vybavenia ľudí v teréne a marginalizovaných rómskych komunít - domácností (indikatívna alokácia 1,20 mil. EUR) – vyhlásené 30.06.2020, **ŽoNFP predložená 04.08.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 31.10.2020 vo výške 1,06 mil. EUR za EU zdroj.**
 2. NP - Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK (alokácia 5,50 mil. EUR) – vyhlásené 29.06.2020, **ŽoNFP predložená 28.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 23.09.2020 vo výške 4,84 mil. EUR za EU zdroj**
 3. NP - Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. (NP PRIM II. – Projekt Inklúzie v Materských školách) (alokácia 15 mil. EUR) – vyhlásené 29.06.2020, **ŽoNFP predložená 24.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 23.09.2020 vo výške 14,99 mil. EUR za EU zdroj**

Ostatné opatrenia nad rámec vyčlenenej alokácie

➤ Implementované v rámci **PRV**

1. dopytovo orientovaná výzva - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19 (alokácia 14,78 mil. EUR) – **vyhlásená 24.08.2020, prijatých 317 ŽoNFP v sume 7 405 375,77 EUR (NFP), uzavretých 165 zmlúv v celkovej výške 2 698 523,30 EUR za EU zdroj**

➤ Implementované v rámci **PO 1 OP Ľudské zdroje**

1. NP - Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) - (alokácia 5,08 mil. EUR) – vyhlásené 03.09.2020 (do pôvodného vyzvania bol doplnený partner a COVID aktivity), **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 28.10.2020 vo výške 5,08 mil. EUR za EU zdroj, z tejto sumy sa už vyčerpalo 106 148,47 EUR.**

REACT – EU

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je **3. balíček podpory EK - REACT-EU v celkovej hodnote približne 780 mil. EUR, o ktorú sa navýši finančná obálka programového obdobia 2014 – 2020.** Zdroje sa členským krajinám pridelujú v dvoch fázach. Na rok 2021 má SR k dispozícii 618 mil. EUR na navýšenie rozpočtov operačných programov. Zvyšných približne 162 mil. EUR bude k dispozícii pre OP na rok 2022, avšak presnú sumu určí EK vo vykonávacom akte **V zmysle materiálu č. UV-20294/2020, ktorý vláda SR vzala na vedomie na zasadnutí dňa 23.09.2020, má byť podpora z REACT-EU zameraná najmä:**

- podporu aktivít na udržanie a vytváranie pracovných miest a pokračovanie poskytovania sociálnych služieb občanom. Pomoc má byť poskytnutá aj regiónom vo forme financovania zelených aktivít (cyklotrasy, zelená infraštruktúra) a podpora bude smerovať aj na zatepľovanie bytových domov a zvýšenie kapacít základných škôl. V rámci boja s pandemiou budú finančne podporení zamestnanci v prvej línii ako sú zdravotníci alebo policajti. Keďže súčasná kríza má za následok aj zvyšovanie počtu najodkázanejších osôb, pomoc z REACT-EU bude smerovať aj na pokračovanie distribúcie potravinových a hygienických balíčkov pre tieto osoby.
- **Tieto aktivity bude možné realizovať navýšením alokácie v štyroch OP: OP ĽZ, IROP, OP EVS a OP FEAD. MIRRI SR v spolupráci s RO finalizuje negociácie s EK ohľadom prerozdelenia zdrojov REACT-EU. O konkrétnych výsledkoch z týchto rokovaní bude možné informovať verejnosť až po ich oficiálnom ukončení, čo očakávame v priebehu I.Q 2021**
- V súčasnosti prebiehajú finálne negociácie s EK k prerozdeleniu zdrojov REACT-EU a po ich ukončení bude možné na EK predkladať revízie operačných programov, keďže Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 2020/2221 z 23.12.2020 k REACT-EU už bolo prijaté. Po schválení revízií operačných programov Európskou komisiou, čo sa predpokladá **koncom I.Q 2021, budú môcť** riadiace orgány jednotlivých operačných programov **vyhlasovať výzvy** zamerané na riešenie negatívnych dôsledkov pandémie.

12. ZJEDNODUŠOVANIE PROCESOV IMPLEMENTÁCIE

ZÁKON Č. 292/2014 Z. Z. O PRÍSPEVKU Z EŠIF

Dňa 21.05.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF tzv. „lex corona“, ktorou bolo umožnené zjednodušenie procesov pri poskytovaní príspevkov z EŠIF pre poskytovateľov (riadiace orgány) ako aj pre žiadateľov a prijímateľov. Zmeny, ktoré predmetná novela priniesla sú rozdelené na zmeny časovo neobmedzené a zmeny časovo obmedzené na obdobie krízovej

situácie, ktorá je definovaná ako čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu na obdobie šesť mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní.

Prehľad niektorých zmien, ktoré predmetná lex corona priniesla v reakcii na COVID - 19:

- zasadnutie a hlasovanie vybraných kolektívnych orgánov prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie (týka sa napr. Monitorovacieho výboru a osobitných komisií),
- odpustenie zmeškania vybraných zákonných lehôt, ku ktorému došlo v období od 12. marca 2020 do účinnosti zákona, t. j. do 21. mája 2020 (napr. lehota na doplnenie ŽoNFP na výzvu poskytovateľa, preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve pred aplikáciou zásobníka projektov, podanie odvolania, vydanie rozhodnutia v odvolacom konaní, vydanie rozhodnutia v preskúmovacom konaní a pod.)
- možnosť flexibilnejšie zmeniť vyhlásenú výzvu (z dôvodu zmien formálnych náležitostí, podmienok poskytnutia príspevku aj príloh výzvy; zrušenie obmedzenia možnosti zmeniť výzvu len ak sa podstatným spôsobom nezmenia podmienky poskytnutia príspevku),
- možnosť flexibilnejšie zrušiť vyhlásenú výzvu (ak z objektívnych aj iných skutočností, ktoré nastali po vyhlásení výzvy, nie je možné financovať projekty na základe výzvy),
- možnosť zastaviť konanie o ŽoNFP (oproti pôvodnej povinnosti zastaviť takéto konanie),
- možnosť zmeny už uzavretého vyzvania (napr. pri národných projektoch) v reakcii na COVID – 19 (s výnimkou podmienky oprávnenosti žiadateľa a oprávnenosti partnera),
- hromadná zmena zmluvy (nový zjednodušený inštitút možnej zmeny zmluvy bez potreby uzatvorenia množstva dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP), pričom iniciátorom zmeny môže byť CKO alebo CO pri zachovaní zásady, že tieto zmeny nesmú mať negatívny vplyv na prijímateľa,
- predĺženie lehôt v súvislosti s dohodami o splátkach a dohodami o odklade plnenia v čase krízovej situácie (napr. predĺženie lehoty na splátky z pôvodných maximálnych troch rokov na päť rokov a predĺženie odkladu plnenia z pôvodného maximálneho jedného roka na tri roky).

MIRRI SR pripravilo vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe **d ďalšiu novelu zákona o príspevku z EŠIF, ktorá bola schválená na rokovaní vlády SR dňa 13.01.2021.** Cieľom novely je zjednodušiť procesy, znížiť administratívnu záťaž poskytovateľov, prijímateľov a ďalších subjektov, ako aj zvýšiť transparentnosť. V novele sa vzhľadom na pozitívnu skúsenosť s aplikáciou natrvalo zavádzajú niektoré opatrenia, ktoré mali byť pôvodne uplatňované iba počas krízovej situácie, konkrétne:

- zjednodušená zmena a rušenie výziev v prípade, ak je to nevyhnutné z dôvodu potreby poskytnutia finančných prostriedkov z fondov EÚ na iné aktivity (projekty), pri dodržaní podmienok zachovania transparentnosti a rovnakého prístupu žiadateľov k týmto finančným prostriedkom,
- možnosť úpravy metodiky zjednodušeného vykazovania výdavkov podľa potrieb vyplývajúcich z implementačnej praxe.

Ďalšími zavádzanými opatreniami sú:

- zverejňovanie nedostatkov a odporúčaní z auditov vykonávaných orgánom auditu – opatrenie zvýši nielen informovanosť verejnosti o najvážnejších zisteniach v implementácii fondov EÚ, ale tiež umožní ostatným riadiacim orgánom neopakovať tieto pochybenia v budúcnosti,

- zjednodušenie spôsobu poskytovania finančných prostriedkov z EFRR v prípadoch, kedy je potrebné v krátkej dobe poskytnúť prostriedky veľkému množstvu subjektov (napr. zdravotníckym ambulanciám). Predmetný mechanizmu spočíva v možnosti poskytnutia finančných prostriedkov užívateľom prostredníctvom rozhodnutí, výmerov alebo iných opatrení (nie na základe zmluvy),
- možnosť podať odvolanie aj voči rozhodnutiam riadiacich orgánov o zastavení konania, ktoré doteraz žiadatelia nemali. Navrhovaná zmena kvalitatívne vylepšuje postavenie žiadateľov v procese schvaľovania ich žiadostí a dáva širšie možnosti na nápravu nesprávneho rozhodnutia riadiaceho orgánu,
- možnosť, aby jedno vyzvanie bolo základom pre podanie viacerých národných projektov alebo projektov technickej pomoci toho istého žiadateľa alebo rôznych žiadateľov. To znamená, že sa na úrovni všeobecne záväzného právneho predpisu potvrdzuje už skôr zavedená aplikačná prax, ktorá však nebola jednotná. Zvyšuje sa tým právna istota, a to aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov generovaných v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci,
- vo vzťahu k ochrane finančných záujmov EÚ novela zjednodušuje úlohy subjektov zapojených do implementácie (pre riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, orgán auditu, platobné jednotky aj certifikačný orgán) v súvislosti s vypracovaním správy o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa po novom bude vypracovávať a zasielať prijímateľovi a ďalším relevantným subjektom iba prostredníctvom ITMS. Ďalej sa upresňujú niektoré postupy pri ukladaní finančných opráv pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania – upresňuje sa odkedy sa počítajú úroky z omeškania a zároveň sa s cieľom zrýchlenia implementácie a vysporiadania finančných vzťahov ustanovuje 6-mesačná lehota, v ktorej musí poskytovateľ vydať rozhodnutie v správnom konaní, ktorým uloží danú korekciu,
- poskytovateľom sa stanovuje povinnosť zverejňovať v rámci zoznamu schválených aj neschválených projektov aj fyzické a právnické osoby, ktoré sa spolupodieľali na príprave projektu (okrem osôb v pracovnom alebo služobnom pomere k žiadateľovi). Predmetný návrh zvyšuje transparentnosť v procese implementácie fondov EÚ a zároveň znižuje riziko vzniku potenciálneho konfliktu záujmov.

SYSTÉM RIADENIA EŠIF

Medzi najdôležitejšie opatrenia zavedené v novembri na úrovni Systému riadenia EŠIF patria **zjednodušenia v oblasti verejného obstarávania**, ktoré vstúpili do praxe v decembri.

- zavedenie pravidla, podľa ktorého RO bude vykonávať kontrolu iba v tých fázach, ktoré určuje Systém riadenia EŠIF,
- prvá ex ante kontrola bude na dobrovoľnom rozhodnutí prijímateľa a môže sa okrem nadlimitných zákaziek týkať aj podlimitných zákaziek na stavebné práce,
- zvýšenie finančného limitu pre zákazky s nízkou hodnotou, spolufinancované z EŠIF z 30 000 EUR na 50 000 EUR,
- vypustená možnosť pre RO vykonávať druhú ex ante kontrolu v prípade zákaziek, ktoré povinne kontroluje ÚVO a v týchto prípadoch určenie pravidla, podľa ktorého zmluva, uzavretá ako výsledok VO, nadobudne účinnosť až po ukončení ex post kontroly zo strany RO,

- vypustenie povinnosti oslovovať minimálne troch záujemcov v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR, nakoľko tieto zákazky sú transparentne zverejnené.

Za kľúčové MIRRI SR považuje pripravované vydanie jednotnej príručky pre verejné obstarávanie pre všetky RO.

Okrem týchto opatrení sa MIRRI SR na jeseň prioritne zameralo na zavádzanie zjednodušení a skvalitnenie procesu odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Zmeny v Systéme riadenia EŠIF obsahujú **zmeny vyplývajúce z implementačnej praxe** ako napríklad:

- návrh na uzavretie zmluvy nemusí zaniknúť uplynutím lehoty na jej prijatie (zosúladenie Systému riadenia EŠIF so zákonom o príspevku z EŠIF);
- žiadosti sa vrátia do zásobníka projektov, ak sa počas konania o nich zníži alokácia;
- v rámci jedného vyzvania je možné podporiť viacero žiadateľov a projektov;
- RO môže konzultovať so žiadateľom dožiadanie;
- dokumenty k projektu (najmä k žiadostiam o platbu) sa vkladajú do ITMS2014+ (nie je ich potrebné zasielať listinne);
- o overení možného konfliktu záujmov odborného hodnotiteľa sa zachováva auditná stopa (print screen);

Ďalšie zmeny v Systéme riadenia EŠIF obsahujú ďalšie zjednodušenia ako napr.

- podmienku mať vysporiadané majetkové vzťahy a povolenia na realizáciu projektu je odporúčané overovať až pred uzavretím zmluvy o NFP;
- žiadosť o NFP sa môže schváliť, aj keď sú identifikované neoprávnené výdavky, zníži sa počet bodov hodnotenia;
- RO nevyžaduje k žiadosti o NFP čestné vyhlásenia nad rámec toho, ktoré podpisuje ako súčasť žiadosti o NFP;
- možnosť využívania interných hodnotiteľov (za interných hodnotiteľov sa považujú zamestnanci RO aj zamestnanci inštitúcie, vecne zodpovednej podľa kompetenčného zákona za hodnotenú problematiku);
- hodnotitelia hodnotia štandardne mimo priestorov RO, RO im môže umožniť hodnotenie v jeho priestoroch, ak tomu nebráni napr. karanténna situácia;
- hodnotiace hárky stačí hodnotiteľom podpísať, zoskenovať a zaslať mailom na RO.

Následnú sériu zjednodušení plánuje MIRRI SR zaviesť v pripravovanom Systéme riadenia EŠIF, ktorý bude vydaný v apríli 2021.

ZJEDNODUŠOVANIE VYBRANÝCH PROCESOV IROP

Osobitnou oblasťou zjednodušovania bolo zjednodušovanie vybraných procesov IROP, a to vzhľadom na skutočnosť, že v čase keď nastúpila nová vláda, bol stav čerpania v rámci IROP kritický, nakoľko do konca roka 2020 ostávalo vyčerpať viac ako 177 mil. EUR. S cieľom minimalizovať riziko trvalej straty finančných prostriedkov v rámci IROP, ešte pred prechodom kompetencií na MIRRI SR, pristúpilo

MIRRI SR k spracovaniu analýzy zjednodušenia vybraných procesov, v rámci ktorej boli identifikované 4 systémové návrhy, 32 procesných návrhov a 4 manažérske návrhy.

Cieľom spracovania analýzy zjednodušenia vybraných procesov bolo maximálne zefektívniť, zjednodušiť a urýchliť čerpanie prostriedkov v rámci IROP. Vzhľadom k tomu, že IROP prekročil plnenie pravidla N+3, **môžeme konštatovať, že cieľ analýzy bol splnený na 100 %.**

Stav implementácie 40 návrhov opatrení:

- **38 opatrení implementovaných**, z toho 1 opatrenie implementované čiastočne;
- 2 návrhy opatrení v procese implementácie (opatrenie „zabezpečenie user friendly - web sídla“ a 1 systémové opatrenie).

Zjednodušenia sa týkali oblastí verejného obstarávania, kde napr. išlo o redukcii počtu povinných kontrol VO pri podlimitných zákazkách. Pred zavedením opatrenia bolo kontrola VO vykonávaná až 3x a po zavedení opatrenia sa vykonáva kontrola VO len 1x a dosiahli sme úsporu času až do 6 mesiacov. Ďalšie zjednodušovania sa týkali napr. zjednodušenia v rámci overovania hospodárnosti výdavkov, odborného hodnotenia alebo zjednodušenie pracovného výkazu, pri ktorom sa dosiahla časová úspora až 30 %.

13. UKONČOVANIE PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2007 – 2013

Z celkového záväzku programového obdobia 2007 – 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 – 2013 Slovenská republika vyčerpala prostriedky vo výške **11,236 mld. EUR**, čo predstavuje čerpanie na úrovni **96,72 %**.

Zatiaľ boli v spolupráci s EK **uzatvorené dva programy – OP INTERACT II (14.12.2017) a OP Rybné hospodárstvo (11.07.2019)**. Okrem toho boli v rámci OP Bratislavský kraj a OP Doprava prijaté záverečné platby, nebol doručený tzv. closure letter.

Tabuľka č. 10: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 v EUR za EÚ zdroj

Operačný program	Alokácia 2007-2013	Čerpanie z celkovej alokácie	
	(EUR)	(EUR)	%
	1	2	3
OP Vzdelávanie	542 728 759,88	492 701 929,39	90,78%
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	941 301 578,00	904 354 264,62	96,07%
OP Informatizácia spoločnosti	843 595 405,00	813 163 710,43	96,39%
OP Životné prostredie	1 820 000 000,00	1 739 236 220,62	95,56%
Regionálny OP	1 554 503 927,00	1 477 985 951,99	95,08%
OP Doprava*	3 160 154 595,00	3 155 304 929,86	99,85%
OP Zdravotníctvo	250 000 000,00	218 120 603,02	87,25%
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	968 250 000,00	948 846 739,40	98,00%
OP Technická pomoc	97 601 421,00	88 804 743,83	90,99%
OP Bratislavský kraj	95 207 607,00	92 758 860,93	97,43%
OP Výskum a vývoj	1 209 415 373,00	1 181 538 749,11	97,70%
OP CS SR-ČR	92 740 141,00	84 903 405,24	91,55%
OP INTERACT II	29 306 707,00	28 732 805,17	98,04%
OP Rybné hospodárstvo	12 868 797,00	10 207 430,89	79,32%
Spolu	11 617 674 310,88	11 236 660 344,49	96,72%

Zdroj: CO (MF SR) Pozn.: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 k 30.06.2020 v EUR za EÚ zdroj

14. ZOZNAM SKRATIEK

CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
COV	Celkové oprávnené výdavky
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FEAD	Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci
FN	Finančné nástroje
Interreg V-A SK-AT	Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko
Interreg V-A SK-CZ	Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
IS PPA	Informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry
ITMS2014+	IT monitorovací systém 2014+
IZM	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
KF	Kohézny fond
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MK SR	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MRK	Marginalizované rómske komunity
MSP	Malé a stredné podniky
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MV	Monitorovací výbor
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NP	Národný projekt
OA	Orgán auditu
OP	Operačný program
OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP FEAD	Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci
OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP ĽZ	Operačný program Ľudské zdroje

OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo
OP TP	Operačný program Technická pomoc
OP Val	Operačný program Výskum a inovácie (neskôr zlúčený s OP II)
PO	Prioritná os
PPA	Pôdohospodárska platobná agentúra
PRV	Program rozvoja vidieka
RO	Riadiaci orgán
SIH	Slovenský investičný holding
SFC2014	Shared fund management common system 2014 – 2020/Systém riadenia fondov Európskeho spoločenstva 2014-2020
SO	Sprostredkovateľský orgán
SŽoP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠR	Štátny rozpočet
ÚPVII	Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
VO	Verejné obstarávanie
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu

15. ZOZNAM PRÍLOH

Príloha č.1(a) – 1(k): Implementácia jednotlivých OP

Príloha č. 1 (a): Implementácia OP Ľudské zdroje

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Ľudské zdroje	PO 1 - Vzdelávanie	SO: MŠVVŠ SR	ESF	348 741 004	65 646 163	404 668 725	116,04%	542 615 013	434 368 907	404 528 516	328 047 959	54 596 342	94,07%	94 609 708	15 799 345	27,13%
	PO 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	RO: MPSVR SR SO: I.A MPSVR SR	ESF+IZM	172 270 942	15 200 378	357 124 382	207,30%	339 278 255	323 150 055	221 491 851	206 540 095	14 951 756	119,89%	146 364 962	14 809 797	84,96%
	PO 3 - Zamestnanosť	RO: MPSVR SR SO: I.A MPSVR SR	ESF	1 331 222 796	273 023 216	1 527 774 297	114,76%	1 888 215 570	1 824 760 777	1 683 613 389	1 399 672 482	283 940 906	105,14%	788 752 789	167 217 575	59,25%
	PO 4 - Sociálne začlenenie	RO: MPSVR SR SO: I.A MPSVR SR	ESF	299 669 312	70 139 315	404 665 263	135,04%	491 163 204	442 804 195	400 482 527	328 677 128	71 805 399	109,68%	149 375 215	31 320 977	49,85%
	PO 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít	SO: MV SR	ESF	161 954 885	26 555 870	215 412 251	133,01%	307 057 929	227 605 078	179 696 883	154 670 611	25 026 272	95,50%	62 487 701	9 558 435	38,58%
	PO 6 - Technická vybavenosť v oblastiach s prítomnosťou MRK	SO: MV SR	EFRR	220 707 577	25 495 010	314 102 848	142,32%	430 177 609	208 143 813	149 844 937	133 465 583	16 379 354	60,47%	39 556 819	4 822 344	17,92%
	PO 7 - Technická pomoc	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF	78 600 000	16 103 753	95 686 529	121,74%	110 776 840	109 965 528	90 912 042	75 739 517	15 172 526	96,36%	54 640 610	10 905 675	69,52%
	CELKOM OP ĽZ			2 613 166 516	492 163 705	3 319 434 293	127,03%	4 109 284 420	3 570 798 354	3 130 570 144	2 626 813 375	481 872 555	100,52%	1 335 787 804	254 434 148	51,12%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (b): Implementácia OP Integrovaná infraštruktúra

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Integrovaná infraštruktúra	PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	KF	725 839 166	128 089 265	1 156 444 285	159,33%	730 245 376	723 810 997	723 183 111	614 705 645	108 477 467	84,69%	337 325 888	59 528 098	46,47%
	PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)	RO: MDV SR	KF	1 120 038 905	197 653 925	1 712 393 117	152,89%	1 883 097 304	1 607 175 746	1 424 765 801	1 211 050 931	213 714 870	108,13%	749 019 436	132 179 901	66,87%
	PO 3 - Verejná osobná doprava	RO: MDV SR	KF	329 337 000	39 922 000	388 005 492	117,81%	275 398 137	253 105 527	238 116 441	212 845 733	25 270 708	64,63%	183 329 413	21 753 132	55,67%
	PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	RO: MDV SR	KF	91 924 095	9 122 062	11 142 255	12,12%	24 524 496	8 648 947	1 390 145	1 321 490	68 655	1,44%	671 266	23 398	0,73%
	PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	EFRR	223 951 749	39 520 897	487 483 061	217,67%	221 677 190	126 484 739	126 484 739	105 957 614	18 697 639	47,31%	14 506 074	2 559 410	6,48%
	PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	RO: MDV SR	EFRR	779 886 032	137 626 947	1 043 595 713	133,81%	621 942 856	417 646 559	377 865 290	321 185 497	56 679 794	41,18%	133 030 914	23 476 044	17,06%
	PO 7 - Informačná spoločnosť	SO: MIRRI SR	EFRR	676 940 302	119 460 054	821 424 830	121,34%	1 122 864 910	945 646 478	824 642 909	610 962 831	104 812 237	90,25%	130 722 305	22 966 718	19,31%
	PO 8 - Technická pomoc	RO: MDV SR SO: MIRRI SR	EFRR	87 000 000	15 352 942	87 000 000	100,00%	109 889 374	98 017 741	94 258 457	77 348 490	13 658 051	88,91%	45 348 984	8 007 638	52,13%
	PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	1 026 183 946	53 188 214	1 370 772 672	133,58%	2 131 012 995	955 402 674	842 194 011	753 133 427	59 439 014	73,39%	283 074 167	18 860 258	27,59%
	PO 10 - Podpora výskum, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji	SO: MŠVVŠ SR MH SR	EFRR	117 225 015	94 474 980	135 499 700	115,59%	356 341 880	214 350 731	204 396 774	109 023 932	95 372 841	93,00%	11 810 860	10 818 762	10,08%
	PO 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP	SO: MH SR	EFRR	663 734 672	87 243 066	700 802 780	105,58%	536 432 967	407 482 127	689 071 161	602 744 888	86 326 273	90,81%	196 464 144	22 089 666	29,60%
	PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP v Bratislavskom kraji	SO: MH SR	EFRR	97 876 729	87 412 126	86 632 325	88,51%	72 465 756	69 480 588	165 978 315	84 249 384	81 728 932	86,08%	23 654 882	21 820 811	24,17%
	PO 13 - Technická pomoc VaI	SO: MŠVVŠ SR MH SR	EFRR	70 000 000	14 341 765	84 157 539	120,23%	103 094 152	95 732 188	81 172 830	67 369 443	13 803 387	96,24%	51 949 507	10 644 633	74,21%
CELKOM OP II				6 009 937 611	1 023 408 243	8 085 353 767	134,53%	8 188 987 392	5 922 985 042	5 793 519 985	4 771 899 304	878 049 866	79,40%	2 160 907 842	354 728 467	35,96%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (c): Implementácia OP Kvalita životného prostredia

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Kvalita životného prostredia	PO 1 - Udržiateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environment. infraštruktúry	SO: SAŽP	KF	1 498 481 123	151 326 581	1 638 562 870	109,35%	2 646 148 796	1 325 083 143	1 067 046 563	960 262 024	106 784 539	64,08%	641 139 719	62 151 596	42,79%
	PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	SO: SAŽP	KF	225 381 138	38 729 711	238 674 419	105,90%	399 379 919	176 093 021	125 261 928	108 563 703	16 698 225	48,17%	27 962 302	4 499 644	12,41%
	PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy	SO: MV SR, SO: SAŽP	EFRR	243 896 216	40 171 209	281 371 181	115,37%	670 624 459	312 151 588	219 781 964	181 930 218	31 793 485	74,59%	61 950 624	10 938 953	25,40%
	PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	SO: SIEA	EFRR	787 772 813	83 245 892	990 402 691	125,72%	1 215 815 601	838 861 041	700 292 989	621 327 962	73 924 484	78,87%	352 444 542	42 862 102	44,74%
	PO 5 - Technická pomoc	SO: SAŽP, MV SR, SIEA RO: MŽP SR	EFRR	77 000 000	15 775 942	72 500 000	94,16%	96 507 304	90 785 882	73 850 097	61 291 565	12 558 532	79,60%	52 498 560	10 756 853	68,18%
	CELKOM OP KŽP:			2 832 531 290	329 249 335	3 221 511 160	113,73%	5 028 476 079	2 742 974 674	2 186 233 541	1 933 375 471	241 759 265	68,26%	1 135 995 748	131 209 147	40,11%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (d): Implementácia Integrovaného regionálneho OP

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Integrovaný regionálny operačný program	PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	384 029 978	61 092 037	506 254 150	131,83%	741 162 218	360 634 133	310 101 020	269 039 787	41 061 233	70,06%	124 323 220	21 195 156	32,37%
	PO 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB), MZ SR	EFRR	725 160 664	145 614 465	936 945 332	129,21%	970 421 765	705 539 358	558 454 984	485 201 825	73 253 160	66,91%	186 865 489	28 575 170	25,77%
	PO 3 -Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	SO: MK SR	EFRR	122 127 561	31 567 811	185 615 931	151,99%	279 077 075	173 698 387	112 816 281	95 176 348	17 639 933	77,93%	13 782 216	2 738 103	11,29%
	PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	317 508 751	60 188 445	373 777 305	117,72%	506 672 983	438 271 596	363 185 642	302 068 794	61 116 848	95,14%	182 278 379	42 079 990	57,41%
	PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou	RO: MIRRI SR	EFRR	89 114 824	562 735	105 586 708	118,48%	117 155 499	88 754 983	78 458 609	78 182 509	276 100	87,73%	11 156 821	0	12,52%
	PO 6 - Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	62 000 000	11 955 665	53 462 959	86,23%	64 008 806	60 288 300	56 944 556	47 702 594	9 241 963	76,94%	37 591 085	7 321 845	60,63%
	CELKOM IROP:			1 699 941 778	310 981 158	2 161 642 385	127,16%	2 678 498 345	1 827 186 757	1 479 961 092	1 277 371 856	202 589 236	75,14%	555 997 210	101 910 264	32,71%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (e): Implementácia OP Efektívna verejná správa

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Efektívna verejná správa	PO 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS	RO: MV SR	ESF	200 892 184	37 730 586	221 857 986	110,44%	303 525 443	257 741 895	221 052 090	169 232 878	33 594 924	84,24%	84 728 907	19 429 693	42,18%
	PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva	RO: MV SR	ESF	37 446 341	7 533 343	34 940 000	93,31%	43 487 606	43 392 415	35 417 374	25 124 740	5 527 541	67,10%	13 825 158	3 512 568	36,92%
	PO 3 - Technická pomoc	RO: MV SR	ESF	13 137 972	2 691 739	12 850 000	97,81%	15 163 656	15 163 656	15 163 656	12 585 165	2 578 491	95,79%	7 204 043	1 476 003	54,83%
	CELKOM OP EVS:			251 476 497	47 955 668	269 647 986	107,23%	362 176 705	316 297 966	271 633 121	206 942 784	41 700 955	82,29%	105 758 107	24 418 264	42,05%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (f): Implementácia OP Technická pomoc

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Technická pomoc	PO 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF	RO: MIRRI SR	EFRR	124 235 750	21 886 457	140 642 672	113,21%	196 134 633	175 092 272	141 655 767	116 405 169	20 349 515	93,70%	96 032 037	16 854 898	77,30%
	PO 2 - Systémová a technická podpora	RO: MIRRI SR	EFRR	34 836 162	6 147 558	29 860 318	85,72%	29 328 845	27 671 855	24 273 457	19 918 798	3 517 224	57,18%	10 077 764	1 779 513	28,93%
	CELKOM OP TP:			159 071 912	28 034 015	170 502 990	107,19%	225 463 477	202 764 127	165 929 223	136 323 968	23 866 739	85,70%	106 109 802	18 634 411	66,71%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (g): Implementácia Programu rozvoja vidieka

Program	Typ opatrenia	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Program rozvoja vidieka	Projektové opatrenia PRV okrem projektov MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	809 803 147	281 067 052	984 406 865	121,56%	2 175 005 995	943 644 024	885 990 082	659 480 779	226 509 303	81,44%	415 537 515	141 830 933	51,31%
	Projektové opatrenia PRV - len projekty MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	67 334 152	23 809 626	0	0,00%	41 231 096	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Neprojektové opatrenia PRV	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	623 262 755	214 867 245	623 262 755	100,00%	867 426 993	758 393 795	758 393 795	563 658 924	194 734 871	90,44%	525 327 655	181 446 644	84,29%
	Technická pomoc	RO: MPRV SR	EPFRV	59 291 790	19 763 930	62 614 162	105,60%	63 208 554	63 208 554	63 208 554	47 406 415	15 802 138	79,95%	25 392 256	8 464 085	42,83%
	CELKOM PRV:			1 559 691 844	539 507 853	1 670 283 782	107,09%	3 146 872 637	1 765 246 373	1 707 592 431	1 270 546 118	437 046 313	81,46%	966 257 427	331 741 663	61,95%

Zdroj: RO PRV

Príloha č. 1 (h): Implementácia OP Rybné hospodárstvo

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach	SO: PPA, RO: MPRV SR	ENFR	6 863 860	2 287 955	6 741 712	98,22%	9 816 136	3 976 514	3 177 915	2 383 436	794 479	34,72%	313 999	104 666	4,57%
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP	SO: PPA, RO: MPRV SR	ENFR	965 998	172 811	269 610	27,91%	406 918	127 117	127 117	114 405	12 712	11,84%	0	0	0,00%
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	SO: PPA, RO: MPRV SR	ENFR	3 045 860	1 015 290	2 724 822	89,46%	1 068 331	915 418	885 316	663 987	221 329	21,80%	586 608	195 536	19,26%
	PÚ 7 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	ENFR	937 100	312 367	937 100	100,00%	633 616	593 750	593 750	445 313	148 438	47,52%	206 612	68 871	22,05%
	CELKOM OP RH:			11 812 818	3 788 423	10 673 244	90,35%	11 925 001	5 612 799	4 784 098	3 607 141	1 176 957	30,54%	1 107 219	369 073	9,37%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (i): Implementácia Interreg V-A SK-CZ

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Interreg V-A SK-CZ	1. Využívanie inovačného potenciálu	RO: MIRRI SR	EFRR	13 268 529	775 447	18 750 990	141,32%	50 872 276	11 542 989	8 245 148	7 749 620	495 528	58,41%	2 506 348	157 724,76	18,89%
	2. Kvalitné životné prostredie	RO: MIRRI SR	EFRR	62 340 452	4 366 169	51 197 789	82,13%	157 852 979	57 902 226	49 216 841	46 136 632	3 080 209	74,01%	19 740 027	1 082 502	31,66%
	3. Rozvoj miestnych iniciatív	RO: MIRRI SR	EFRR	9 122 115	606 052	10 908 310	119,58%	18 118 498	10 563 357	9 190 327	8 682 436	507 891	95,18%	2 549 898	104 262	27,95%
	4. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	5 408 367	480 396	6 052 361	111,91%	6 092 494	5 790 433	5 445 785	4 921 868	523 917	91,00%	2 230 708	322 175,72	41,25%
	CELKOM Interreg V-A SK-CZ:			90 139 463	6 228 064	86 909 450	96,42%	232 936 247	85 799 005	72 098 102	67 490 556	4 607 545	74,87%	27 026 981	1 666 665	29,98%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021, kontrahovanie export 11.01.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (j): Implementácia Interreg V-A SK-AT

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Interreg V-A SK-AT	1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu	RO: MIRRI SR	EFRR	19 683 142	305 711	19 683 142	100,00%	39 202 212	16 365 591	14 783 061	14 193 367	589 694	72,11%	4 921 266	284 067	25,00%
	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	RO: MIRRI SR	EFRR	27 820 000	1 859 804	27 820 000	100,00%	42 599 432	27 487 739	27 438 568	25 632 469	1 806 100	92,14%	6 788 835	245 437	24,40%
	3. Podpora udržateľných dopravných riešení	RO: MIRRI SR	EFRR	9 655 000	374 422	9 655 000	100,00%	17 579 990	5 242 960	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce	RO: MIRRI SR	EFRR	14 180 979	518 870	14 180 976	100,00%	25 810 008	10 913 614	10 600 919	10 016 045	584 874	70,63%	3 987 624	233 118	28,12%
	5. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	4 553 560	592 365	4 553 560	100,00%	5 196 755	5 184 629	4 685 858	4 298 293	387 565	94,39%	2 118 688	216 431	46,53%
	CELKOM Interreg V-A SK-AT:		EFRR	75 892 681	3 651 172	75 892 678	100,00%	130 388 397	65 194 534	57 508 406	54 140 174	3 368 233	71,34%	17 816 414	979 052	23,48%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2021 o 7:00hod) , Certifikačný orgán (MF SR), RO Interreg V-A SK-AT

Príloha č. 1 (k): PS INTERACT III

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie
PS INTERACT III	PO 1 - Rozvoj a poskytnutie služieb	RO: BSK	EFRR	37 265 300						43 100 133	36 635 113		98,31%	20 468 919		54,93%
	PO 2 Technická pomoc	RO: BSK	EFRR	2 127 294						3 244 096	2 757 481		129,62%	1 211 792		56,96%
	CELKOM PS Interact III:	RO: BSK		39 392 594						46 344 229	39 392 594		100,00%	21 680 711		55,04%

Zdroj: RO PS INTERACT III, Certifikačný orgán (MF SR)
