



Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 (ročná)

k 31.12.2021

OBSAH

Obsah	2
1. Zhrnutie	3
2. Stav posudzovania výziev/vyzvaní v kompetencii MIRRI SR.....	6
3. Stav vyhlasovania výziev/vyzvaní	10
4. Stav schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)	11
5. Stav kontrahovania finančných prostriedkov EŠIF	13
6. Stav čerpania finančných prostriedkov EŠIF	15
7. Stav ukončovania projektov EŠIF	17
8. Implementácia EŠIF podľa krajov	19
9. Implementácia EŠIF podľa typov projektov	20
10. Opatrenia na boj s pandémiou COVID-19 a zmiernenie jej dôsledkov	22
Realokácie finančných prostriedkov EŠIF	22
REACT-EU	26
11. Zjednodušovanie procesov implementácie a dohľad nad implementáciou EŠIF.....	29
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF	29
Systém riadenia EŠIF.....	30
Systém finančného riadenia EŠIF a stratégia financovania EŠIF	31
Informačné systémy	32
Dohľad nad implementáciou EŠIF.....	34
12. Ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013	35
13. Zoznam príloh.....	38

1. ZHRNUTIE

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 – 2020 obsahuje popis aktuálneho stavu implementácie EŠIF a tiež vývoja implementácie EŠIF počas uplynulého roka.

V rámci SR spolu implementujeme 11 programov EŠIF (dezignovaných bolo 12 vrátane už neexistujúceho operačného programu Výskum a inovácie).

Celková alokácia pre programové obdobie 2014 – 2020 predstavuje k 31.12.2021 sumu **16,68 mld. EUR (EÚ zdroj)**. V roku 2021 sa alokácia navýšila o **1,34 mld. EUR** (z pôvodných 15,34 mld. EUR na 16,68 mld. EUR), z toho navýšenie alokácie o 1. tranžu REACT-EU v júni o **597,02 mil. EUR** a dodatočné zdroje PRV v júli o **740,48 mil. EUR**. **Od 30.09.2021** evidujeme zníženie alokácie v rámci OP RH (zníženie o dekomitment za rok 2020 v sume **2,14 mil. EUR**).

Rok 2021 priniesol nasledovný pokrok v implementácii EŠIF.

K 31.12.2021 bolo CKO **predložených na posúdenie 749 výziev/vyzvaní**, ktoré boli zároveň v tomto počte aj posúdené. **Celkom za rok 2021** bolo predložených a zároveň aj posúdených **120 výziev/vyzvaní**.

K 31.12.2021 je v **796 výzvach/vyzvaniach** alokovaných **131,86 %** finančných prostriedkov na programové obdobie 2014 – 2020 za EÚ zdroj v sume **21,94 mld. EUR**. Za uplynulý rok bolo vyhlásených **117 výziev/vyzvaní** v sume **2,53 mld. EUR** (EÚ zdroj). Počet predložených ŽoNFP stúpol o 4 308 a počet schválených ŽoNFP o 2 353.

K 31.12.2021 je stav **kontrahovania** na úrovni **14,41 mld. EUR** za EÚ zdroj, čo predstavuje **86,38 %** alokácie na programové obdobie 2014 – 2020. **V priebehu roka 2021** bol dosiahnutý **nárast** v kontrahovaní o **2,02 mld. EUR** (EÚ zdroj).

K 31.12.2021 je stav **čerpania** na úrovni **8,28 mld. EUR** za EÚ zdroj, čo predstavuje **49,64 %** alokácie na programové obdobie 2014 – 2020. **V priebehu roka 2021** bol dosiahnutý **nárast v čerpaní** o **1,85 mld. EUR** (EÚ zdroj).

Z celkového počtu **15 777 zazmluvnených projektov EŠIF** bolo k 31.12.2021 **ukončených** celkom **6 536 projektov**, čo predstavuje **41,43 %**.

Čo sa týka **implementácie EŠIF podľa jednotlivých krajov**, k 31.12.2021 evidujeme **najvyšší objem zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji**.

Z pohľadu **implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov**, najvyšší objem zazmluvnených finančných prostriedkov predstavujú **dopytovo-orientované projekty (43,76 %)**, ďalej **národné projekty (32,67 %)**, **veľké projekty (12,47 %)**, zvyšok tvoria projekty návratnej pomoci tzv. **finančné nástroje (6,65 %)** a projekty **technickej pomoci (4,39%)**.


V nadväznosti na krízu v dôsledku pandémie COVID-19 na Slovensku vláda SR uznesením č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020 schválila realokáciu nezazmluvnených finančných prostriedkov EŠIF na **opatrenia v boji proti pandémie COVID-19** a na zmierňovanie jej následkov v celkovej výške **1,11 mld. EUR**. **K 31.12.2021** bolo

na COVID opatrenia vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,24 mld. EUR (111,88 %), zazmluvnených 1,15 mld. EUR (104,35 %) a vyčerpaných 794,01 mil. EUR (71,85 %).¹

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je iniciatíva **REACT-EU**. Ide o tretí balíček podpory Európskej komisie na eliminovanie dopadov pandémie. **Celková dodatočná alokácia REACT-EU** predstavuje **745,18 mil. EUR**, z toho bola Európskou komisiou pridelená **1. tranža vo výške 615,98 mil. EUR (vrátane OP FEAD)**. Táto 1. tranža navýšila v rámci EŠIF alokácie OP ĽZ, IROP a OP EVS. Európska komisia v priebehu mája a júna 2021 schválila revízie uvedených troch OP. **2. tranža vo výške 129,20 mil. EUR (vrátane OP FEAD)** bude prerozdelená medzi rovnaké OP, ktorých 2. kolo revízií je v príprave. V nadväznosti na dodatočné prostriedky **REACT-EU** bolo už k 31.12.2021 **vyhlásených 28 výziev a vyzvaní s alokáciou vo výške 573,71 mil. EUR (96,10%), zazmluvnených bolo 354 projektov vo výške 395,12 mil. EUR (66,18 %) a vyčerpaných bolo 136,55 mil. EUR (22,87 %).**

V nasledujúcich grafoch je vyjadrený vývoj implementácie EŠIF spoločne za všetky programy, spolu s finančným vývojom v oblasti kontrahovania a čerpania počas jednotlivých rokov implementácie ako aj mesačného vývoja čerpania v roku 2021. Úroveň kontrahovania a čerpania podľa jednotlivých fondov dokumentuje graf č. 4.


Graf č. 1: Vývoj implementácie EŠIF k 31.12.2021

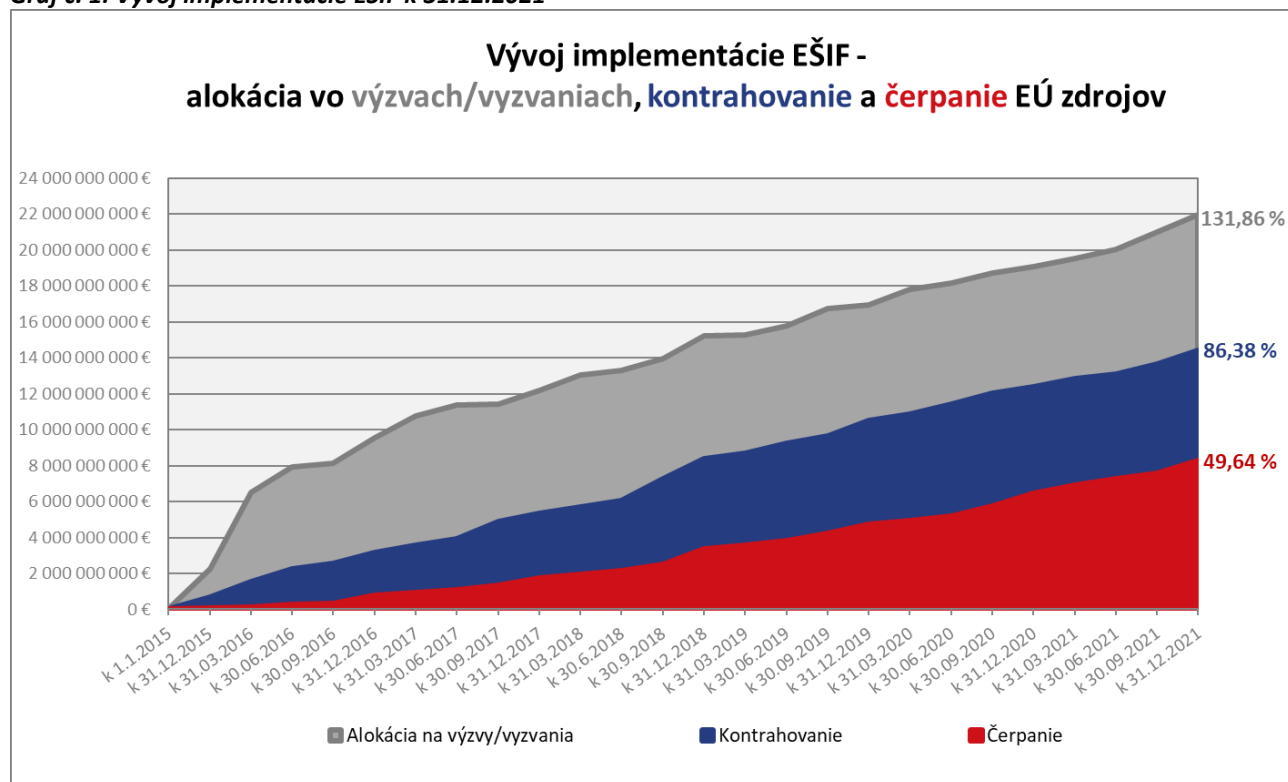

Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

¹ Prekročenie 100 % vo výzvach a v zazmluvnení je spôsobené dodatočným navýšením alokácií na COVID opatrenia.

Graf č. 2: Rast podielu kontrahovania a čerpania na alokácii EŠIF

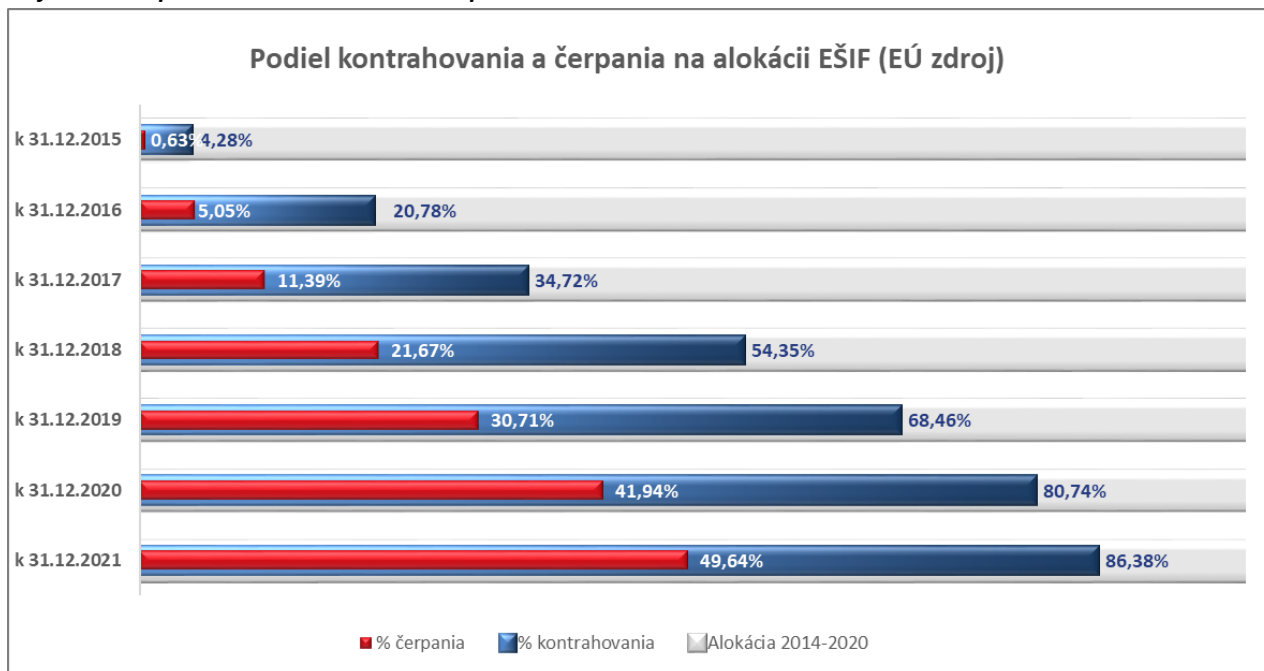


Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Tabuľka č. 1: Ročný nárast v implementácii EŠIF (od 01.01.2021 do 31.12.2021)

Celkom EŠIF (zdroje EÚ)	Stav k 31.12.2020		Stav k 31.12.2021		Ročný nárast od 01.01.2021		
	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	v EUR	v %	v p.b.
Výzvy/vyzvania	19 071 851 735	124,62%	21 939 837 745	131,86%	2 867 986 010	15,04%	7,23%
Kontrahovanie	12 387 903 342	80,74%	14 407 345 906	86,38%	2 019 442 564	16,30%	5,64%
Čerpanie	6 434 445 265	41,94%	8 279 574 695	49,64%	1 845 129 431	28,68%	7,71%


Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Graf č. 3: Vývoj mesačného čerpania EŠIF v roku 2021

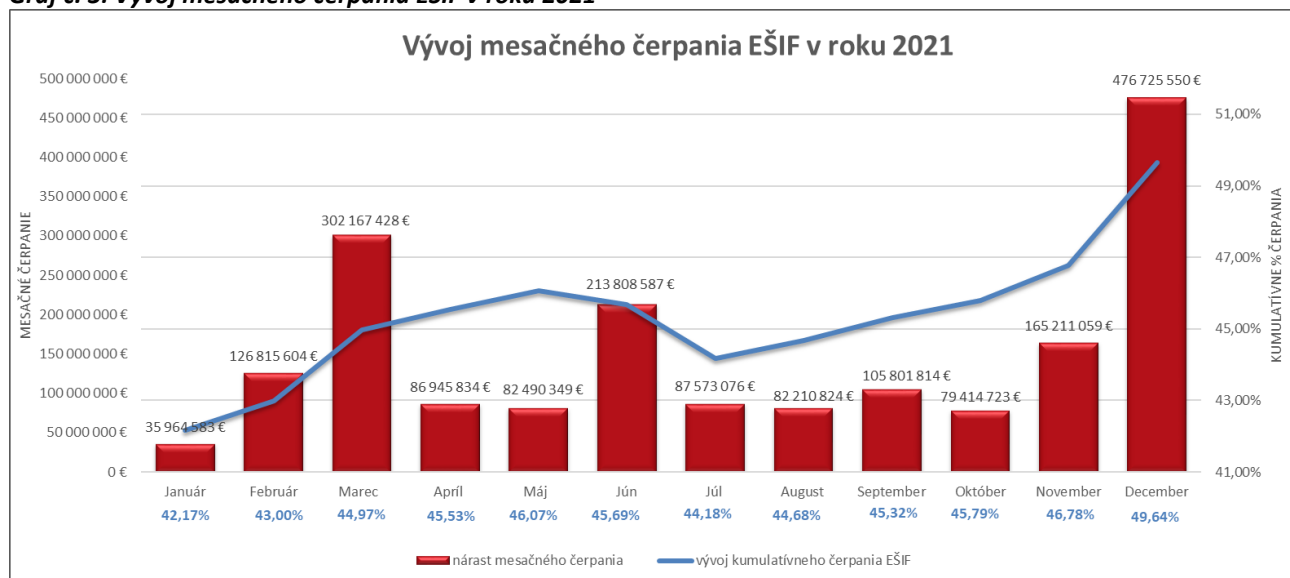

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Graf č. 4 Kontrahovanie a čerpanie podľa jednotlivých fondov EÚ k 31.12.2021

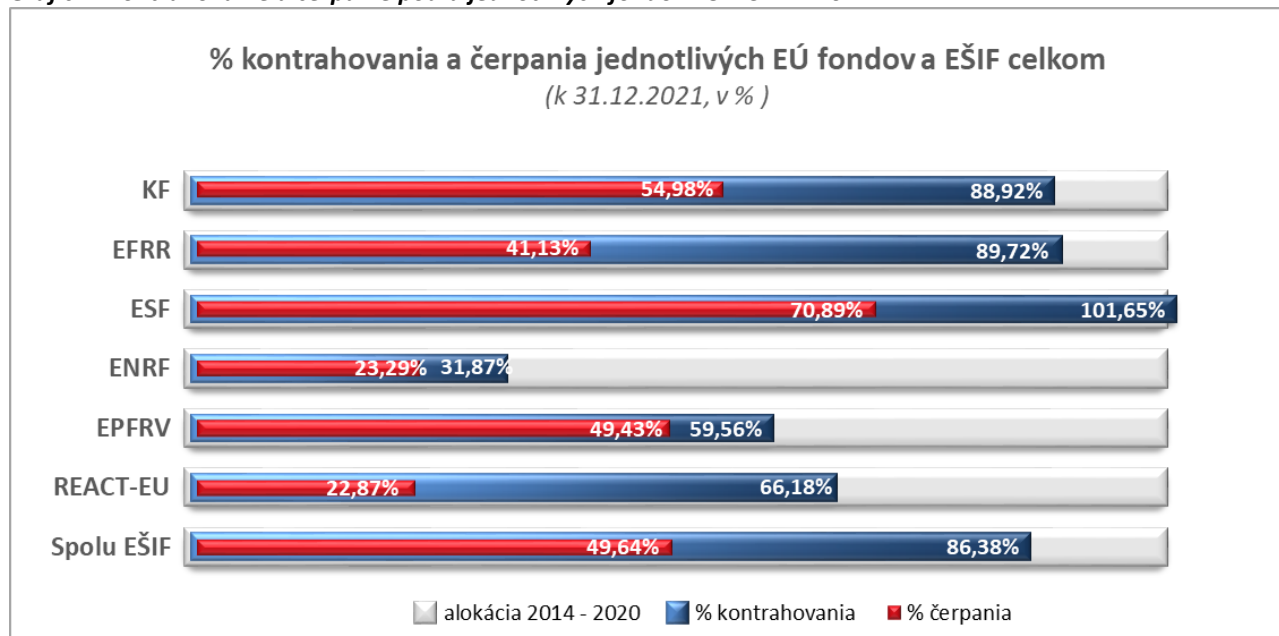

Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III
Pozn.: ESF vrátane IZM

V súvislosti s minulým **programovým obdobím 2007 – 2013**, z celkového záväzku programového obdobia 2007 – 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov vo výške **11,63 mld. EUR** Slovenská republika vyčerpala prostriedky vo výške **10,90 mld. EUR**, čo predstavuje čerpanie na úrovni **93,65 %**. Pokračuje proces uzatvárania a finančného vysporiadania. K 31.12.2021 boli v spolupráci s EK **uzatvorené programy – PS INTERACT II, OP Rybné hospodárstvo a OP Technická pomoc²**. K ostatným operačným programom prebieha intenzívna komunikácia s Európskou komisiou k finalizácii ukončovania.

2. STAV POSUDZOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ V KOMPETENCII MIRRI SR

K 31.12.2021 bolo na MIRRI SR doručených **749 výziev/vyzvaní** v celkovej indikatívnej alokácii **13,23 mld. EUR**, pričom z toho bolo:

- **328** dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. **7,37 mld. EUR**;
- **17** výziev na predkladanie projektových zámerov;
- **65** vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške **275 mil. EUR**;
- **339** vyzvaní na národné projekty v celkovej výške **5,58 mld. EUR**.

Z celkového počtu 749 výziev/vyzvaní **bolo za rok 2021 doručených 120 výziev/vyzvaní** v celkovej indikatívnej alokácii **2,55 mld. EUR**, pričom z toho bolo:

- **51** dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. **933 mil. EUR**;

² 11.01.2022 bol uzatvorený program cezhraničnej spolupráce SR-ČR.

- **12** vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške **27 mil. EUR**;
- **57** vyzvaní na národné projekty v celkovej výške **1,59 mld. EUR**.

Tieto výzvy/vyzvania boli z operačných programov OP ĽZ, IROP, OP II, OP KŽP, OP EVS, OP RH, PRV a INTERREG V-A SK-CZ. Z toho na boj s **pandémiou COVID-19** a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov bolo v roku 2021 predložených **7 výziev/vyzvaní** v celkovej alokácii **118 mil. EUR**, v rámci iniciatívy **REACT-EU** bolo predložených **29 výziev/vyzvaní** v celkovej alokácii **538,5 mil. EUR** a z toho boli ešte v rámci iniciatívy **catching-up regions** predložené **2 výzvy** v celkovej alokácii **6,5 mil. EUR**

V rámci **OP ĽZ** bolo posúdených 29 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 467 mil. EUR, z toho 2 boli COVID-19 vyzvania v alokácii 36,15 mil. EUR, 19 výziev/vyzvaní bolo z iniciatívy REACT-EU v alokácii 349 mil. EUR a 1 výzva z iniciatívy catching-up regions v alokácii 3 mil. EUR. Výzvy/vyzvania sa zameriavali hlavne na zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl a na stredných školách v oblasti zlepšenia dostupnosti vzdelávania, na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách, zvýšenie zamestnanosti v prostredí MRK či zvýšenie inkluzívnosti. Taktiež predmetom výziev/vyzvaní bolo podporenie vnútorných systémov zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania a podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím, rovnako ako podpora opatrovateľskej služby, zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami dostupného bývania, poskytnutie finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, priblíženie neaktívnych osôb k trhu práce či odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie ai.

V rámci **IROP** bolo posúdených 24 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 306,51 mil. EUR, z toho 3 výzvy/vyzvania v alokácii 51,28 mil. EUR, ktoré sa zameriavali na zníženie dopadov pandémie COVID-19 prostredníctvom podpory prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania a podporu technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú starostlivosť či zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov. 9 výziev/vyzvaní z iniciatívy REACT-EU v alokácii 113,77 mil. EUR sa zameriavali na zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji na podporu existujúcich SO pre IROP a podporu vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR, podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19, zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy a taktiež na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútro-blokov sídlisk. 1 výzva z iniciatívy catching-up regions v alokácii 3,5 mil. EUR sa zameriavala na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v BBSK. Výzvy/vyzvania v rámci IROP sa ešte okrem vyššie uvedených zameriavali aj na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách, zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, zvýšenie počtu žiakov na stredných odborných školách na praktickom vyučovaní ai.

V rámci **OP II** bolo posúdených 49 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 1,41 mld. EUR, z toho 2 výzvy v alokácii 30,7 mil. EUR určených na boj s pandémiou COVID-19 sa zameriavali na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji a podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK. Klasické OP II výzvy/vyzvania sa zameriavali na výstavbu a modernizáciu rôznych úsekov ciest či výstavbu terminálov alebo záchytných parkovísk a taktiež boli podporené projekty výskumu a inovácií, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu, implementácia cezhraničných služieb tzv. Jednotná digitálna brána, rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej

bezpečnosti či manažment inštitúcie verejnej správy, malé zlepšenia eGov služieb, podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery innovation ai.

V rámci **OP KŽP** bola pomoc vo výške 130 mil. EUR smerovaná prostredníctvom 8 výziev na budovanie systémov vyhodnocovania rizík včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, na podporu budovania environmentálnych centier, zníženie energetickej náročnosti verejných budov, budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, monitorovanie a hodnotenie vôd či modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov ai.

V rámci **OP EVS** boli posúdené 4 výzvy/vyzvania v alokácii 103,92 mil. EUR, z toho 1 vyzvanie z iniciatívy REACT-EU v celkovej alokácii 85,28 mil. EUR, ktoré sa zameriavalo na podporu inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroja na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19. Klasické OP EVS výzvy/vyzvania sa zameriavali na optimalizáciu procesov a posilnenie transparentnosti Najvyššieho súdu SR a prípravu kvalitných súdnych kapacít prostredníctvom podpory špecializácie súdnych úradníkov v súlade s reformou súdneho systému.

V rámci **OP RH** boli posúdené 3 výzvy/vyzvania v alokácii 2,27 mil. EUR, ktoré sa zameriavali na zlepšenie/zvyšovanie administratívnych kapacít, zber údajov v rámci pilotného projektu Environmentálny monitoring a tvorba databázy o stave rybníkárstva na Slovensku a zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie.

V rámci **PRV** bola posúdená 1 výzva v alokácii 132 mil. EUR, ktorej predmetom boli investície na spracovanie /uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

V rámci **INTERREG V-A SK-CZ** boli posúdené 2 výzvy/vyzvania v alokácii 2,17 mil. EUR a zameriavali sa na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu a zabezpečenie plynulej implementácie programu.

Tabuľka č. 2: Celkový stav posudzovania výziev/vyzvaní k 31.12.2021

Program	Predložené výzvy		Posúdené výzvy	
	Počet	alokácia (EÚ zdroj)	Počet	alokácia (EÚ zdroj)
OP ĽZ	166	3 006 844 023	166	3 006 844 023
OP II	262	5 046 944 006	262	5 046 944 006
OP KŽP	68	1 823 248 406	68	1 823 248 406
IROP	92	1 942 106 732	92	1 942 106 732
OP EVS	61	354 765 171	61	354 765 171
OP TP	8	30 253 790	8	30 253 790
OP RH	33	15 613 548	33	15 613 548
Interreg V-A SK-CZ	13	64 570 115	13	64 570 115
Interreg V-A SK-AT	5	75 892 678	5	75 892 678
PRV	41	874 387 262	41	874 387 262
SPOLU EŠIF	749	13 234 625 735	749	13 234 625 735

Zdroj údajov: CKO/ORP

Pozn.: EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. Vzhľadom na to, pod údajmi OP II sú údaje vykazované sumarizačne vrátane OP VaI.

Tabuľka č. 3: Stav posúdených výziev/vyzvaní za rok 2021

Program	Predložené výzvy		Posúdené výzvy	
	Počet	alokácia (EÚ zdroj)	Počet	alokácia (EÚ zdroj)
OP ĽZ	29	467 940 041	29	467 940 041
OP II	49	1 411 061 587	49	1 411 061 587
OP KŽP	8	130 000 000	8	130 000 000
IROP	24	306 517 291	24	306 517 291
OP EVS	4	103 927 036	4	103 927 036
OP TP	0	0	0	0
OP RH	3	2 278 270	3	2 278 270
Interreg V-A SK-CZ	2	2 177 607	2	2 177 607
Interreg V-A SK-AT	0	0	0	0
PRV	1	132 133 194	1	132 133 194
SPOLU EŠIF	120	2 556 035 029	120	2 556 035 029

Zdroj údajov: CKO/ORP

3. STAV VYHLASOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ

V rámci EŠIF bolo k 31.12.2021 vyhlásených **796 výziev/vyzvaní** na predkladanie žiadostí o NFP vo výške **21,94 mld. EUR** (EÚ zdroj). Predstavuje to **131,86 %** z celkovej alokácie finančných prostriedkov EŠIF (EÚ zdroj).


Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 31.12.2021 dosahuje OP II, IROP a OP ĽZ.

V období od 01.01.2021 do 31.12.2021 bolo vyhlásených **117 výziev/vyzvaní** v sume **2,53 mld. EUR** (EÚ zdroj). Okrem uvedeného nastala v priebehu roka 2021 úprava alokácií už vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach a taktiež zrušenie niektorých výziev/vyzvaní.

V rámci PRV pokračuje vyhlasovanie výziev Miestnymi akčnými skupinami, vyhlásených bolo 1020 výziev s alokáciou 92,27 mil. EUR.

V rámci programu INTERACT III sa výzvy/vyzvania nevyhlasujú, v rámci PRV sa za alokované zdroje vo výzvach/vyzvaniach uvádza alokácia na zverejnené výzvy na projektové opatrenia a alokácia na neprojektové opatrenia.

Graf č. 5: Podiel alokácie vo vyhlásených platných výzvach/vyzvaniach z celkovej alokácie jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroj) k 31.12.2021 s označením ročnej zmeny

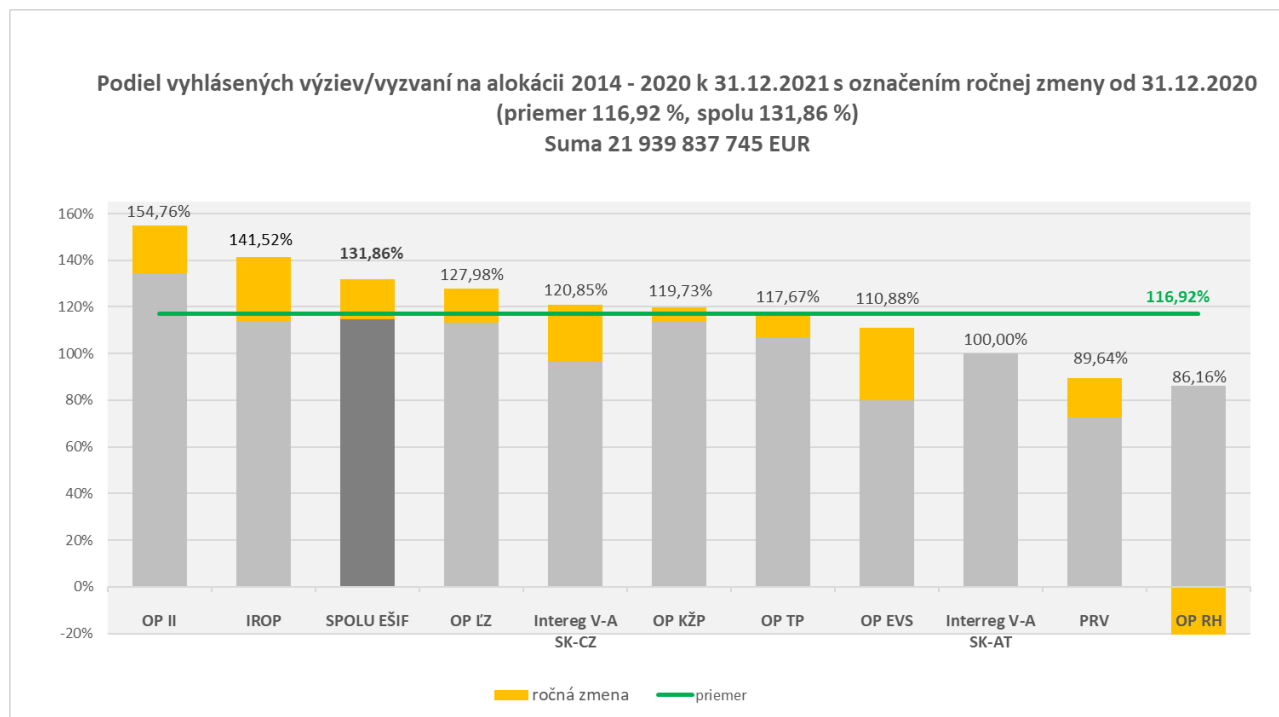

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV

Pozn.: Podiel vyhlásených výziev/vyzvaní na alokácii ako aj ročná zmena podielu vyhlásených výziev/vyzvaní na alokácii IROP, OP EVS, OP ĽZ, PRV, OP RH a EŠIF celkom sú ovplyvnené navýšením alokácie EŠIF o 1. tranžu zdrojov REACT-EU, navýšením alokácie PRV a znížením alokácie OP RH v dôsledku dekomitmentu.

Tabuľka č. 4: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní (bez PS INTERACT III) k 31.12.2021

Program	Alokácia 2014 – 2020	Vyhlásené platné výzvy/vyzvania		
	EÚ zdroj	počet	Alokácia na výzvu/vyzvanie EÚ zdroj	%
	A	B	C	D=C/A
OP ĽZ	2 929 999 089	180	3 749 935 948	127,98%
OP II	6 009 937 611	277	9 301 040 843	154,76%
OP KŽP	2 832 531 290	90	3 391 495 160	119,73%
IROP	1 894 842 772	87	2 681 645 495	141,52%
OP EVS	336 765 425	61	373 389 125	110,88%
OP TP	159 071 912	18	187 178 022	117,67%
OP RH	9 676 595	9	8 337 515	86,16%
Interreg V-A SK-CZ	90 139 463	17	108 934 009	120,85%
Interreg V-A SK-AT	75 892 681	5	75 892 678	100,00%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	14 338 856 838	744	19 877 848 794	139,01%
PRV	2 300 176 822	52	2 061 988 951	89,64%
SPOLU EŠIF (s PRV)	16 639 033 660	796	21 939 837 745	131,86%
z toho REACT-EU	597 022 495	28	573 713 245	96,10%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, fin. údaje v EUR

Pozn.: Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (884 281 930 EUR), Údaj za výzvy OP VaI je zahrnutý v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. Za OP II sa nevykazujú údaje za výzvy, ktoré boli vylúčené z financovania EŠIF.

4. STAV SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (ŽoNFP)

K 31.12.2021 bolo prijatých spolu **34 814** ŽoNFP, z toho **17 698** ŽoNFP bolo aj schválených, čo predstavuje **50,84 %** z celkového počtu prijatých ŽoNFP. Z požadovanej výšky NFP 27,39 mld. EUR bolo schválených 19,42 mld. EUR, čo predstavuje **70,90 %** z požadovanej sumy NFP. V priebehu roka 2021 bolo prijatých 4 308 ŽoNFP s požadovanou výškou NFP v objeme 3,28 mil. EUR. Najvyšší ročný pokrok v počte prijatých ŽoNFP evidujeme za PRV, IROP a OP ĽZ.

V období od **01.01.2021** do **31.12.2021** bolo schválených **2 353** žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške **2,92 mld. EUR**. Najvyšší ročný pokrok v počte schválených ŽoNFP evidujeme za OP ĽZ, OP II a IROP.

Tabuľka č. 5: Prehľad prijatých a schválených ŽoNFP (bez PS INTERACT III) k 31.12.2021

Program	Alokácia 2014 – 2020		Prijaté ŽoNFP	Požadovaná výška NFP	Schválené ŽoNFP	Schválená výška NFP
	EÚ zdroj	ŠR zdroj	počet	suma NFP	počet	suma NFP
	A	B	C	D	E	F
OP IZ	2 929 999 089	494 924 635	5 993	4 614 791 716	4184	3 964 121 244
OP II	6 009 937 611	1 026 022 428	4 335	9 211 254 888	2955	7 240 298 727
OP KŽP	2 832 531 290	329 249 335	5 181	5 621 244 469	2620	3 164 743 027
IROP	1 894 842 772	310 981 158	4 697	3 508 624 787	2545	2 288 701 540
OP EVS	336 765 425	47 955 668	314	468 761 346	169	424 271 594
OP TP	159 071 912	28 034 015	263	251 740 460	219	226 749 963
OP RH	9 676 595	3 104 663	86	13 084 615	40	6 605 998
Interreg V-A SK-CZ	90 139 463	6 228 064	551	261 603 931	159	102 582 167
Interreg V-A SK-AT	75 892 681	3 651 172	84	130 391 393	53	83 149 392
SPOLU EŠIF (bez PRV)	14 338 856 838	2 250 151 138	21 504	24 081 497 605	12 944	17 501 223 651
PRV	2 300 176 822	774 740 916	13 310	3 310 213 765	4754	1 918 817 704
SPOLU EŠIF (s PRV)	16 639 033 660	3 024 892 054	34 814	27 391 711 370	17 698	19 420 041 355
z toho REACT-EU	597 022 495	3 760 930	1 250	689 557 585	579	437 023 796

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT, fin. údaje v EUR

Pozn.: V rámci PRV je počet prijatých a schválených ŽoNFP údaj len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy žiadosti o podporu neprojektových opatrení. K 31.12.2021 bolo v rámci neprojektových opatrení predložených 60 358 žiadostí a schválených 56 212 žiadostí. Prehľad neobsahuje údaje o ŽoNFP zo stiahnutých výziev, ktoré sa ďalej nevyhodnocujú a z výziev, ktoré boli vylúčené z financovania EŠIF.


5. STAV KONTRAHOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF

K 31.12.2021 bolo kontrahovanie³ finančných prostriedkov EŠIF vo výške **14,41 mld. EUR**, čo predstavuje **86,38 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (EÚ zdroj).

Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje PS INTERACT III, OP ĽZ a Interreg V-A SK-AT.

V období od 01.01.2021 do 31.12.2021 predstavuje nárast kontrahovania **1 989 projektov vo výške 2,02 mld. EUR** (EÚ zdroj).

Graf č. 6: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF 2014 – 2020 (EÚ zdroj) k 31.12.2021 s označením ročnej zmeny

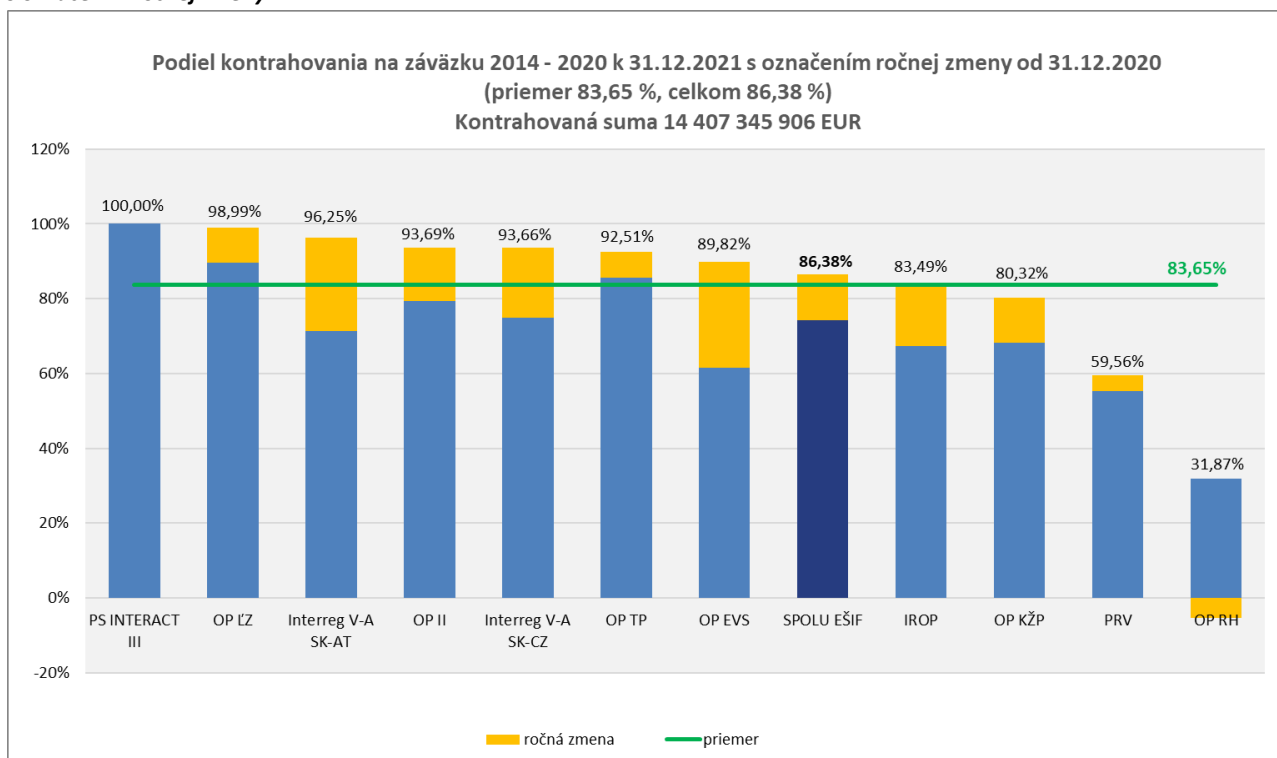

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT

Pozn.: Podiel kontrahovania ako aj ročná zmena kontrahovania na alokácii IROP, OP EVS, OP ĽZ, PRV, OP RH a EŠIF celkom sú ovplyvnené navýšením alokácie EŠIF o 1. tranžu zdrojov REACT-EU, navýšením alokácie PRV a znížením alokácie OP RH v dôsledku dekomitmentu.

³ Kontrahovanie = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020.

Tabuľka č. 6: Kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF k 31.12.2021

Program	Alokácia 2014 – 2020	Kontrahovanie EŠIF		
	EÚ zdroj	Počet zazmluvnených projektov	EÚ zdroj	%
	A	B	C	D=C/A
OP ĽZ	2 929 999 089	3572	2 900 279 977	98,99%
OP II	6 009 937 611	2449	5 630 427 495	93,69%
OP KŽP	2 832 531 290	2317	2 275 080 557	80,32%
IROP	1 894 842 772	2354	1 581 932 600	83,49%
OP EVS	336 765 425	160	302 477 155	89,82%
OP TP	159 071 912	211	147 154 852	92,51%
OP RH	9 676 595	26	3 083 603	31,87%
Interreg V-A SK-CZ	90 139 463	149	84 426 197	93,66%
Interreg V-A SK-AT	75 892 681	49	73 044 383	96,25%
PS INTERACT III	39 392 594	-	39 392 594	100,00%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	14 378 249 432	11 287	13 037 299 415	90,67%
PRV	2 300 176 822	4490	1 370 046 492	59,56%
SPOLU EŠIF (s PRV)	16 678 426 254	15 777	14 407 345 907	86,38%
z toho REACT-EU	597 022 495	354	395 115 626	66,18%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre Interreg V-A SK-AT, fin. údaje v EUR

Pozn.: V rámci PRV je údaj o počte nakontrahovaných zmlúv len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy schválených neprojektových opatrení. K 31.12.2021 bolo v rámci neprojektových opatrení schválených 56 212 žiadostí. Za OP II sa nevykazuje kontrahovanie za výzvu OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC).

Údaje o kontrahovaní za OP Val sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II.


6. STAV ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF

Čerpanie ⁴ finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 31.12.2021 vo výške **8,28 mld. EUR**, čo predstavuje **49,64 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ).

Najvyššiu mieru čerpania vykazuje OP TP, PS INTERACT III a OP ĽZ.

V období od 01.01.2021 do 31.12.2021 bolo vyčerpaných **1,85 mld. EUR** (EÚ zdroj).

Graf č. 7: Podiel čerpania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroj) k 31.12.2021 s označením ročnej zmeny

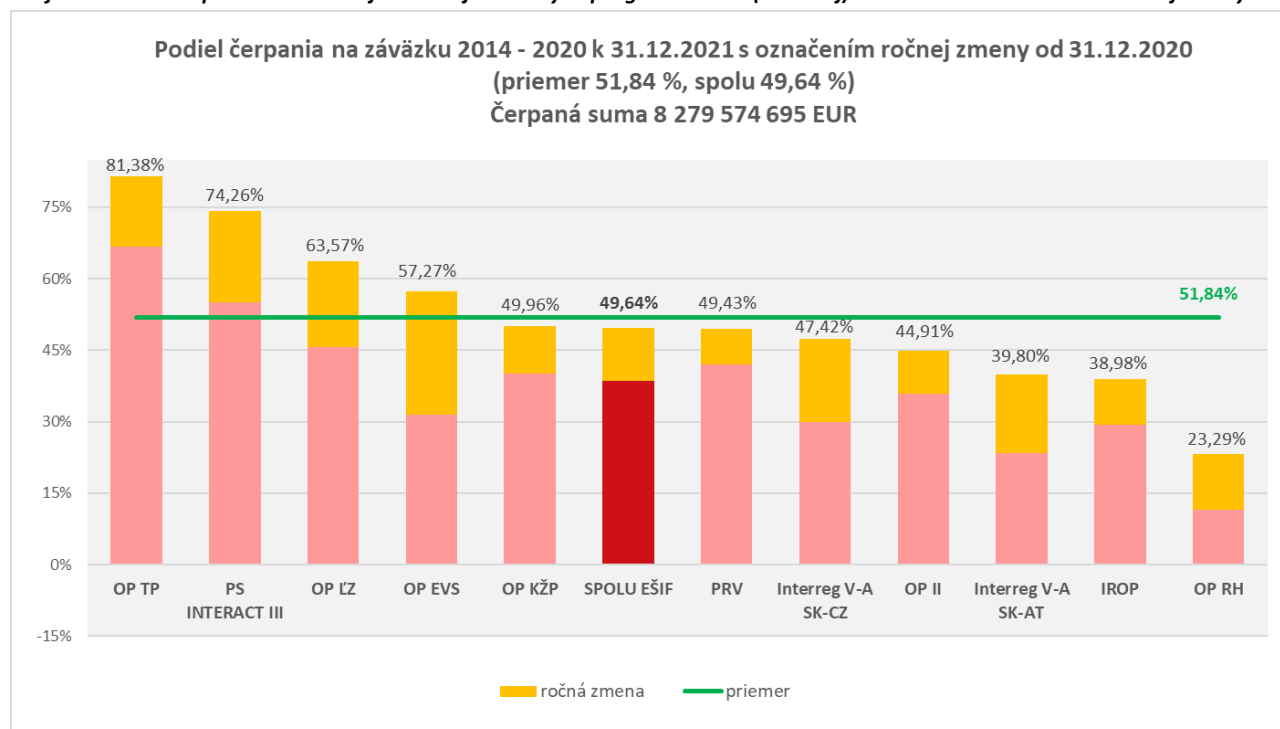

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV;

Pozn.: Podiel čerpania ako aj ročná zmena čerpania na alokácii IROP, OP EVS, OP ĽZ, PRV, OP RH a EŠIF celkom sú ovplyvnené navýšením alokácie EŠIF o 1. tranžu zdrojov REACT-EU, navýšením alokácie PRV a znížením alokácie OP RH v dôsledku dekomitmentu.

Tabuľka č. 7: Čerpanie finančných prostriedkov EŠIF k 31.12.2021

Program	Alokácia 2014 – 2020	Čerpanie EŠIF	
	EÚ zdroj	EÚ zdroj	%
	A	B	C=B/A
OP ĽZ	2 929 999 089	1 862 559 068	63,57%
OP II	6 009 937 611	2 699 308 674	44,91%
OP KŽP	2 832 531 290	1 415 251 588	49,96%
IROP	1 894 842 772	738 679 011	38,98%

⁴ Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o sumu vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).


OP EVS	336 765 425	192 866 082	57,27%
OP TP	159 071 912	129 449 476	81,38%
OP RH	9 676 595	2 253 443	23,29%
Interreg V-A SK-CZ	90 139 463	42 742 176	47,42%
Interreg V-A SK-AT	75 892 681	30 206 169	39,80%
PS INTERACT III	39 392 594	29 254 070	74,26%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	14 378 249 432	7 142 569 756	49,68%
PRV	2 300 176 822	1 137 004 940	49,43%
SPOLU EŠIF (s PRV)	16 678 426 254	8 279 574 695	49,64%
z toho REACT-EU	597 022 495	136 549 643	22,87%

Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV, fin. údaje v EUR; Pozn.: Údaje o čerpaní za OP Val sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II.

7. STAV UKONČOVANIA PROJEKTOV EŠIF


Z celkového počtu **15 777** **zazmluvnených projektov EŠIF** bolo k **31.12.2021** riadne ukončených a mimoriadne ukončených projektov, ktoré prispeli k cieľom OP, celkom **6 536** **projektov**, čo predstavuje **41,43 %**. Najvyšší počet ukončených projektov vykazuje PRV, OP KŽP a OP II.

Graf č. 8: Počet zazmluvnených projektov OP (bez PS INTERACT III)

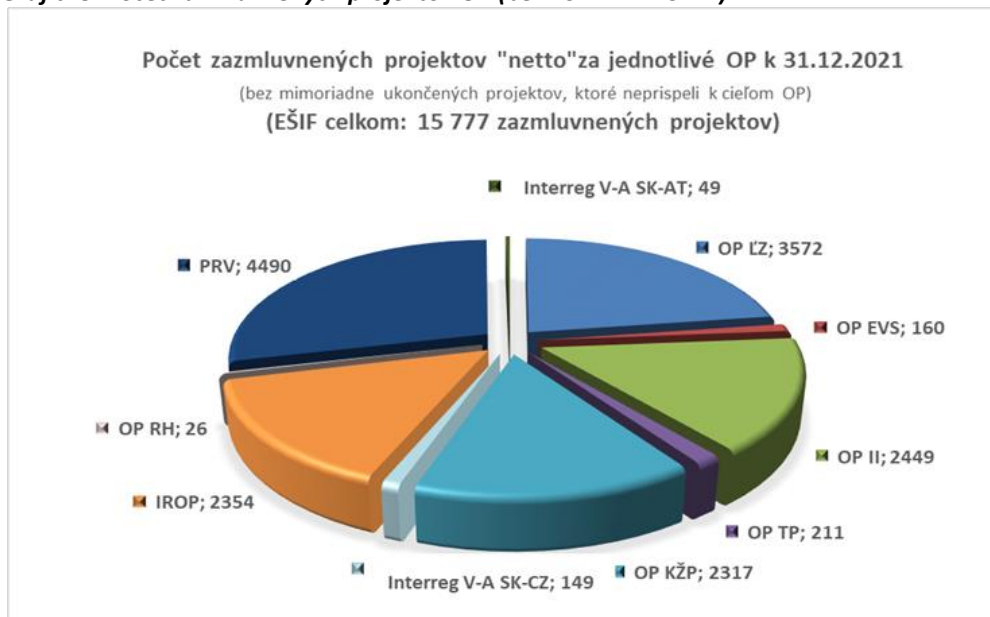


Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT

Graf č. 9: Počet ukončených projektov OP (bez PS INTERACT III)

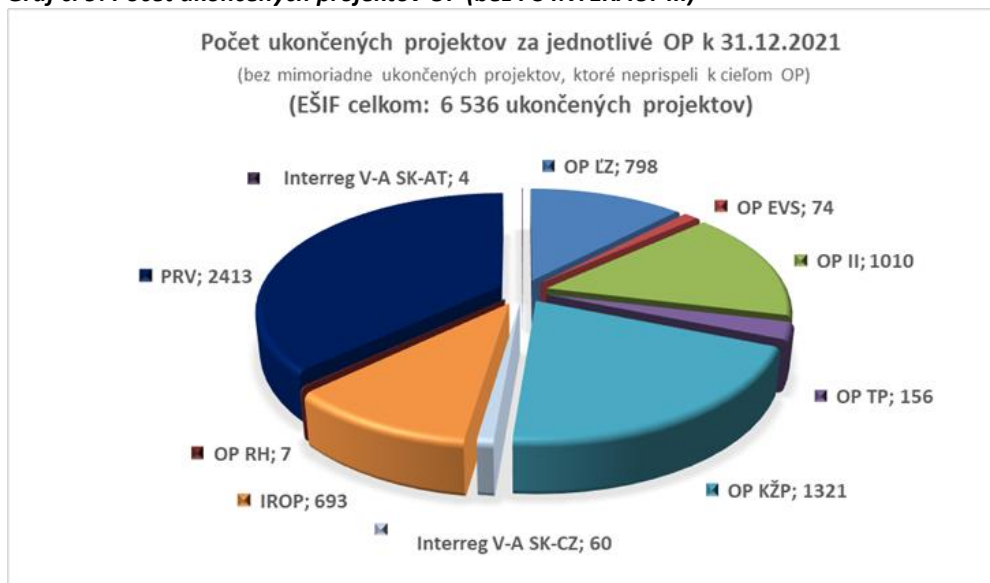

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT

Graf č. 10: Podiel ukončených projektov na kontrahovaní netto za jednotlivé OP (bez PS INTERACT III)

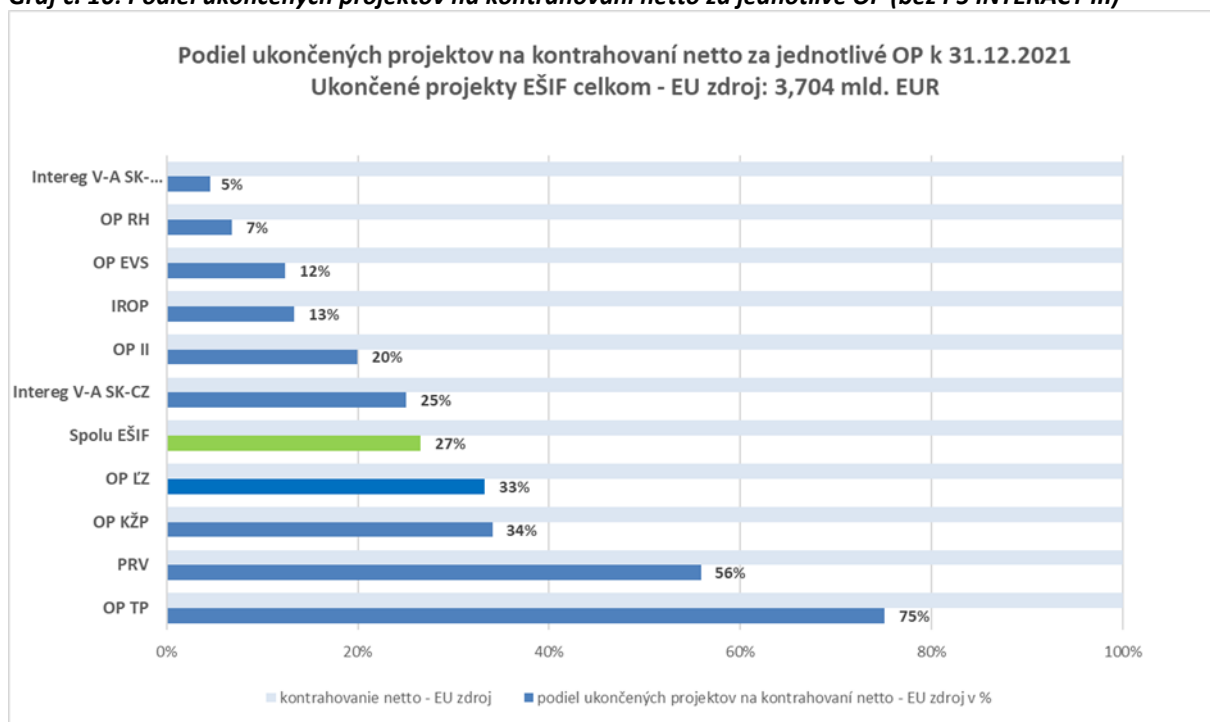

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV (údaj iba za projektové podpory), RO pre INTERREG V-A SK-AT

K 31.12.2021 predstavuje **podiel čerpanej sumy za ukončené projekty EŠIF na celkovom kontrahovaní 26,57 %**, z celkovej alokácie EŠIF tento podiel predstavuje **21,83 %**. Percentuálne najvyšší objem čerpanej sumy za ukončené projekty zo zazmluvneného objemu predstavujú ukončené projekty OP TP a PRV.

8. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA KRAJOV

Čo sa týka implementácie EŠIF podľa jednotlivých krajov, k 31.12.2021 evidujeme najvyšší objem zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.


Tabuľka č. 8: Implementácia EŠIF podľa jednotlivých krajov k 31.12.2021

Samosprávny kraj	Kontrahovanie ⁵ EÚ zdroj	Čerpanie ⁶ EÚ zdroj
Žilinský	2 188 931 666	1 327 484 315
Prešovský	1 878 714 377	817 899 261
Košický	1 786 406 177	846 948 747
Trenčiansky	1 435 814 660	681 841 730
Banskobystrický	1 409 599 806	723 070 828
Nitriansky	1 134 008 541	554 110 968
Trnavský	947 184 404	406 186 716
Bratislavský	653 346 597	261 554 609

Zdroj: ITMS2014+, fin. údaje v EUR

Pozn.: Suma za EÚ zdroj bola získaná prepočtom podľa miery spolufinancovania jednotlivých projektov z celkových oprávnených výdavkov

Graf č. 11: Implementácia EŠIF podľa krajov – EÚ zdroj

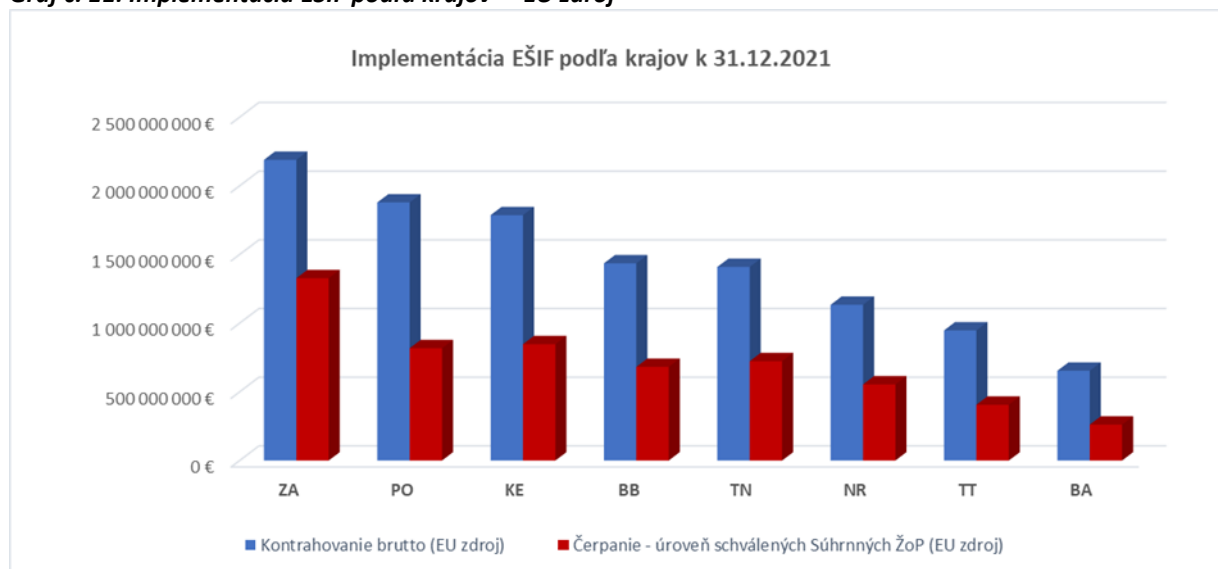

Zdroj ITMS 2014+, fin. údaje v EUR

⁵ Kontrahovanie – ide o zazmluvnenú sumu všetkých projektov, okrem projektov, ktoré boli mimoriadne ukončené a neprispeli k cieľom OP, projektov PRV, ktoré nie sú zaregistrované v ITMS 2014+, projektov TP, OP TP a FN.

⁶ Čerpanie – ide o oprávnenú sumu na úrovni schválených Súhrnných ŽoP týchto projektov.


V prípade, že sa projekt realizuje vo viacerých krajoch, do prehľadov vstupujú sumy za takýto projekt len vtedy, ak RO rozdelil jeho zazmluvnenú sumu podľa miesta realizácie v ITMS2014+, v časti rozdelenie podľa jednotlivých kategórií intervencie.

9. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA TYPOV PROJEKTOV

Z pohľadu implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem zazmluvnených finančných prostriedkov predstavujú **dopytovo-orientované projekty** (43,76 %), ktoré majú najvyššie zastúpenie v rámci PRV, v programoch cezhraničnej spolupráce, OP KŽP a IROP. **Národné projekty** majú 32,67 %-ný podiel na celkovom kontrahovaní EŠIF a prevládajú v rámci OP ĽZ a OP EVS, značne sú zastúpené aj v OP II, v malej miere sa implementujú v OP RH, OP KŽP a IROP. **Veľké projekty** tvoria 12,47 % kontrahovania a implementujú sa v rámci OP II, 1 veľký projekt sa implementuje aj v OP KŽP. **Finančné nástroje** tvoria 6,65 % z celkovej nakontrahovanej sumy, implementujú sa prostredníctvom IROP, OP II, OP KŽP a OP ĽZ.

Čo sa týka čerpania podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem čerpaných finančných prostriedkov k 31.12.2021 evidujeme za dopytovo-orientované projekty (41,22 %), ďalej za národné projekty (29,99 %), veľké projekty (15,24 %), finančné nástroje (7,71 %) a projekty technickej pomoci (5,84 %).

Graf č. 12: Implementácia EŠIF – kontrahovanie brutto⁷ podľa typov projektov

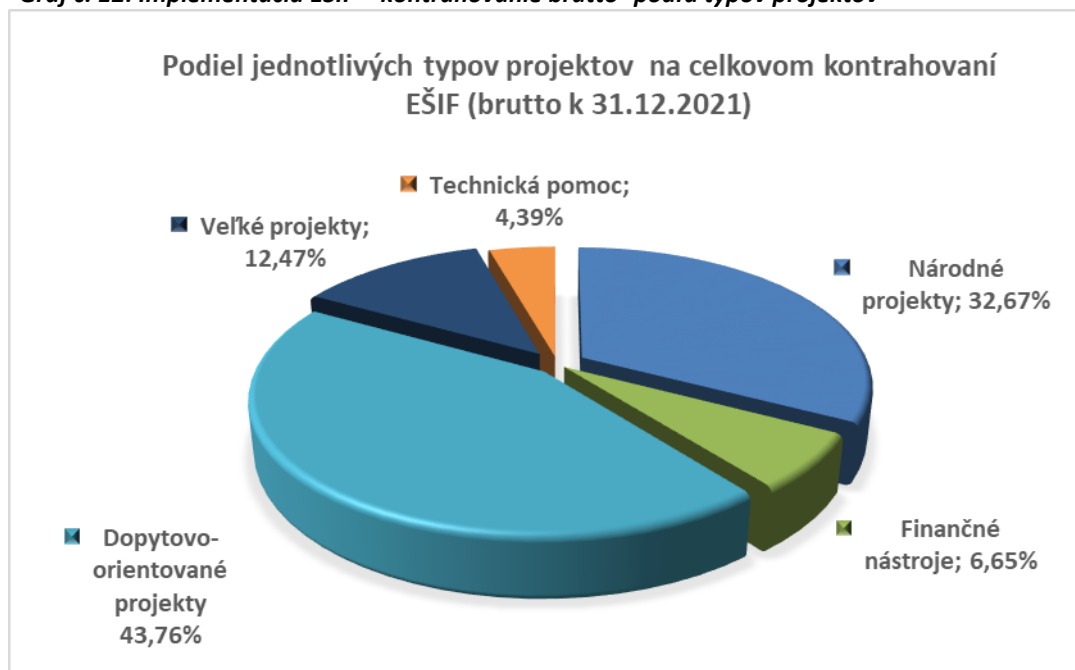

Zdroj: ITMS 2014+ a RO PRV

⁷ kontrahovanie brutto – suma príspevku zo zdrojov Európskej únie, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020.

Graf č. 13: Implementácia EŠIF – schválené SŽoP podľa typov projektov



Zdroj: ITMS 2014+ a RO PRV

Významným a dôležitým efektom je dosiahnutie synergických a komplementárnych účinkov vzájomným pôsobením vyššie uvedených implementovaných projektov. Hmatateľné synergické účinky v roku 2021 sa prejavili najmä v programoch OP II, OP KŽP, OP ĽZ a IROP. Vzájomná synergia sa dotýkala napríklad dopravných projektov (verejná osobná, cestná a železničná infraštruktúra), prejavovala sa v oblasti zelenej infraštruktúry, pri tvorbe nových pracovných miest a podpore zamestnanosti, pri podpore podnikom, na zabezpečení materiálno-technického vybavenia IT pre stredné školy, pri podpore dobiehajúcich regiónov „Catching-up regions“.

Bližšie informácie v tejto oblasti popisuje Hodnotiaca správa za rok 2021 o koordinácii a zabezpečení synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR a makroregionálnych stratégií v SR.

10. OPATRENIA NA BOJ S PANDÉMIOU COVID-19 A ZMIERNENIE JEJ DÔSLEDKOV

REALOKÁCIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF

MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID-19 vypracovalo **Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou koronavírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov**, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020. Na opatrenia, ktoré majú vo významnej miere prispieť k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a opätovne ju naštartovať, bolo alokovaných **1,105 mld. EUR** z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF.

COVID opatrenia sú zamerané na:

- podporu udržania zamestnanosti: **410,26 mil. EUR (OP IZ)**
- podporu zdravotníckeho systému: **204,30 mil. EUR (IROP, OP II)**
- podporu pre mikro, malé a stredné podniky: **330,20 mil. EUR (OP II)**
- podporu zložiek integrovaného záchranného systému: **51,00 mil. EUR (OP KŽP)**
- iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: **109,30 mil. EUR (OP IZ)**

K 31.12.2021 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,236 mld. EUR (111,88 %), zazmluvnených 1,153 mld. EUR (104,35 %) a vyčerpaných 794,01 mil. EUR (71,85 %). V priebehu roka 2021 alokácia vo výzvach stúpla o 120,29 mil. EUR (10,88 p. b.), kontrahovanie na tieto opatrenia bolo navýšené o 184,91 mil. EUR (16,73 p. b.) a čerpanie sa zvýšilo o 451,16 mil. EUR (40,83 p. b.).

Tabuľka č. 9: Prehľad implementácie opatrení na eliminovanie dopadov COVID-19 k 31.12.2021

Zameranie COVID opatrení	Operačný program	Fond	Alokácia - v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID-19	Platné výzvy/vyzvania - alokácia			Kontrahovanie			Čerpanie (schválené súhrnné ŽoP)		Vyplatené z kapitoly štátneho rozpočtu MPSVR SR
			EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	
Podpora udržania zamestnanosti	OP IZ	ESF	410 262 575	2	460 262 576	112,19%	2	407 170 636	99,25%	407 170 636	99,25%	2 256 908 889
Podpora zdravotníckeho systému	IROP	EFRR	117 300 000	6	127 866 238	109,01%	51	78 818 177	67,19%	33 888 867	28,89%	
	OPII	EFRR	87 000 000	3	106 940 000	122,92%	33	97 264 961	111,80%	4 461 306	5,13%	
	Celkom:	EFRR	204 300 000	9	234 806 238	114,93%	84	176 083 138	86,19%	38 350 174	18,77%	
Podpora pre mikro, malé a stredné podniky	OP II	EFRR	330 200 000	1	395 525 070	119,78%	4	395 525 070	119,78%	269 437 000	81,60%	
Podpora zložiek integrovaného záchranného systému	OP KŽP	EFRR	51 000 000	1	51 000 000	100,00%	5	80 535 643	157,91%	50 646 771	99,31%	
Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19	OP IZ	ESF	109 300 000	5	94 724 496	86,66%	5	93 867 912	85,88%	28 407 258	25,99%	
CELKOM (v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID-19)			1 105 062 575	18	1 236 318 380	111,88%	100	1 153 182 400	104,35%	794 011 838	71,85%	2 256 908 889
z toho EFRR			585 500 000	11	681 331 308	116,37%	93	652 143 852	111,38%	358 433 944	61,22%	0
z toho ESF			519 562 575	7	554 987 072	106,82%	7	501 038 548	96,43%	435 577 894	83,84%	2 256 908 889
Ostatné opatrenia	PRV	EPFRV		1	14 780 000		166	2 717 273		2 626 893		
	OP IZ	ESF		3	41 243 563		2	25 075 108		14 773 537		
	OP II	EFRR		2	30 700 000		0	0		0		
	Celkom:			6	86 723 563		168	27 792 381		17 400 430		
CELKOM (nad rozsah schválených realokácií OP na opatrenia COVID - 19)			1 105 062 575	24	1 323 041 943	119,73%	268	1 180 974 781	106,87%	811 412 268	73,43%	2 256 908 889
z toho EFRR				13	712 031 308	121,61%	93	652 143 852	111,38%	358 433 944	61,22%	0
z toho ESF				10	596 230 635	114,76%	9	526 113 656	101,26%	450 351 431	86,68%	2 256 908 889
z toho EPFRV				1	14 780 000		166	2 717 273		2 626 893		

Zdroj: ITMS 2014+, RO OP IZ a PRV

1. Podpora udržania zamestnanosti tzv. Kurzarbeit

➤ Implementované v rámci **PO 3 OP Ľudské zdroje**

- Schválená realokácia vo výške **410,26 mil. EUR**
- **2 národné projekty s alokáciou 460,26 mil. EUR:**
 1. **NP Prvá pomoc** (alokácia **390,26 mil. EUR**) – vyzvanie vyhlásené 21.07.2020, ŽoNFP predložená 22.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 11.08.2020**, **vyčerpaná suma predstavuje 387,17 mil. EUR (EÚ zdroj)**. Projekt bol riadne ukončený.
 2. **NP Podpora udržania zamestnanosti v materských školách** (alokácia 70 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 16.07.2020, ŽoNFP predložená 21.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 14.08.2020**, **čerpanie predstavuje 19,99 mil. EUR (EÚ zdroj)**. Projekt bol riadne ukončený.

2. Podpora zdravotníckeho systému

➤ Implementované v rámci **PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra (dlhodobý strategický výskum)**

- Schválená podpora vo výške **7 mil. EUR**
 - **1 už vyhlásená výzva** (OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-08) zameraná na **podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie** – alokácia na výzvu navýšená o 6,94 mil. EUR, **1 zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 07.11.2020** vo výške **6,11 mil. EUR** za EÚ zdroj. Zatiaľ sa vyčerpalo **35 352,99 EUR**.

➤ Implementované v rámci **PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra (výskumné inštitúcie)**

- Schválená podpora vo výške **80 mil. EUR**
- **2 dopytovo orientované výzvy:**
 1. **Výzva na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií** pri boji proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (pôvodná alokácia 60 mil. EUR bola navýšená na **80 mil. EUR**) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 46 ŽoNFP v celkovej sume 137,93 mil. EUR (EÚ+ŠR), z toho **23 už zazmluvnených projektov** vo výške **76,35 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už vyčerpalo **3,41 mil. EUR**.
 2. **Výzva na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch** zameraných na boj proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia **20 mil. EUR**) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 11 ŽoNFP v celkovej sume 16,95 mil. EUR (EÚ+ŠR), z toho evidujeme už **9 zazmluvnených projektov** vo výške **14,80 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa vyčerpalo **1,02 mil. EUR**.

➤ Implementované v rámci **PO 2 Integrovaný regionálny OP**

- Schválená realokácia vo výške **117,30 mil. EUR**
- **4 dopytovo orientované výzvy a 2 vyzvania na NP:**
 1. **Výzva** - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie - **nemocnice** (alokácia **48 mil. EUR**) – vyhlásená 27.08.2020, doručených 50 ŽoNFP v sume 63,24 mil. EUR (EÚ+ŠR), z toho evidujeme už **49 zazmluvnených projektov** vo výške **47,44 mil. EUR** (EÚ zdroj). Z tejto sumy sa už vyčerpalo **5,89 mil. EUR**.

2. **Výzva** na podporu prevencie COVID-19 pre oprávneného žiadateľa Hlavné mesto SR Bratislava a krajské mestá Košice, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, **Prešov a VÚC** (pôvodná alokácia 8 mil. EUR bola navýšená na **16 mil. EUR**) – vyhlásená 10.12.2020, prijatá **8 ŽoNFP vo výške 6,87 mil. EUR** (EÚ+ŠR).
3. **NP** Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19 - I pre prijímateľa MZ SR - **refundácia pľúcnych ventilátorov a úhrada výdavkov ÚVZ SR** (alokácia **12,59 mil. EUR**) – vyzvanie vyhlásené 26.10.2020, **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 27.11.2020** vo výške **8,77 mil. EUR** za EÚ zdroj, z tejto sumy bolo už **vyčerpaných 8,14 mil. EUR**.
4. **NP** Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19 II“ **pre oprávneného žiadateľa MZ SR a partnerov MO SR, ÚVN RK, ÚVZ SR zameraný na zabezpečenie materiálno-technického a prístrojového vybavenia, refundáciu vakcín a mediálnu kampaň** (indikatívna alokácia **25 mil. EUR**) – vyzvanie bolo **vyhlásené 19.08.2021** s alokáciou **23,28 mil. EUR** z EÚ zdrojov. **Zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 27.10.2021** vo výške **22,61 mil. EUR** za EÚ zdroj, z tejto sumy bolo už **vyčerpaných 19,59 mil. EUR**.
5. **Výzva** na podporu prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19 (alokácia **5 mil. EUR**) – vyhlásená 14.06.2021, prijatých **18 ŽoNFP vo výške 5,86 mil. EUR** (EÚ+ŠR).
6. **Výzva** na podporu technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia **23 mil. EUR**) – vyhlásená 14.06.2021, prijatých **13 ŽoNFP vo výške 37,97 mil. EUR** (EÚ+ŠR).

3. Podpora MSP - „SIH antikورونا záruky 1 a 2“ a „SIH antikورونا kapitál“

➤ Implementované v rámci **PO 11 a 12 OP Integrovaná infraštruktúra**

- Schválená realokácia vo výške **330,20 mil. EUR**
- **Celkový príspevok na „COVID“ v rámci podpory MSP vo vyzvaniach je vyčíslený na 395,525 mil. EUR** (celková suma je vyššia ako bola stanovená v zmysle uznesenia),
- **„SIH antikورونا záruky“ – alokácia už existujúcich projektov na finančné nástroje** navýšená o **383 mil. EUR**, z toho zatiaľ boli poskytnuté zdroje vo výške **268 mil. EUR** (čerpanie)
- **„SIH antikورونا kapitál“ – alokácia za EÚ zdroj je zatiaľ vyčlenená na 16,35 mil. EUR** (táto suma môže byť korigovaná), z toho zatiaľ boli poskytnuté zdroje vo výške **1,5 mil. EUR** za EÚ zdroj

4. Podpora zložiek integrovaného záchranného systému

➤ Implementované v rámci **PO 3 OP Kvalita životného prostredia**

- Schválená podpora vo výške **51 mil. EUR** (využitie zostatku vo výzve v sume 13 mil. EUR a navýšenie alokácie na výzvu o 38 mil. EUR)
- **1 už vyhlásená výzva** (OPKŽP-PO3-SC313-2017-31) zameraná na **optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí** na lokálnej a regionálnej úrovni - v rámci výzvy bolo na opatrenia COVID predložených 19 ŽoNFP v celkovej výške 142,41 mil. EUR (EÚ+ŠR), účinnosť nadobudlo **5 zmlúv o poskytnutí NFP**, čo predstavuje **kontrahovanie** vo výške **81,42 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa **vyčerpalo 50,65 mil. EUR**.

5. Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19

➤ Implementované v rámci **PO 1 OP Ľudské zdroje**

- Schválená podpora vo výške **73,30 mil. EUR**
- **3 vyzvania na NP:**
 1. **NP stabilizácie a zabezpečenia kontinuity pedagogických zborov** v rámci PO1 (indikatívna alokácia 6 mil. EUR) – *úloha bola zrušená uznesením vlády č. 387/2021 zo dňa 30.06.2021*
 2. **NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.** (pôvodná alokácia **63,31 mil. EUR** bola navýšená na **68,67 mil. EUR**) – vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **28.10.2020** vo výške **68,67 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už **vyčerpalo 21,35 mil. EUR.**
 3. **NP Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie** – Usmerňovať pre prax (alokácia **4,36 mil. EUR**) – vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **24.09.2020** vo výške **4,31 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už **vyčerpalo 1,16 mil. EUR.**

➤ Implementované v rámci **PO 5 OP Ľudské zdroje**

- Schválená podpora vo výške **28 mil. EUR**
- **3 vyzvania na NP:**
 1. **NP Korona te merel** - posilnenie činnosti zdravotných asistentov v teréne vrátane zabezpečenia vybavenia ľudí v teréne a marginalizovaných rómskych komunít - domácností (indikatívna alokácia 1,20 mil. EUR) – vyhlásené 30.06.2020, **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **31.10.2020** vo výške **1,06 mil. EUR** za EÚ zdroj, z tejto sumy sa **vyčerpalo 324 062 EUR.**
 2. **NP Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK** (alokácia **5,50 mil. EUR**) – vyhlásené 29.06.2020, **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **23.09.2020** vo výške **4,84 mil. EUR** za EÚ zdroj. **Vyčerpalo sa už 1,77 mil. EUR.**
 3. **NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.** (NP PRIM II. – Projekt Inklúzie v Materských školách) (alokácia **15 mil. EUR**) – vyhlásené 29.06.2020, **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **23.09.2020** vo výške **14,99 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už **vyčerpalo 3,80 mil. EUR.**

Ostatné opatrenia nad rámec vyčlenenej alokácie

➤ Implementované v rámci **PRV**

1. Výzva - **Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP**, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19 (alokácia **14,78 mil. EUR**) – vyhlásená 24.08.2020, prijatých 317 ŽoNFP v sume NFP 7 405 375,77 EUR, z toho bolo uzatvorených **166 zmlúv** o poskytnutí NFP vo výške **2,72 mil. EUR** za EÚ zdroj, z tejto sumy sa už **vyčerpalo 2,63 mil. EUR (159 ukončených projektov).**

➤ Implementované v rámci **PO 1 OP Ľudské zdroje**

1. NP **Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)** - (alokácia **5,08 mil. EUR**) – vyhlásené 03.09.2020 (do pôvodného vyzvania bol doplnený partner a COVID aktivity), **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 28.10.2020** vo výške **5,08 mil. EUR** za EÚ zdroj, z tejto sumy sa **vyčerpalo 998 754 EUR**.
2. NP **Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách** (alokácia 20 mil. EUR) – vyhlásené 13.04.2021, **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 25.06.2021** v sume **20 mil. EUR**, z tejto sumy sa **vyčerpalo 13,77 mil. EUR**.
3. NP **Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania** (alokácia 16,16 mil. EUR) – **vyzvanie vyhlásené 16.07.2021**, ŽoNFP bola predložená **27.12.2021**.

➤ Implementované v rámci **PO 10 OP Integrovaná infraštruktúra**

1. **Výzva zameraná na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji** (alokácia **5,7 mil. EUR**) – vyhlásená 22.11.2021.

➤ Implementované v rámci **PO 11 OP Integrovaná infraštruktúra**

1. **Výzva zameraná na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK** (predpokladaná alokácia **25 mil. EUR**) – vyhlásená 17.12.2021.

REACT-EU

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je **3. balíček podpory EK – REACT-EU** v celkovej hodnote **745,18 mil. EUR**, o ktorú sa navýši finančná obálka programového obdobia **2014 – 2020**. Zdroje sa pridelujú v dvoch fázach. V prvej fáze na rok 2021 má SR v zmysle **Vykonávacieho rozhodnutia EK z 12.02.2021** k dispozícii **615,98 mil. EUR**. Na rok 2022 má SR v druhej fáze v zmysle **Vykonávacieho rozhodnutia EK z 23.11.2021** k dispozícií **129,20 mil. EUR**.

V zmysle materiálu č. UV-20294/2020, ktorý vláda SR vzala na vedomie na zasadnutí dňa 23.09.2020, ako aj na základe následných negociácií s Európskou komisiou a riadiacimi orgánmi, bude podpora z REACT-EU zameraná najmä na:

- podporu aktivít na udržanie a vytváranie pracovných miest, pokračovanie poskytovania sociálnych služieb občanom vrátane terénnej práce a komunitnej starostlivosti. Financovať sa bude aj zvyšovanie odolnosti zdravotníckeho systému. Pomoc má byť poskytnutá aj regiónom vo forme financovania zelených aktivít (cyklotrasy, zelená infraštruktúra) a podpora bude smerovať aj na zatepľovanie bytových domov, zvýšenie kapacít základných škôl a zvýšenie kvality odborného vzdelávania. V rámci boja s pandemiou budú finančne podporení zamestnanci v prvej línii ako sú zdravotníci alebo policajti a hasiči. Keďže súčasná kríza má za následok aj zvyšovanie počtu najodkázanejších osôb, pomoc z REACT-EU bude smerovať aj na pokračovanie distribúcie potravinových balíčkov pre tieto osoby.

- **Tieto aktivity je možné realizovať navýšením alokácie v štyroch OP: OP ĽZ, IROP, OP EVS a OP FEAD.** Celková alokácia REACT-EU vo výške **745,18 mil. EUR** bude rozdelená medzi 4 OP nasledovne:

Operačný program	Prvá fáza prideľovania zdrojov - na rok 2021	Druhá fáza prideľovania zdrojov - na rok 2022	Spolu
OP ĽZ	316 832 573	66 458 080	383 290 653
IROP	194 900 994	40 881 990	235 782 984
OP EVS	85 288 928	17 890 012	103 178 940
SPOLU EŠIF	597 022 495	125 230 082	722 252 577
OP FEAD	18 953 095	3 975 558	22 928 653
Spolu REACT-EU	615 975 590	129 205 640	745 181 230

Prvé kolo revízií OP

EK schválila revízie všetkých 4 OP v nadväznosti na 1. tranžu REACT-EU:

- ✓ **OP ĽZ** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 28.05.2021.
- ✓ **IROP** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 14.06.2021.
- ✓ **OP EVS** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 08.06.2021.
- ✓ **OP FEAD** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 16.06.2021.

Druhé kolo revízií OP

V nadväznosti na 2. tranžu REACT-EU sa uskutoční druhé kolo revízií OP, ktorými budú opätovne navýšené alokácie. Revízie sa budú týkať rovnakých OP: OP ĽZ, OP EVS, IROP a OP FEAD a v súčasnosti sú v príprave.

K 31.12.2021 bolo z alokácie 597,02 mil. EUR vo výzvach a vyzvaniach REACT-EU sprístupnených 573,71 mil. EUR (96,10 %), zazmluvnených bolo 395,12 mil. EUR (66,18 %) a vyčerpaných 136,55 mil. EUR (22,87 %).

Tabuľka č. 10: Prehľad implementácie REACT-EU k 31.12.2021

Operačný program	Rezort	Fond	Alokácia REACT-EU (navýšenie k 30.06.2021)	Platné výzvy/vyzvaní a - alokácia			Kontrahovanie			Čerpanie (schválené súhrnné žoP)	
			EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
Operačný program Ľudské zdroje	MŠVVŠ SR	ESF	20 770 000	2	26 269 197	126,48%	1	6 266 591	30,17%		0,00%
	MPSVR SR		276 166 543	13	270 775 723	98,05%	343	238 042 057	86,20%	63 947 559	23,16%
	MV SR		19 896 030	2	24 988 030	125,59%	1	60 830	0,31%		0,00%
	Spolu	ESF	316 832 573	17	322 032 950	101,64%	345	244 369 478	77,13%	63 947 559	20,18%
Integrovaný regionálny operačný program	MIRRI SR	EFRR	180 050 394	9	151 540 767	84,17%	8	65 457 220	36,35%	11 950 000	6,64%
	MK SR		14 850 600	1	14 850 600	100,00%			0,00%		0,00%
	Spolu	EFRR	194 900 994	10	166 391 367	85,37%	8	65 457 220	33,58%	11 950 000	6,13%
Operačný program Efektívna verejná správa	MV SR	ESF	85 288 928	1	85 288 928	100,00%	1	85 288 928	100,00%	60 652 084	71,11%
REACT-EU Celkom:			597 022 495	28	573 713 245	96,10%	354	395 115 626	66,18%	136 549 643	22,87%
z toho EFRR - REACT-EU			194 900 994	10	166 391 367	85,37%	8	65 457 220	33,58%	11 950 000	6,13%
z toho ESF - REACT-EU			402 121 501	18	407 321 878	101,29%	346	329 658 406	81,98%	124 599 643	30,99%

Zdroj: ITMS 2014+

Pre OP v rámci EŠIF bola v prvej fáze vyčlenená alokácia **597,02 mil. EUR** (OP ĽZ, IROP, OP EVS), z ktorej bolo **k 31.12.2021 vyhlásených 28 výziev a vyzvaní**.

RO **OP ĽZ** vyhlásil 17 výziev/vyzvaní zameraných na oblasti:

- zabezpečenie dostupnosti domácej opatrovateľskej služby (55 mil. EUR)
- poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva (13,48 mil. EUR)
- zvýšenie dostupnosti dištančného vzdelávania (20 mil. EUR)
- zvýšenie kvality odborného vzdelávania v Banskobystrickom kraji (6,27 mil. EUR)
- pokračovanie projektu miestnych občianskych poriadkových služieb (24,19 mil. EUR)
- poskytovanie individualizovaného poradenstva pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (3,98 mil. EUR)
- poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb (31,55 mil. EUR)
- rodinné poradne - poradensko-psychologické služby (3,22 mil. EUR)
- overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK (3,5 mil. EUR)
- technická pomoc REACT-EU (11,04 mil. EUR)
- zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (52 mil. EUR)
- zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2 (5 mil. EUR)
- podpora implementácie OPLZ -TA projekt MV SR (0,8 mil. EUR)
- projekt Prvá pomoc II. (63,22 mil. EUR)
- priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva v teréne (20 mil. EUR)
- odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie (2,05 mil. EUR)
- Agentúra integrovanej starostlivosti (1,17 mil. EUR)

RO **IROP** vyhlásil 10 výziev/vyzvaní zameraných na oblasti:

- zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja (40 mil. EUR)
- podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií (14,85 mil. EUR)

- zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy (21 mil. EUR)
- zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (8,6 mil. EUR)
- príprava projektov iniciatívy Catching-up Regions (6 mil. EUR)
- zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja (10 mil. EUR)
- podpora vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR (3,9 mil. EUR)
- poskytovanie úverov (ŠFRB) na zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov (47,8 mil. EUR)
- podpora existujúcich SO pre IROP pri implementácii REACT-EU (0,95 mil. EUR)
- podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk (13,29 mil. EUR)

RO **OP EVS** vyhlásil 1 vyzvanie zamerané na:

- podporu inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia Covid-19 (85,28 mil. EUR).

V rámci **OP FEAD** sa pripravuje verejné obstarávanie na poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie. Riadiaci orgán OP FEAD očakáva prvú realizáciu distribúcie v 1. polovici roka 2022, pričom celkovo sa plánujú realizovať spolu 3 distribúcie potravinových balíčkov.

11. ZJEDNODUŠOVANIE PROCESOV IMPLEMENTÁCIE A DOHLAD NAD IMPLEMENTÁCIOU EŠIF

ZÁKON Č. 292/2014 Z. Z. O PRÍSPEVKU Z EŠIF

Dňa 15.06.2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF. Cieľom novely je **zjednodušiť procesy, znížiť administratívnu záťaž poskytovateľov, prijímateľov a ďalších subjektov, ako aj zvýšiť transparentnosť.** V novele sa vzhľadom na pozitívnu skúsenosť s aplikáciou natrvalo zavádzajú niektoré opatrenia, ktoré mali byť pôvodne uplatňované iba počas krízovej situácie. Ďalej sa zavádza napríklad:

- zverejňovanie nedostatkov a odporúčaní z auditov,
- zjednodušenie spôsobu poskytovania finančných prostriedkov z EFRR,
- možnosť podať odvolanie aj voči rozhodnutiam riadiacich orgánov o zastavení konania,
- zjednodušenie a zefektívnenie finančnej realizácie projektov, v ktorých sú partnermi štátne a rozpočtové organizácie;
- zrýchlenie vysporiadania nezrovnalostí pri porušení pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní;
- zjednodušenie postupov pri vypracovaní, spracovaní a predkladaní správ o zistených nezrovnalostiach;
- poskytovateľom sa stanovuje povinnosť zverejňovať fyzické a právnické osoby, ktoré sa spolupodieľali na príprave projektu.

SYSTÉM RIADENIA EŠIF

Dňa 15.06.2021 nadobudol účinnosť nový Systém riadenia EŠIF. MIRRI SR v rámci zjednodušovania realizovalo sériu 8 stretnutí v priemere so 100 účastníkmi na každom z nich. Zapojilo sa 40 organizácií a boli predložené návrhy na zjednodušenie, z ktorých 52 bolo zavedených v tomto novom Systéme riadenia EŠIF (vydaný 30.04.2021). Ďalšie návrhy sa budú zavádzať priebežne – v ďalšej verzii Systému riadenia EŠIF alebo v programovom období 2021 – 2027. Zhrnutie najpodstatnejších zmien v jednotlivých oblastiach je nasledovné:

- výzvy – riadiaci orgán bude zverejňovať modelovo vyplnené ŽoNFP alebo alternatívne usmerňovať žiadateľov, ako vyplňať ŽoNFP,
- schvaľovací proces – bol zadefinovaný nový prístup k stanovovaniu podmienok poskytnutia príspevku (PPP) vo výzvach – 7 obligatórnych PPP – tie musia byť použité vždy, 13 obligatórnych s nutnosťou ich použitia, ak sú vo vzťahu k zameraniu výzvy relevantné, a 13 je fakultatívnych. CKO odporúča riadiacim orgánom stanoviť konzultačné hodiny pre prijímateľov a riadiaci orgán je povinný na písomnú otázku odpovedať prijímateľovi písomne,
- kontrola – boli zrušené vzory ku kontrole, t. j. tie, ktorých odporúčanú formu definuje MF SR v osobitnom usmernení k z. č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- kontrola verejného obstarávania - zrušilo sa rozdelenie zákaziek s nízkou hodnotou na zákazky nad a do 50 000 EUR a procesné pravidlá spojené so zadávaním eurofondových zákaziek s nízkou hodnotou budú identické. Zákazky s nízkou hodnotou budú zadávané buď zverejnením výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle a informácia o zverejnení na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk alebo odoslaním výzvy min. 3 vybraným záujemcom (prijímateľ si vyberie režim, ktorý preferuje, pričom je oprávnený zákazku aj zverejniť, aj zaslať výzvu vybraným záujemcom),
- zazmluvňovanie, zmluva a zmenové konanie - úprava ustanovenia týkajúceho sa záväznosti právnych dokumentov vydávaných CKO vo vzťahu k prijímateľovi (hovorí o tom, že Systém riadenia je pre prijímateľa záväzný momentom zverejnenia), elektronická komunikácia medzi zmluvnými stranami,
- oprávnenosť výdavkov - zavedenie možnosti valorizácie miezd, odstránenie povinnosti uvádzať v pracovnej zmluve identifikáciu projektu,
- elektronická komunikácia - kompletná elektronická komunikácia zo strany RO aj žiadateľov a prijímateľov (s výnimkou v prípade technických problémov alebo problémov z dôvodu uplatnenia osobitných predpisov alebo predkladania osobitných typov dokumentácie, napr. výkresy); povinnosť sa nezaviedla „nútene“. Pri realizovaných projektoch (aby sa nemuseli meniť všetky zmluvy o NFP) bude manažovanie zmien zmluvy v kompetencii RO,
- monitorovanie - zrušenie povinnosti predkladania mimoriadnej monitorovacej správy projektu, zrušenie povinnosti predkladania výročnej monitorovacej správy, ak sa nezačali realizovať hlavné aktivity projektu v danom roku.

Dňa 15.06.2021 nadobudla účinnosť Jednotná príručka verejného obstarávania pre prijímateľov. Príručka, ktorá bola vydaná 14.05.2021, predovšetkým zjednocuje postupy verejného obstarávania a odstraňuje pravidlá, ktoré mali RO v príručkách nad rámec zákona o verejnom obstarávaní a nad rámec centrálnych pravidiel určených Systémom riadenia, obsahuje aj najčastejšie zistenia za oblast

VO a niektoré vzorové dokumenty (výzva na predkladanie ponúk, čestné vyhlásenie k neprítomnosti konfliktu záujmov, určenie predpokladanej hodnoty zákazky atď.)

V nadväznosti na § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **CKO pripravil a dňa 09.06.2021 zverejnil hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a VZP** (všeobecné zmluvné podmienky) s výnimkou ustanovení, týkajúcich sa finančného riadenia (článok 10, 11, 15, 16, 17a, 17b, 17c, 18 a 20 VZP). **Cieľom** navrhovanej hromadnej zmeny **je čo najjednoduchším a zároveň najefektívnejším spôsobom premietnuť do všetkých účinných zmlúv** o poskytnutí NFP so všetkými prijímateľmi **systémové zmeny, ktoré vyplynuli z implementačnej praxe alebo zo zmeny právneho poriadku**, pričom neobsahuje zmeny v neprospech prijímateľa a nezasahuje do ustanovení špecifických pre konkrétne projekty.

SYSTÉM FINANČNÉHO RIADENIA EŠIF A STRATÉGIA FINANCOVANIA EŠIF

Ministerstvo financií SR v roku 2021 pokračovalo a naďalej pokračuje v ďalšom zjednodušovaní finančného riadenia a príprave flexibilných pravidiel za oblasť finančného riadenia, pričom došlo k prijatiu zmien v nasledovných dokumentoch:

1. Systém finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020

S platnosťou od 1. mája 2021

V nadväznosti na identifikované potreby vyplývajúce z implementačnej praxe z individuálnych stretnutí MF SR (certifikačného orgánu) a video hovorov uskutočnených MIRRI SR sa pristúpilo k:

- predĺženiu lehoty na vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby a predfinancovania na 10 pracovných dní;
- umožneniu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom a jej spracovanie medzi riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom / platobnou jednotkou len elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ bez povinnosti predkladania žiadostí o platbu v písomnej podobe, čo v maximálnej možnej miere prispeje k efektívnejšiemu predkladaniu a spracovaniu dokumentácie;
- ďalšiemu zjednodušeniu výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby.

2. Stratégia financovania EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020

S platnosťou od 1. februára 2021

V nadväznosti na opatrenia prijaté EK s cieľom eliminovania negatívnych vplyvov COVID-19 a dodatočnou alokáciou REACT-EU MF SR pristúpilo k vypracovaniu pravidiel financovania prijímateľa v Stratégii financovania EŠIF.

S platnosťou od 20. mája 2021

Cieľom aktualizácie materiálu bolo vo vzťahu k EŠIF zosúladiť pravidlá stratégie financovania s podmienkami implementácie programov cezhraničnej spolupráce v zmysle platnej legislatívy

a umožnenie 100 % financovania vybraných aktivít Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19.

S platnosťou od 2. augusta 2021

Cieľom aktualizácie je potreba úpravy pravidiel financovania projektov Operačného programu Efektívna verejná správa za účelom dočerpania zostatku prostriedkov viac rozvinutého regiónu pre schválené projekty. V tejto súvislosti dochádza k presunu prostriedkov zo zdroja pro-rata do zdroja štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

S platnosťou od 22. októbra 2021

Cieľom aktualizácie bola úprava pravidiel financovania obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v rámci projektov OP ĽZ.

3. **Vypracovanie hromadnej zmeny zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku** a jej zverejnenie na stránke <https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/> v čase krízovej situácie týkajúcej sa úpravy finančných článkov vzoru tejto zmluvy. Tento inštitút bol vytvorený v prospech prijímateľov, ktorí sa týmto spôsobom dostali **k výhodnejším podmienkam financovania nenávratného finančného príspevku v čase krízovej situácie**. Súčasne výrazným spôsobom došlo k **zjednodušeniu administratívy** spojenej so súčasným vypracovávaním, uzatváraním a zverejňovaním dodatkov k zmluvám o poskytovaní nenávratného finančného príspevku v čase krízovej situácie na strane poskytovateľov. **Tieto zmeny boli následne upravené aj vo vzore Zmluvy o NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15. júna 2021.**

INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Informačné systémy v kompetencii MIRRI SR. V rámci rozvoja ITMS2014+ sú kapacity sústredené na rozvoj v oblastiach, ktoré rozširujú elektronizáciu procesov a prinášajú zjednodušenia.

V roku 2021 boli sprístupnené:

- Elektronizácia procesov spracovania
 - dopracovanie možností elektronickej komunikácie počas celého procesu spracovania a schvaľovania jednotlivých procesov;
 - možnosti komunikácie na úrovni schvaľovania ŽoNFP, implementácie Projektu, schvaľovania ŽoP, procesu predloženia a kontroly VO;
- Úpravy evidencie Účastníkov projektu
 - zjednodušenie práce s dátami nad evidenciou účastníkov projektov;
- Kontrolné zoznamy
 - zaviedla sa funkcionálna podpora vypracovania Kontrolných zoznamov priamo v prostredí ITMS2014+ pre všetky procesy schvaľovania;
- Rozšírenie prehľadov na úrovni OP - štatistiky, informácie, MU, Dátové exporty finančného riadenia;
 - vykonávajú sa úpravy ITMS2014+ pre zabezpečenie implementácie a monitoringu pomoci v rámci REACT-EU (úprava číselníkov, programovej štruktúry a výziev);
- Zodpovední pracovníci – manažment a monitoring úloh v rámci ITMS2014+

- zavedenie funkcionality pre možnosť nastavenia manažmentu pridelovania a monitoringu pridelenej agendy, ktorá je realizovaná prostredníctvom ITMS2014+.
- Elektronizácia procesov kontroly:
 - dopracovanie dokumentov kontroly (reporty – sprava z kontroly a pod.);
 - elektronizácia procesu kontroly delegovaných právomocí;
 - elektronizácia procesu žiadostí o platbu, verejných obstarávaní a projektu;
 - zavedenie automatického vzniku objektov kontroly po predložení ŽoP a VO;
 - možnosť elektronickej komunikácie v rámci jednotlivých objektov kontroly;
 - inicializovanie zmeny projektu na verejnej časti ITMS2014+;
- Doplnenie Monitoringu integračných akcií – vytvorenie reťazenia auditov a logov pri integračných akciách;
- Úprava existujúcej evidencie Zodpovedných pracovníkov;
- Rozšírenie funkcionality zložitých filtrov na neverejnej časti a excel exportov neverejnej časti;
- Úprava date pickera s možnosťou kopírovania a vkladania dátumu;
- Rozšírenie prehľadov na úrovni OP - štatistiky, informácie, MU, Dátové exporty finančného riadenia: úpravy ITMS2014+ pre zabezpečenie implementácie a monitoringu pomoci v rámci REACT-EU II. etapa (úprava ŽoNFP a projektov) a III. Etapa (úpravy ŽoP, SŽoP, PD, VYS, NZR a pod.).
- Vytvorenie generálnej akcie na uvoľnenie zamknutého objektu pri posune v procese spracovania.

Oblasť informačných systémov v kompetencií MF SR (certifikačného orgánu)

V priebehu roka 2021 boli nasadené za MF SR do produktívnej prevádzky nasledovné zmenové požiadavky za ITMS2014+:

- Prehľad zúčtovania záloh – bol doplnený modul párovania záloh v ITMS2014+, ktorý umožňuje sledovanie dodržiavania lehoty na zúčtovanie zálohových platieb v rámci podmienok definovaných v Systéme finančného riadenia, ako aj notifikáciu prijímateľa na blížiaci sa termín zúčtovania;
- Rozšírenie možností vyčleňovania výdavkov na samostatnú kontrolu (je možné vyčleniť na samostatnú kontrolu na úrovni časti deklarovaného výdavku najmä pre účely prebiehajúceho skúmania);
- Doplnenie evidencie nezrovnalostí – evidencia kontaktných osôb;
- Doplnenie reportu nezrovnalostí;
- Doplnenie zverejňovania nezrovnalostí – notifikácia dlžníka pri zaevidovaní / aktualizácii nezrovnalostí;
- Dopracovanie modulu korekcií úprava súm, doplnenie prehľadov a úprava výstupných reportov;
- Doplnenie evidencie žiadostí o platbu o údaje o vykázaní v ŽoP na EK, Účtoch, vrátane rozšírenia reportovacích a filtrovacích možností;
- Úpravy v rámci reportov Výkazu nezrovnalostí a vratiek (doplnenie vybraných polí);
- Zjednotenie vyberania dokladov vykazaných v ŽoP na EK a Účtoch v aplikácii;
- Doplnenie možnosti exportov nezrovnalostí / pohľadávkových dokladov / vysporiadaní na úrovni deklarovaných výdavkov s väzbou na ŽoP na EK a Účty;

- Optimalizácia výpočtu súm v evidencii Žop na EK a Účtov;
- Doplnenie filtrovacích možností v evidencii pohľadávkových dokladov a nezrovnalostí o viacero parametrov s cieľom zlepšenia vyhľadávacích a výkazníckych činností nad uvedenými evidenciami;
- Doplnenie rozšíreného filtra v zozname nezrovnalostí o ďalšie kritériá, s cieľom zlepšenia vyhľadávacích a výkazníckych činností nad uvedenými evidenciami;
- Úprava zohľadňovania nezrovnalostí v čerpaní na úrovni intenzity projektu.

DOHĽAD NAD IMPLEMENTÁCIOU EŠIF

MIRRI SR vypracovalo materiál „Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 218/2021 zo dňa 28.04.2021. Dokumentom boli v rámci tzv. nového krízového manažmentu stanovené piliere dohľadu nad implementáciou EŠIF. Tie okrem iného zahŕňujú odporúčané sumy kontrahovania a čerpania v posledných troch rokoch implementácie a taktiež uznesenie vlády SR, ktoré zaviazalo jednotlivých ministrov implementujúcich EŠIF plniť úlohy dané v materiáli a informovať vládu SR o stave ich plnenia a prípadných kritických problémoch implementácie EŠIF s cieľom zabezpečiť plynulé a rovnomerné čerpania EŠIF do roku 2023 bez rizika dekomitmentu.

Piliere dohľadu nad implementáciou:

1. **optimálne rozdelenie čerpania** v rokoch 2021 – 2023 s cieľom zabránenia dekomitmentu,
2. vypracovanie **akčných plánov** pri vybraných rizikových OP, prípadne prioritných osiach,
3. vykonanie **vnútorných realokácií**, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít v rámci OP podľa výsledkov analýz,
4. definovanie **strategických projektov** z pohľadu čerpania a ich pravidelné monitorovanie,
5. stanovenie a monitorovanie plnenia úloh jednotlivých RO a sprostredkovateľských orgánov (ďalej len „SO“),
6. zaviazanie RO a SO k plneniu úloh v rámci implementácie EŠIF prostredníctvom **uznesení vlády SR**,
7. stanovenie **hraničných termínov kontrahovania**,
8. vytvorenie a dopĺňanie **zásobníkov projektov**, najmä v rizikových OP a prioritných osiach.

V rámci plnenia úloh daných predmetným uznesením **MIRRI SR vypracovalo sedem informatívnych materiálov na rokovanie vlády SR** so stavom ku koncu apríla, mája, júna, augusta, septembra, októbra a novembra 2021 o pokroku v plnení odporúčaných plánov kontrahovania a čerpania na rok 2021 jednotlivých OP, ako aj rezortov v rámci EŠIF, **ktoré vláda SR vzala na vedomie.**

Ďalšia spolupráca a podpora pre RO a SO je zameraná najmä na:

- metodickú podporu riadiacim a sprostredkovateľským orgánom,
- hľadanie riešení pre zefektívnenie a zrýchlenie implementácie v rámci pravidelných bilaterálnych stretnutí,

- podporu využívania elektronickej komunikácie cez ITMS2014+ pri procesoch prijímania a hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
- detailný monitoring implementácie.

12. UKONČOVANIE PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2007 – 2013

Z celkového záväzku programového obdobia 2007 – 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 – 2013 Slovenská republika vyčerpala prostriedky vo výške **10,90 mld. EUR**, čo predstavuje čerpanie na úrovni **93,65 %**.

K 31.12.2021 boli v spolupráci s EK **uzatvorené programy – OP PS INTERACT II (14.12.2017), OP Rybné hospodárstvo (11.07.2019) a OP Technická pomoc (07.07.2021)**⁸. S výnimkou OP Vzdelávanie, boli doručené prípravné uzatváracie listy tzv. pre-closure letters pri všetkých operačných programoch.

Tabuľka č. 11: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 v EUR za EÚ zdroj

Operačný program	Alokácia 2007-2013	Čerpanie z celkovej alokácie	
	(EUR)	(EUR)	%
	1	2	3
OP Vzdelávanie	558 301 578,12	488 513 155,75	87,50%
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	941 301 578,00	890 303 234,87	94,58%
OP Informatizácia spoločnosti	843 595 405,00	797 342 021,83	94,52%
OP Životné prostredie	1 820 000 000,00	1 679 675 402,01	92,29%
Regionálny OP	1 554 503 927,00	1 466 942 989,50	94,37%
OP Doprava*	3 160 154 595,00	3 054 894 712,16	96,67%
OP Zdravotníctvo	250 000 000,00	212 049 245,24	84,82%
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	968 250 000,00	891 616 651,80	92,09%
OP Technická pomoc	97 601 421,00	71 441 865,93	73,20%
OP Bratislavský kraj	95 207 607,00	92 055 215,78	96,69%
OP Výskum a vývoj	1 209 415 373,00	1 128 060 794,96	93,27%
OP CS SR-ČR	92 740 141,00	84 836 376,82	91,48%
OP INTERACT II	30 154 277,00	28 732 805,17	95,29%
OP Rybné hospodárstvo	13 688 528,00	10 026 507,52	73,25%
Spolu	11 634 914 430,12	10 896 490 979,33	93,65%

Zdroj: CO (MF SR) Pozn.: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 k 30.06.2021 v EUR za EÚ zdroj

⁸ 11.01.2022 bol uzatvorený program cezhraničnej spolupráce SR-ČR.

Zoznam skratiek

CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
COV	Celkové oprávnené výdavky
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FEAD	Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci
FN	Finančné nástroje
Interreg V-A SK-AT	Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko
Interreg V-A SK-CZ	Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
IS PPA	Informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry
ITMS2014+	IT monitorovací systém 2014+
IZM	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
KF	Kohézny fond
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MK SR	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MRK	Marginalizované rómske komunity
MSP	Malé a stredné podniky
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MU	Merateľný ukazovateľ
MV	Monitorovací výbor
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NP	Národný projekt
OA	Orgán auditu
OP	Operačný program
OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP FEAD	Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci
OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP ĽZ	Operačný program Ľudské zdroje
OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo

OP TP	Operačný program Technická pomoc
OP Val	Operačný program Výskum a inovácie (neskôr zlúčený s OP II)
PO	Prioritná os
PPA	Pôdohospodárska platobná agentúra
PRV	Program rozvoja vidieka
REACT-EU	Iniciatíva na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti
RO	Riadiaci orgán
SIH	Slovenský investičný holding
SFC2014	Shared fund management common system 2014 – 2020/Systém riadenia fondov Európskeho spoločenstva 2014-2020
SO	Sprostredkovateľský orgán
SŽoP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠR	Štátny rozpočet
ÚPVII	Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
VO	Verejné obstarávanie
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu

13. ZOZNAM PRÍLOH

Príloha č.1(a) – 1(k): Implementácia jednotlivých OP

Príloha č. 1 (a): Implementácia OP Ľudské zdroje

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Ľudské zdroje	PO 1 - Vzdelávanie	SO: MŠVVŠ SR	ESF	348 741 004	65 646 163	418 181 411	119,91%	468 804 047	5 473 909	412 004 585	333 657 355	55 804 922	95,67%	163 874 155	27 540 413	46,99%
	PO 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF+IZ M	172 270 942	15 200 378	357 124 382	207,30%	312 505 341	0	221 183 496	206 256 081	14 927 415	119,73%	167 502 385	14 800 838	97,23%
	PO 3 - Zamestnanosť	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	1 331 222 796	273 023 216	1 580 669 661	118,74%	1 657 913 272	0	1 637 096 891	1 363 342 551	273 754 340	102,41%	1 047 893 497	215 297 533	78,72%
	PO 4 - Sociálne začlenenie	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	299 669 312	70 139 315	416 973 594	139,14%	401 804 703	0	402 307 780	329 851 946	72 455 833	110,07%	197 137 599	41 385 450	65,79%
	PO 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít	SO: MV SR	ESF	161 954 885	26 555 870	220 106 251	135,91%	268 075 328	0	184 095 998	158 699 020	25 396 978	97,99%	96 716 017	15 167 510	59,72%
	PO 6 - Technická vybavenosť v obciach s prílohou MRK	SO: MV SR	EFRR	220 707 577	25 495 010	336 427 848	152,43%	430 795 622	3 422 771	208 181 621	185 661 563	22 520 057	84,12%	56 534 355	6 989 341	25,62%
	PO 7 - Technická pomoc	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF	78 600 000	16 103 753	98 419 852	125,22%	96 352 722	0	94 151 524	78 441 982	15 709 542	99,80%	68 953 502	13 786 187	87,73%
	PO 8 - REACT-EU	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	304 990 048	0	310 190 425	101,71%	285 160 420	22 417 014	233 323 527	233 323 527	0	76,50%	63 227 055	0	20,73%
	PO 9 - Technická pomoc REACT-EU	RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	11 842 525	2 760 930	11 842 525	100,00%	11 045 951	0	13 621 841	11 045 951	5 151 780	93,27%	720 504	168 020	6,08%
	CELKOM OP ĽZ			2 929 999 089	494 924 635	3 749 935 948	127,98%	3 932 457 406	31 313 694	3 405 967 263	2 900 279 977	485 720 868	98,99%	1 862 559 068	334 967 272	63,57%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2022 o 7:00hod, kontrahovanie brutto export dát 10.01.2022), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (b): Implementácia OP Integrovaná infraštruktúra

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Integrovaná infraštruktúra	PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	KF	725 839 166	128 089 265	1 577 459 447	217,33%	980 345 182	3 132 139	893 940 115	759 849 098	134 091 017	104,69%	452 029 122	79 769 845	62,28%
	PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)	RO: MDV SR	KF	1 142 500 000	201 617 648	1 764 084 240	154,41%	1 634 455 207	1 979 588	1 383 026 623	1 175 572 629	207 453 994	102,89%	767 725 711	135 481 008	67,20%
	PO 3 - Verejná osobná doprava	RO: MDV SR	KF	369 337 000	44 770 772	564 516 406	152,85%	413 082 396	0	369 784 080	330 646 884	39 137 196	89,52%	197 915 640	23 456 619	53,59%
	PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	RO: MDV SR	KF	29 463 000	2 923 752	14 387 961	48,83%	21 723 708	0	1 634 903	1 555 059	79 844	5,28%	1 398 439	69 646	4,75%
	PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	EFRR	223 951 749	39 520 897	556 642 340	248,55%	253 742 364	0	286 493 440	241 965 009	42 698 944	108,04%	23 629 587	4 169 357	10,55%
	PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	RO: MDV SR	EFRR	764 586 032	134 926 947	1 381 165 163	180,64%	929 172 530	6 614 047	773 759 447	657 695 530	116 063 917	86,02%	161 091 411	28 427 896	21,07%
	PO 7 - Informačná spoločnosť	SO: MIRRI SR	EFRR	676 940 302	119 460 054	953 184 285	140,81%	976 090 071	3 094 056	757 688 922	570 849 844	96 316 847	84,33%	147 158 024	25 713 820	21,74%
	PO 8 - Technická pomoc	RO: MDV SR	EFRR	87 000 000	15 352 942	87 000 000	100,00%	97 104 403	0	96 564 426	79 240 768	13 992 186	91,08%	53 592 266	9 463 221	61,60%
	PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	1 021 780 946	51 711 214	1 334 938 390	130,65%	1 775 708 769	9 786 015	981 344 500	886 579 894	65 143 035	86,77%	366 234 145	23 331 117	35,84%
	PO 10 - Podpora výskum, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	107 345 015	84 594 980	130 738 700	121,79%	184 401 376	107 608	187 570 263	100 904 229	86 666 034	94,00%	22 893 310	19 577 428	21,33%
	PO 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP	SO: MH SR	EFRR	683 437 672	91 420 066	741 031 780	108,43%	592 252 265	14 673 873	748 863 956	657 935 992	90 927 963	96,27%	386 762 062	53 869 011	56,59%
	PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP v Bratislavskom kraji	SO: MH SR	EFRR	107 756 729	97 292 126	109 983 753	102,07%	48 756 948	2 504 875	193 590 436	99 666 753	93 923 683	92,49%	58 774 706	56 769 205	54,54%
	PO 13 - Technická pomoc Val	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	70 000 000	14 341 765	85 908 379	122,73%	94 182 993	0	81 891 216	67 965 805	13 925 411	97,09%	60 104 250	12 315 393	85,86%
CELKOM OP II				6 009 937 611	1 026 022 428	9 301 040 843	154,76%	8 001 018 212	41 892 202	6 756 152 328	5 630 427 495	1 000 420 072	93,69%	2 699 308 674	472 413 567	44,91%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2022 o 7:00hod, kontrahovanie brutto export dát 10.01.2022), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (c): Implementácia OP Kvalita životného prostredia

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Kvalita životného prostredia	PO 1 - Udržiateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environment. infraštruktúry	SO: SAŽP	KF	1 535 798 465	154 838 802	1 736 846 870	113,09%	2 895 130 011	25 790 114	1 277 696 413	1 148 946 967	128 749 446	74,81%	731 003 481	72 904 504	47,60%
	PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	SO: SAŽP	KF	188 063 796	32 144 297	211 874 419	112,66%	401 545 631	8 035 242	152 012 520	132 149 420	19 863 100	70,27%	44 193 917	7 154 303	23,50%
	PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy	SO: MV SR, SO: SAŽP	EFRR	243 896 216	40 171 209	306 371 181	125,62%	676 459 810	0	296 978 786	243 573 472	42 827 253	99,87%	128 665 765	22 719 594	52,75%
	PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	SO: SIEA	EFRR	787 772 813	86 319 085	1 059 402 691	134,48%	1 178 289 027	12 681 960	764 919 849	680 345 464	79 533 864	86,36%	448 552 135	52 308 333	56,94%
	PO 5 - Technická pomoc	SO: SAŽP, MV SR, SIEA RO: MŽP SR	EFRR	77 000 000	15 775 942	77 000 000	100,00%	92 489 589	0	84 421 483	70 065 235	14 356 248	90,99%	62 836 290	12 875 043	81,61%
	CELKOM OP KŽP:			2 832 531 290	329 249 335	3 391 495 160	119,73%	5 243 914 067	46 507 315	2 576 029 052	2 275 080 557	285 329 911	80,32%	1 415 251 588	167 961 777	49,96%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2022 o 7:00hod, kontrahovanie brutto export dát 10.01.2022), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (d): Implementácia Integrovaného regionálneho OP

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Integrovaný regionálny operačný program	PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	424 710 508	65 820 078	710 663 541	167,33%	795 810 374	4 039 283	475 602 413	414 482 670	61 119 742	97,59%	154 403 921	25 731 979	36,36%
	PO 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB), MZ SR	EFRR	705 960 664	143 968 544	1 058 722 308	149,97%	1 065 795 890	38 707 639	685 412 748	586 936 931	98 475 817	83,14%	301 301 618	44 712 931	42,68%
	PO 3 -Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	SO: MK SR	EFRR	122 127 561	31 567 811	185 615 931	151,99%	231 843 885	0	128 505 853	109 728 081	18 777 771	89,85%	14 553 792	2 259 724	11,92%
	PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	296 028 221	56 106 325	390 777 305	132,01%	497 854 153	2 468 919	328 737 244	274 741 851	53 995 393	92,81%	196 813 525	43 566 254	66,48%
	PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou	RO: MIRRI SR	EFRR	89 114 824	562 735	105 586 708	118,48%	116 714 910	0	83 044 628	82 768 528	276 100	92,88%	15 189 882	0	17,05%
	PO 6 - Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	62 000 000	11 955 665	63 888 335	103,05%	55 860 926	1 464 777	57 276 504	47 817 319	9 459 185	77,12%	44 466 273	8 805 945	71,72%
	PO 7 - REACT-EU	RO: MIRRI SR SO: MK SR	EFRR REACT-EU	188 900 994	0	161 535 745	85,51%	302 506 324	15 867 470	65 457 220	65 457 220	0	34,65%	11 950 000		6,33%
	PO 8 - Technická pomoc REACT-EU	RO: MIRRI SR	EFRR REACT-EU	6 000 000	1 000 000	4 855 622	80,93%	3 902 270	3 902 270	0	0	0	0,00%	0		0,00%
	CELKOM IROP:			1 894 842 772	310 981 158	2 681 645 495	141,52%	3 070 288 733	66 450 358	1 824 036 609	1 581 932 600	242 104 010	83,49%	738 679 011	125 076 833	38,98%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2022 o 7:00hod, kontrahovanie brutto export dát 10.01.2022), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (e): Implementácia OP Efektívna verejná správa

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Priaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Efektívna verejná správa	PO 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS	RO: MV SR	ESF	200 892 184	37 730 586	233 310 529	116,14%	260 603 490	84 763	232 536 098	178 527 329	35 864 082	88,87%	104 367 852	22 754 419	51,95%
	PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva	RO: MV SR	ESF	37 446 341	7 533 343	41 939 668	112,00%	38 234 864	0	35 725 843	26 101 263	5 680 140	69,70%	18 979 596	4 415 554	50,68%
	PO 3 - Technická pomoc	RO: MV SR	ESF	13 137 972	2 691 739	12 850 000	97,81%	12 646 030	0	15 132 896	12 559 636	2 573 260	95,60%	8 866 549	1 816 626	67,49%
	PO 4 - REACT EU	RO: MV SR	ESF REACT-EU	85 288 928	0	85 288 928	100,00%	85 288 928	0	85 288 928	85 288 928	85 288 928	100,00%	60 652 084	0	71,11%
	CELKOM OP EVS:			336 765 425	47 955 668	373 389 125	110,88%	396 773 311	84 763	368 683 765	302 477 155	129 406 410	89,82%	192 866 082	28 986 598	57,27%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2022 o 7:00hod, kontrahovanie brutto export dát 10.01.2022), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (f): Implementácia OP Technická pomoc

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Technická pomoc	PO 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF	RO: MIRRI SR	EFRR	131 523 744	23 172 573	157 317 704	119,61%	188 043 912	1 065 911	156 832 302	128 854 408	22 560 544	97,97%	116 364 608	20 408 663	88,47%
	PO 2 - Systémová a technická podpora	RO: MIRRI SR	EFRR	27 548 168	4 861 442	29 860 318	108,39%	26 160 591	626 688	22 301 296	18 300 444	3 231 458	66,43%	13 084 868	2 310 501	47,50%
	CELKOM OP TP:			159 071 912	28 034 015	187 178 022	117,67%	214 204 503	1 692 599	179 133 599	147 154 852	25 792 002	92,51%	129 449 476	22 719 164	81,38%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2022 o 7:00hod, kontrahovanie brutto export dát 10.01.2022), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (g): Implementácia Programu rozvoja vidieka

Program	Typ opatrenia	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Program rozvoja vidieka	Projektové opatrenia PRV okrem projektov MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	1 245 615 708	416 806 034	1 042 644 163	83,71%	2 219 340 802		879 916 123	654 908 248	225 007 876	52,58%	446 267 669	152 209 758	35,83%
	Projektové opatrenia PRV - len projekty MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	89 568 818	33 269 851	72 448 696	80,89%	42 268 216		6 232 523	4 674 393	1 558 131	5,22%	0	0	0,00%
	Neprojektové opatrenia PRV	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	884 281 930	298 542 099	884 281 930	100,00%	985 396 193		904 920 505	663 057 437	241 863 068	74,98%	660 078 113	227 868 383	74,65%
	Technická pomoc	RO: MPRV SR	EPFRV	80 710 366	26 122 933	62 614 162	77,58%	63 208 554		63 208 554	47 406 415	15 802 138	58,74%	30 659 158	10 219 719	37,99%
	CELKOM PRV:			2 300 176 822	774 740 916	2 061 988 951	89,64%	3 310 213 765	NA	1 854 277 705	1 370 046 492	484 231 212	59,56%	1 137 004 940	390 297 861	49,43%

Zdroj: RO PRV

Príloha č. 1 (h): Implementácia OP Rybné hospodárstvo

Program	Priorita Únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach	RO: MPRV SR	ENFR	5 611 186	1 870 397	6 357 771	113,31%	7 561 434	40 731	1 908 770	1 431 577	477 192	25,51%	823 102	274 367	14,67%
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP	RO: MPRV SR	ENFR	780 644	139 343	647 330	82,92%	324 964	0	98 647	78 918	19 729	10,11%	40 744	10 186	5,22%
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	RO: MPRV SR	ENFR	2 481 071	827 025	661 500	26,66%	801 248	22 576	885 316	663 987	221 329	26,76%	587 820	195 940	23,69%
	PÚ 7 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	ENFR	803 694	267 898	670 914	83,48%	1 146 126	0	1 212 161	909 121	303 040	113,12%	801 778	267 259	99,76%
	CELKOM OP RH:			9 676 595	3 104 663	8 337 515	86,16%	9 833 772	63 308	4 104 895	3 083 603	1 021 291	31,87%	2 253 443	747 752	23,29%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2022 o 7:00hod, kontrahovanie brutto export dát 10.01.2022), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (i): Implementácia Interreg V-A SK-CZ

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Interreg V-A SK-CZ	1. Využívanie inovačného potenciálu	RO: MIRRI SR	EFRR	13 268 529	775 447	20 650 932	155,64%	61 973 523	459 000	14 464 288	13 618 549	845 739	102,64%	4 787 157	303447,05	36,08%
	2. Kvalitné životné prostredie	RO: MIRRI SR	EFRR	62 340 452	4 366 169	71 034 798	113,95%	157 319 211	0	61 417 167	57 758 445	3 658 722	92,65%	31 218 396	1 752 388	50,08%
	3. Rozvoj miestnych iniciatív	RO: MIRRI SR	EFRR	9 122 115	606 052	10 908 310	119,58%	17 141 498	0	8 756 109	8 286 818	469 291	90,84%	3 423 626	160 148	37,53%
	4. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	5 408 367	480 396	6 339 969	117,23%	5 668 475	459 000	5 286 302	4 762 385	523 917	88,06%	3 312 998	381307,89	61,26%
	CELKOM Interreg V-A SK-CZ:			90 139 463	6 228 064	108 934 009	120,85%	242 102 707	918 000	89 923 865	84 426 197	5 497 668	93,66%	42 742 176	2 597 291	47,42%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2022 o 7:00hod, kontrahovanie brutto export dát 10.01.2022), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (j): Implementácia Interreg V-A SK-AT

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Interreg V-A SK-AT	1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu	RO: MIRRI SR	EFRR	19 683 142	305 711	19 683 142	100,00%	39 128 360	662 988	19 732 342	18 886 798	845 544	95,95%	8 133 186	353 647	41,32%
	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	RO: MIRRI SR	EFRR	27 820 000	1 859 804	27 820 000	100,00%	40 022 998	1 571 918	31 326 291	29 280 067	2 046 224	105,25%	10 651 682	482 998	38,29%
	3. Podpora udržateľných dopravných riešení	RO: MIRRI SR	EFRR	9 655 000	374 422	9 655 000	100,00%	16 655 601	0	8 547 486	8 098 921	448 565	83,88%	2 167 621	116 447	22,45%
	4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce	RO: MIRRI SR	EFRR	14 180 979	518 870	14 180 976	100,00%	24 576 013	2 487 166	13 029 678	12 352 805	676 873	87,11%	6 556 104	378 606	46,23%
	5. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	4 553 560	592 365	4 553 560	100,00%	4 644 038	0	4 823 732	4 425 793	397 940	97,19%	2 697 576	271 681	59,24%
	CELKOM Interreg V-A SK-AT:		EFRR	75 892 681	3 651 172	75 892 678	100,00%	125 027 010	4 722 071	77 459 528	73 044 383	4 415 145	96,25%	30 206 169	1 603 377	39,80%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.01.2022 o 7:00hod, kontrahovanie brutto export dát 10.01.2022), RO pre Interreg V-A SK-AT, Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (k): PS INTERACT III

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP		Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie
PS INTERACT III	PO 1 - Rozvoj a poskytnutie služieb	RO: BSK	EFRR	37 265 300						43 100 133	37 265 300		100,00%	27 713 721		74,37%
	PO 2 Technická pomoc	RO: BSK	EFRR	2 127 294						3 244 096	2 127 294		100,00%	1 540 349		72,41%
	CELKOM PS Interact III:	RO: BSK		39 392 594						46 344 229	39 392 594		100,00%	29 254 070		74,26%

Zdroj: RO pre PS INTERACT III, Certifikačný orgán (MF SR)
